

かまいし復興レポートVol.7

釜石市

平成25年9月18日

目次

- 1 「かまいし復興レポート」について
- 2 復旧・復興の進捗状況
 - 2-1 事業費
 - 2-2 土地利用
 - 2-3 インフラ整備
 - 2-4 産業・雇用
 - 2-5 教育
 - 2-6 その他
- 3 問い合わせ先

1 「かまいし復興レポート」について

目的

進捗
状況

問い合
わせ

□目的

- ・ 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

□公開方法

- ・ 定期的に市ホームページ上に公開
- ・ 今回 (Vol.7) の数値は平成25年8月31日時点
- ・ 括弧内は前回数値 (平成25年7月31日時点) からの進捗を示す
- ・ 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする


2-1 事業費

目的


進捗
状況

問い合
わせ

主な復興事業費の配分済額 (単位: 億円)

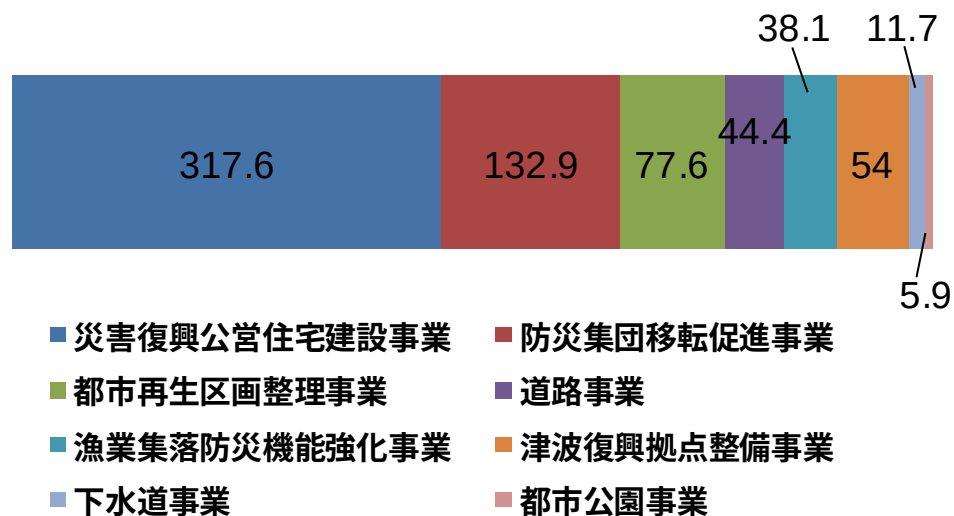

主な復興事業費の措置率

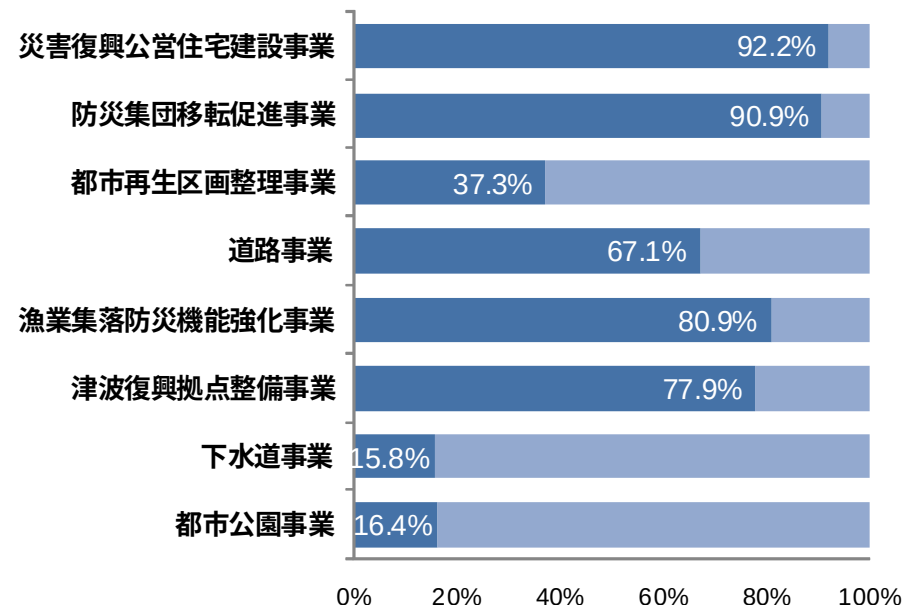


主な復旧事業費 (単位: 億円)



※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

各地区の主な事業種別

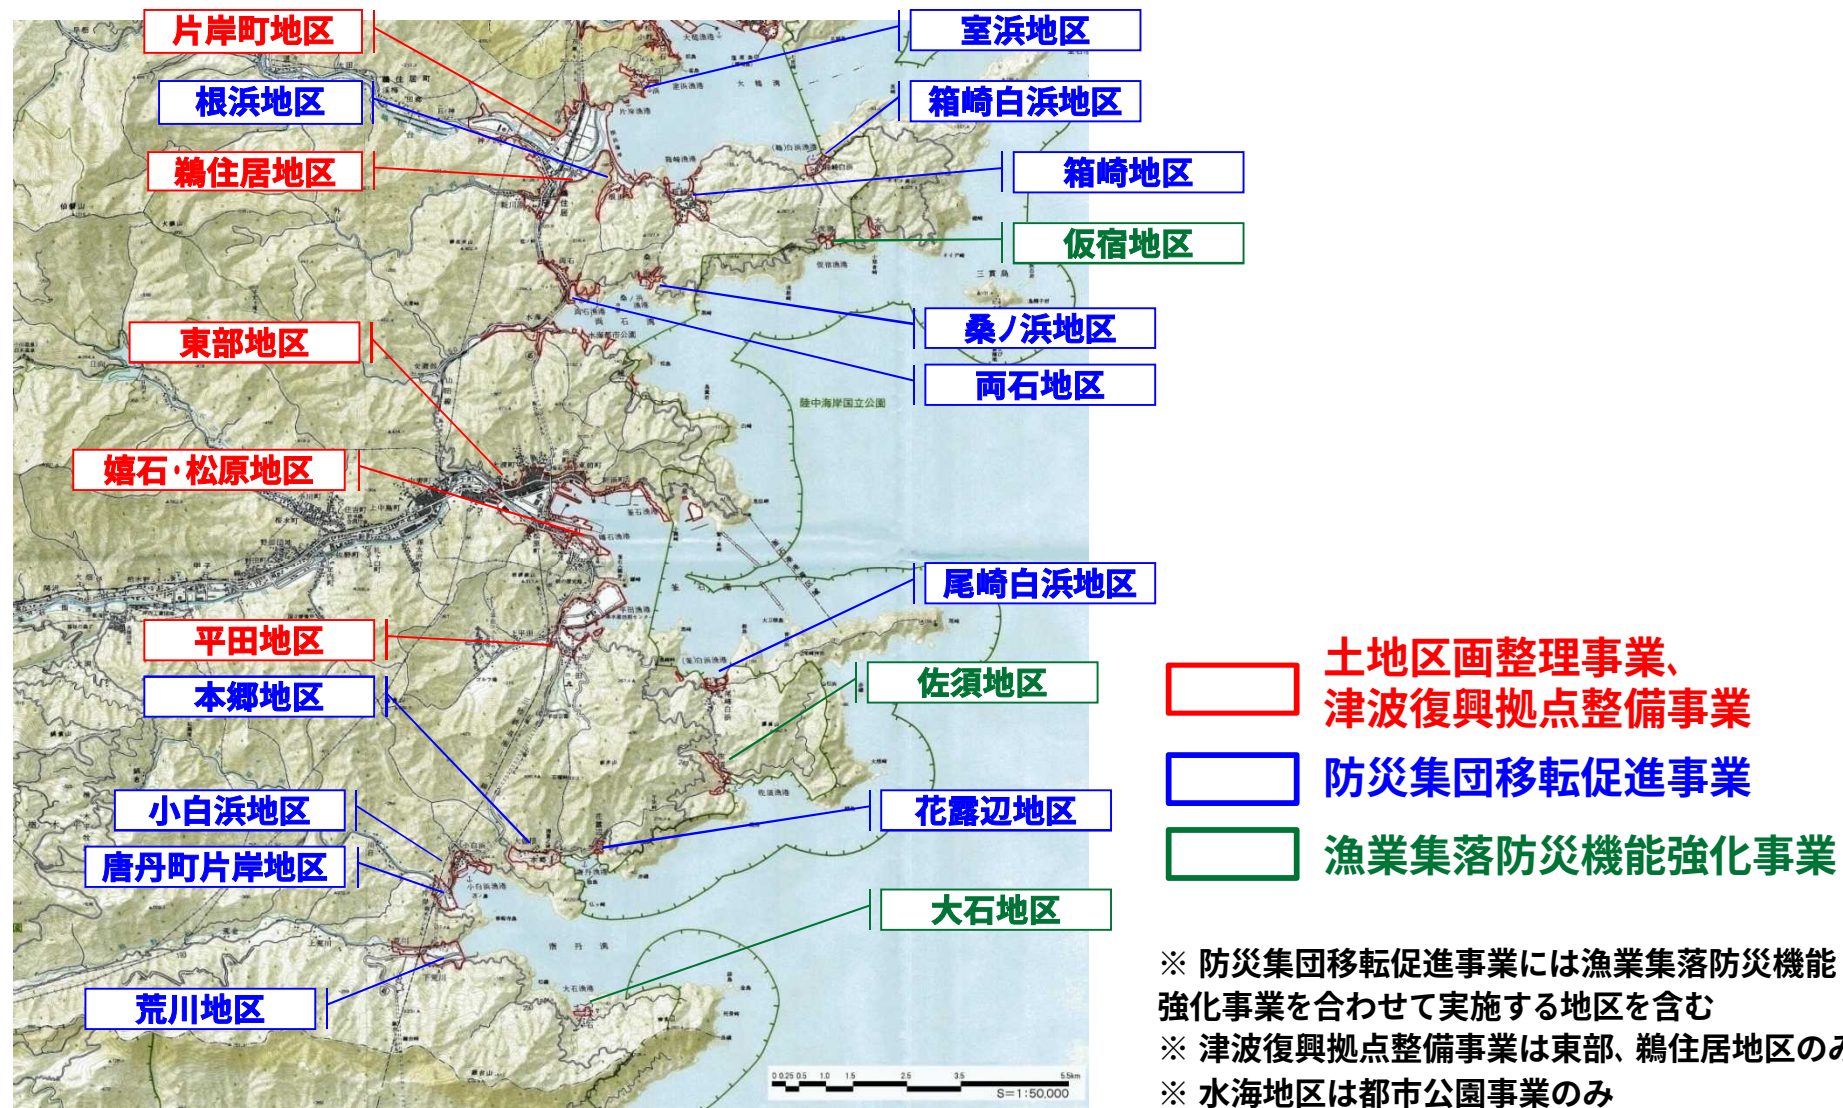


2-2 土地利用 (2)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

土地区画整理事業の進捗

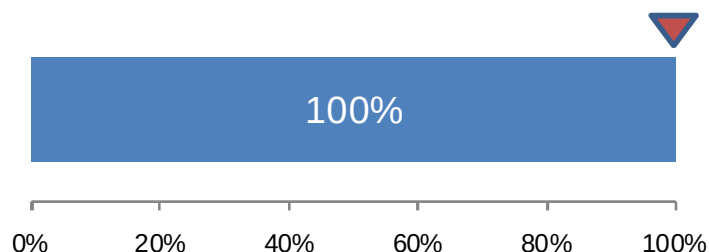

分子

都市計画決定された地区の数

4


分母

土地区画整理事業を実施予定地区の数

4

「土地区画整理事業」とは？

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするために、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集約化を行う

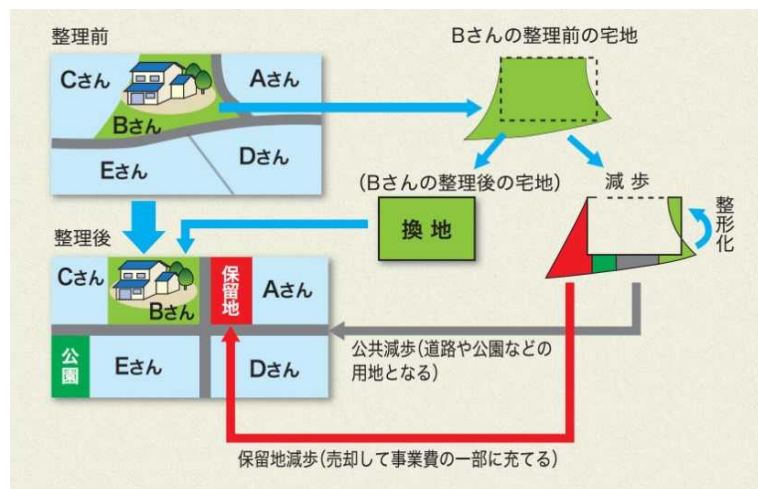

スケジュール (予定)

計画策定・合意形成

平成23年10月～

調査・測量・設計

平成24年5月～
平成25年3月

都市計画決定

平成24年11月

地権者連絡会

平成24年11月～

事業計画認可

平成25年3月

換地設計

平成25年3月～

審議会選挙等

平成25年4月～

仮換地指定

平成25年度下期

建物等の移転・工事


平成25年度下期～
平成30年3月

換地処分

平成29年度下期～
平成30年3月

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

防災集団移転促進事業の進捗



分子

国土交通大臣同意を得た地区の数

11


分母

防災集団移転促進事業を実施予定地区の数

11

「防災集団移転促進事業」とは？

- ・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
- ・移転元の土地は住宅地としては利用不可

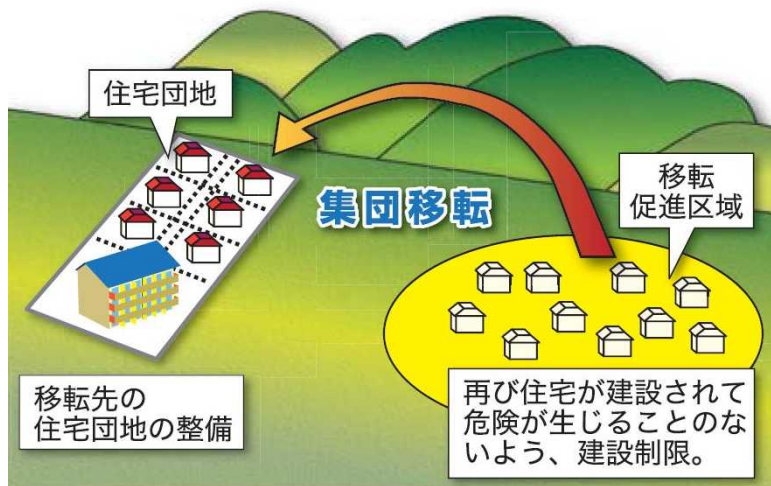

スケジュール (予定)

計画策定・合意形成

平成23年10月～

調査・測量・設計

平成24年4月～
平成25年3月

防災集団移転促進事業大臣同意

平成24年6月 1地区
平成24年9月 7地区
平成24年10月 3地区

用地境界確認

平成24年10月～
平成24年11月

地権者連絡会

平成24年11月～

不動産鑑定・用地買収

平成24年11月～

造成工事・道路工事等

平成25年5月～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-2 土地利用 (4)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

漁業集落防災機能強化事業の進捗



分子

復興交付金の事業費措置地区の数

13


分母

漁業集落防災機能強化事業を実施
予定地区の数

13

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

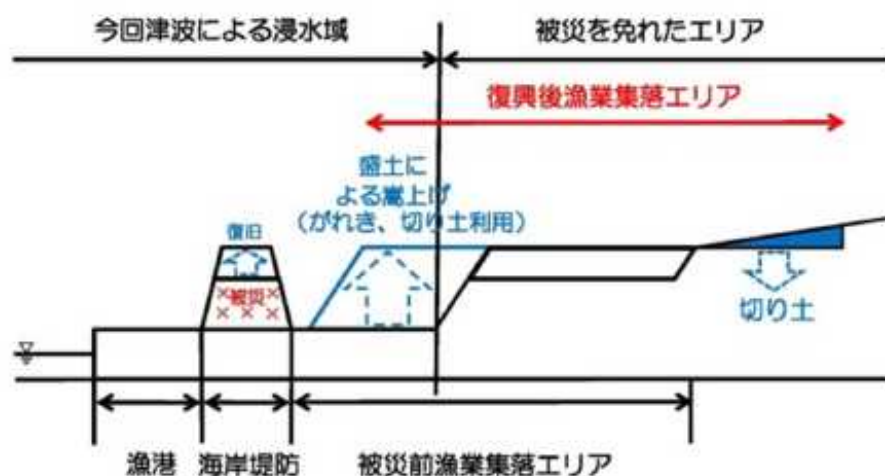

スケジュール (予定)

計画策定・合意形成

平成23年10月～

調査・測量・設計

平成24年4月～
平成25年3月

用地境界確認

平成24年10月～
平成24年11月

地権者連絡会

平成24年11月～

不動産鑑定・用地買収

平成24年11月～

造成工事・道路工事等

平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-2 土地利用 (5)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

用地買収の進捗

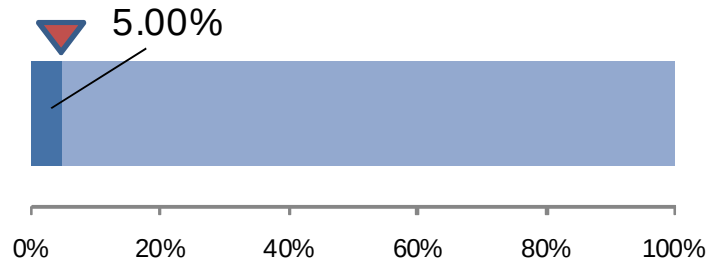


分子	買収面積	45,000 (+11,648)
分母	買収予定面積	899,764

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位: m²

復興公営住宅事業の進捗



分子	工事発注済みの戸数	231 (+3)
分母	計画戸数 (予定)	1,600

※ 復興公営住宅の計画戸数について、8月に最終意向調査を実施、10月に結果を公表予定


2-2 土地利用 (6)

目的

進捗
状況


問い合
わせ

建物・基礎撤去の進捗

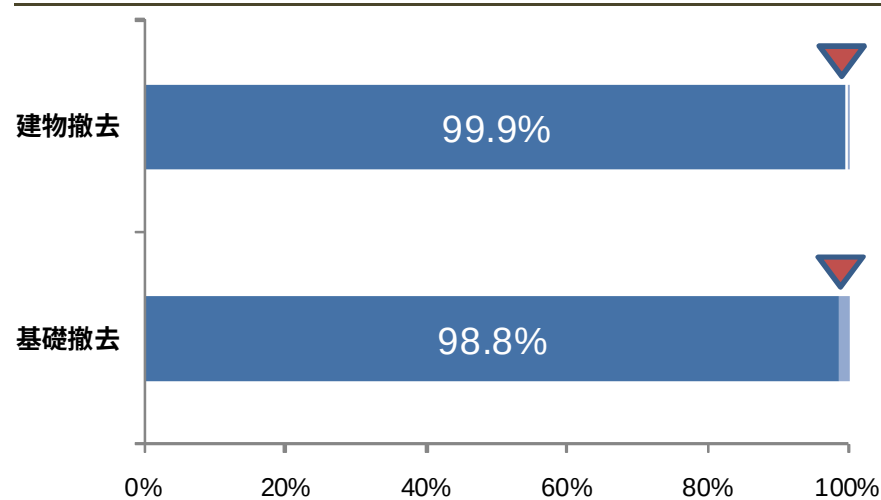

分子	建物撤去が完了した数	1,373
分母	建物撤去の総数	1,375
分子	基礎撤去が完了した数	4,556 (+5)
分母	基礎撤去の総数	4,613

災害廃棄物処理の進捗

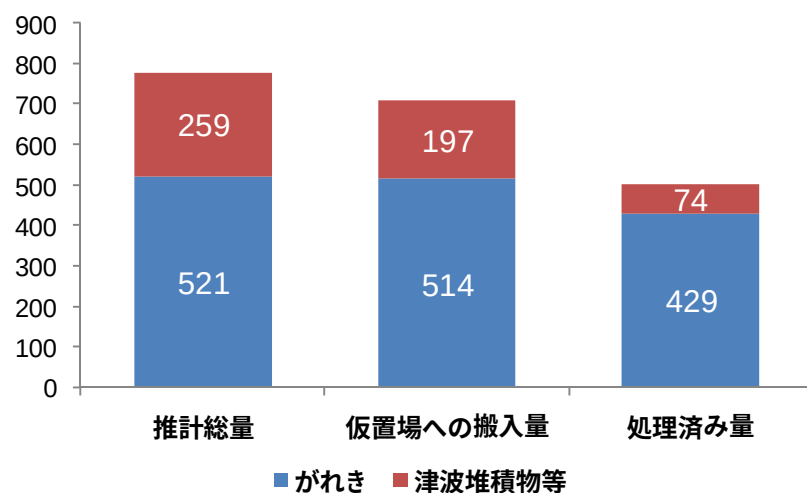


推計総量	780
仮置場への搬入 (がれき)	514
仮置場への搬入 (津波堆積物)	197
処理済み (がれき)	429 (+25)
処理済み (津波堆積物)	74

単位: 千t

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

道路災害復旧事業の進捗




分子 工事が完了した市道の箇所数

40
(+1)

分母 被災した市道の箇所数

77

橋りょう復旧事業の進捗

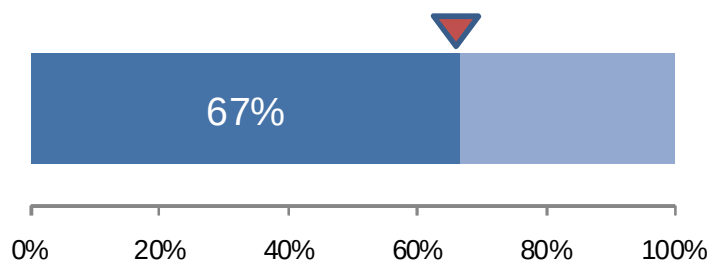


分子 工事が完了した橋りょうの箇所数

6

分母 被災した橋りょうの箇所数

9

河川改修事業の進捗



分子 工事を発注した箇所数

14

分母 整備予定の箇所数

16


2-3 インフラ (2)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

下水道施設災害復旧事業の進捗

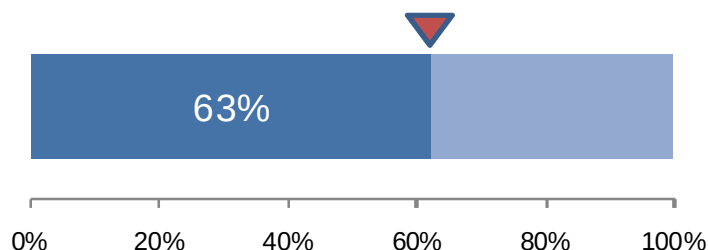

分子

復旧工事が完了した施設箇所
(管路施設)


5

分母

被災した下水道の施設箇所
(処理場・ポンプ施設、管路施設)

8

漁港災害復旧事業 (市漁港) の進捗

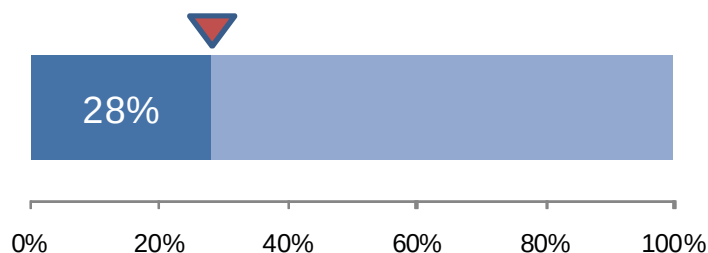

分子

工事発注済額

1,376,207


分母

工事予定総額

4,868,764

単位: 千円

海岸施設災害復旧事業 (市防潮堤) の進捗

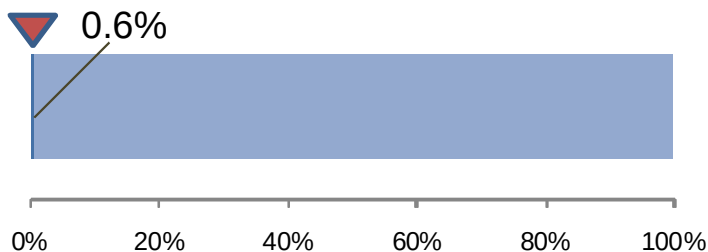

分子

工事発注済額

31,710

分母

工事予定総額

5,043,856

単位: 千円

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-4 産業・雇用 (1)

目的

進捗
状況

問い合
わせ


水揚げ高 (魚市場)

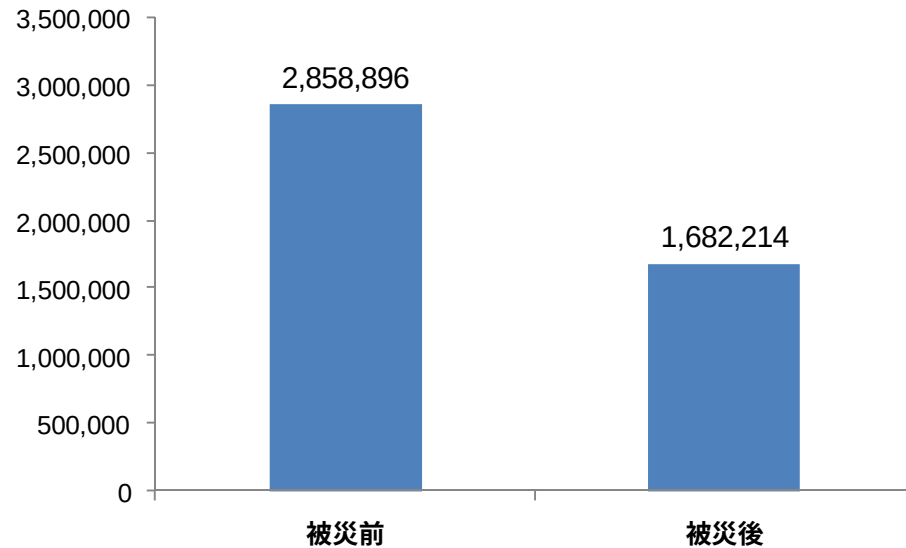

被災前水揚げ高	2,858,896
被災後水揚げ高	1,682,214

単位: 千円

水産加工業企業数



震災前の企業数	14
再開した企業数 (新規4を含む)	14


2-4 産業・雇用 (2)

目的

進捗
状況

問い合
わせ


農地農業用施設災害復旧事業の進捗



分子	復旧農地面積	8.3
分母	津波冠水農地面積	53.0

単位: ha

釜石市への観光客数

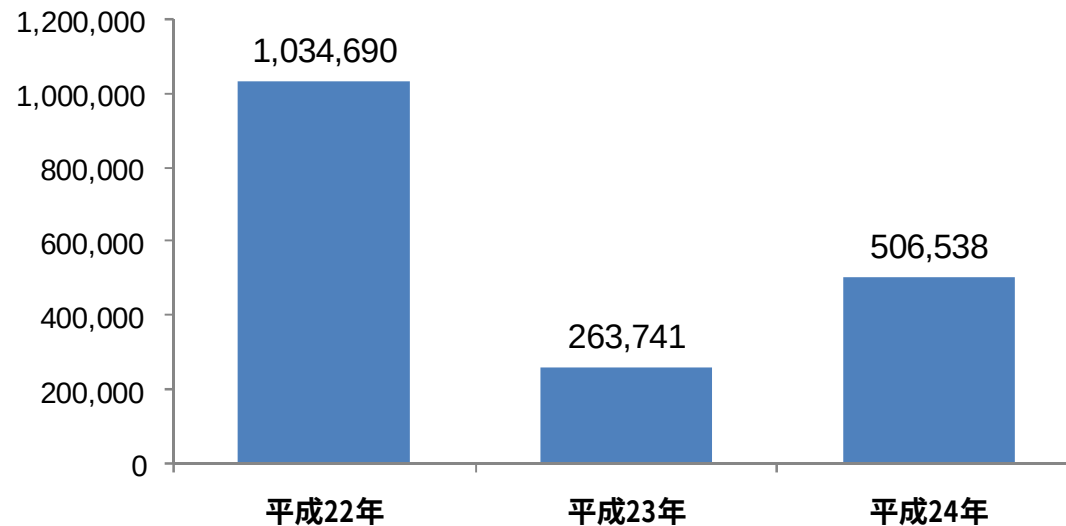

平成22年	1,034,690
平成23年	263,741
平成24年	506,538

単位: 人

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-4 産業・雇用 (3)

目的

進捗
状況

問い合
わせ


釜石公共職業安定所釜石本所 (釜石市・大槌町) の求人・求職状況

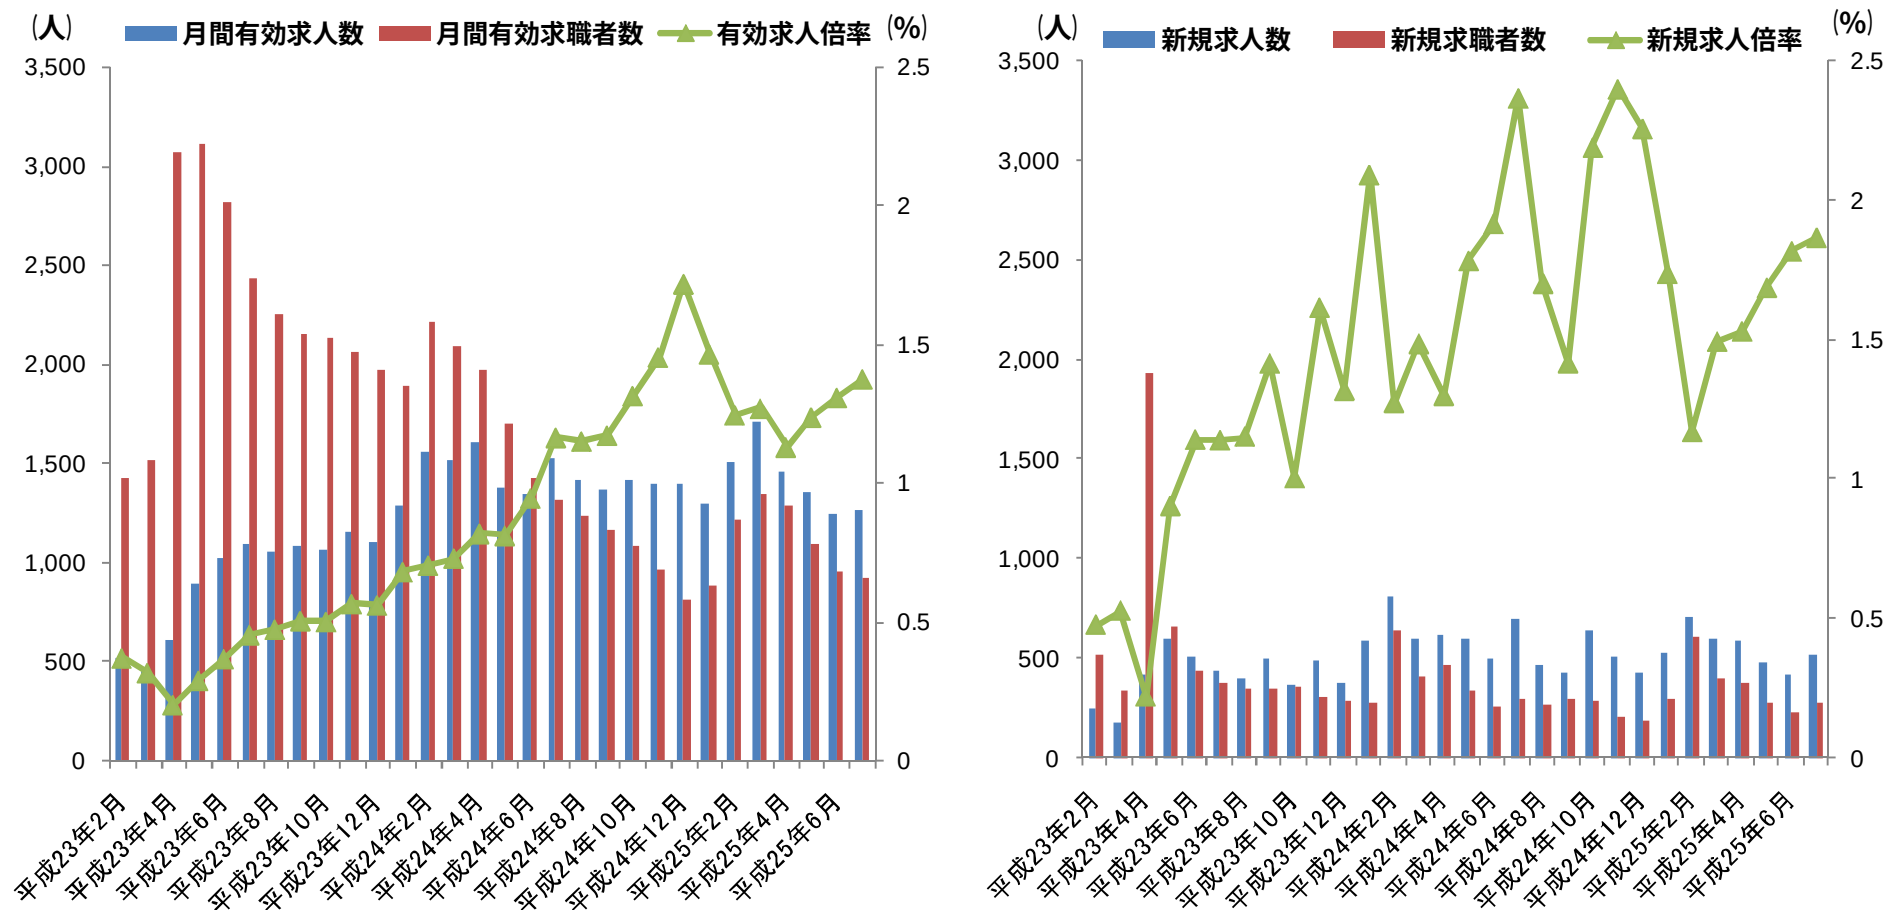

出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
 有効求職者数 : 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
 有効求人倍率 : 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

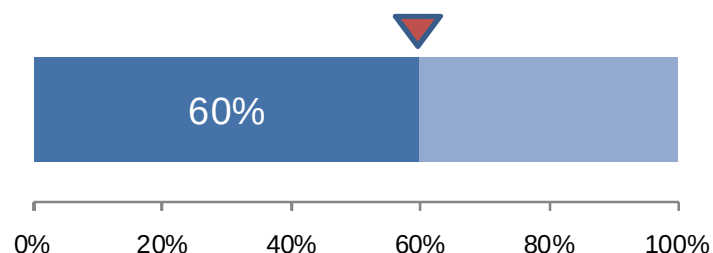

分子

復旧工事が完了した幼稚園・保育園
の数

3

(幼稚園：第一、平田) (保育園：鶴住居)

分母

被災した幼稚園・保育園の数

5


(幼稚園：第一、平田、鶴住居) (保育園：釜石、鶴住居)

※ 平田幼稚園は、平田地区区画整理事業により移転新築を計画

※ 鶴住居幼稚園は、学校施設災害復旧事業として計画 (H25年度仮設園舎を整備計画)

※ 釜石保育園は仮設園舎で運営中

小学校復旧工事の進捗

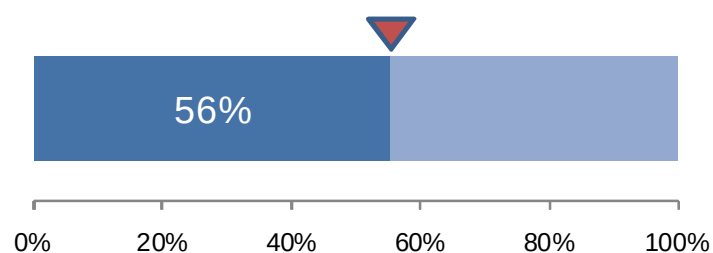

分子

復旧工事が完了した小学校の数

5

(双葉、甲子、白山、小佐野、平田)

分母

被災した小学校の数


9

(釜石、双葉、甲子、白山、平田、小佐野、栗林、鶴住居、唐丹)

※ 鶴住居小学校は、釜石東中学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画 (現在仮設校舎で運営)

※ 唐丹小学校は、唐丹中学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画 (現在仮設校舎で運営)

児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

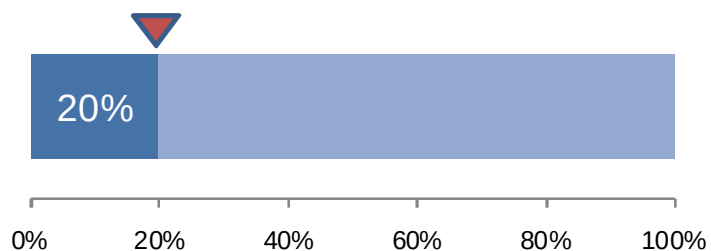

分子

復旧工事が完了した児童館・学童育成
クラブの数
(釜石)

1


分母

被災した児童館・学童育成クラブの数
(釜石、小佐野、鶴住居、唐丹、箱崎)

5

※小佐野、鶴住居、唐丹児童館・学童育成クラブは仮設施設で運営中

中学校復旧工事の進捗

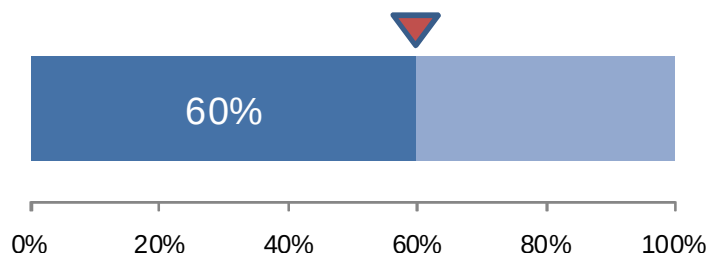

分子

復旧工事が完了した中学校の数
(釜石、大平、甲子)

3

分母

被災した中学校の数
(釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹)


5

※釜石東中学校は、鶴住居小学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画(現在仮設校舎で運営)

※唐丹中学校は、唐丹小学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画(現在仮設校舎で運営)

2-6 その他 (1)

ボランティア受け入れの人数 (累計)

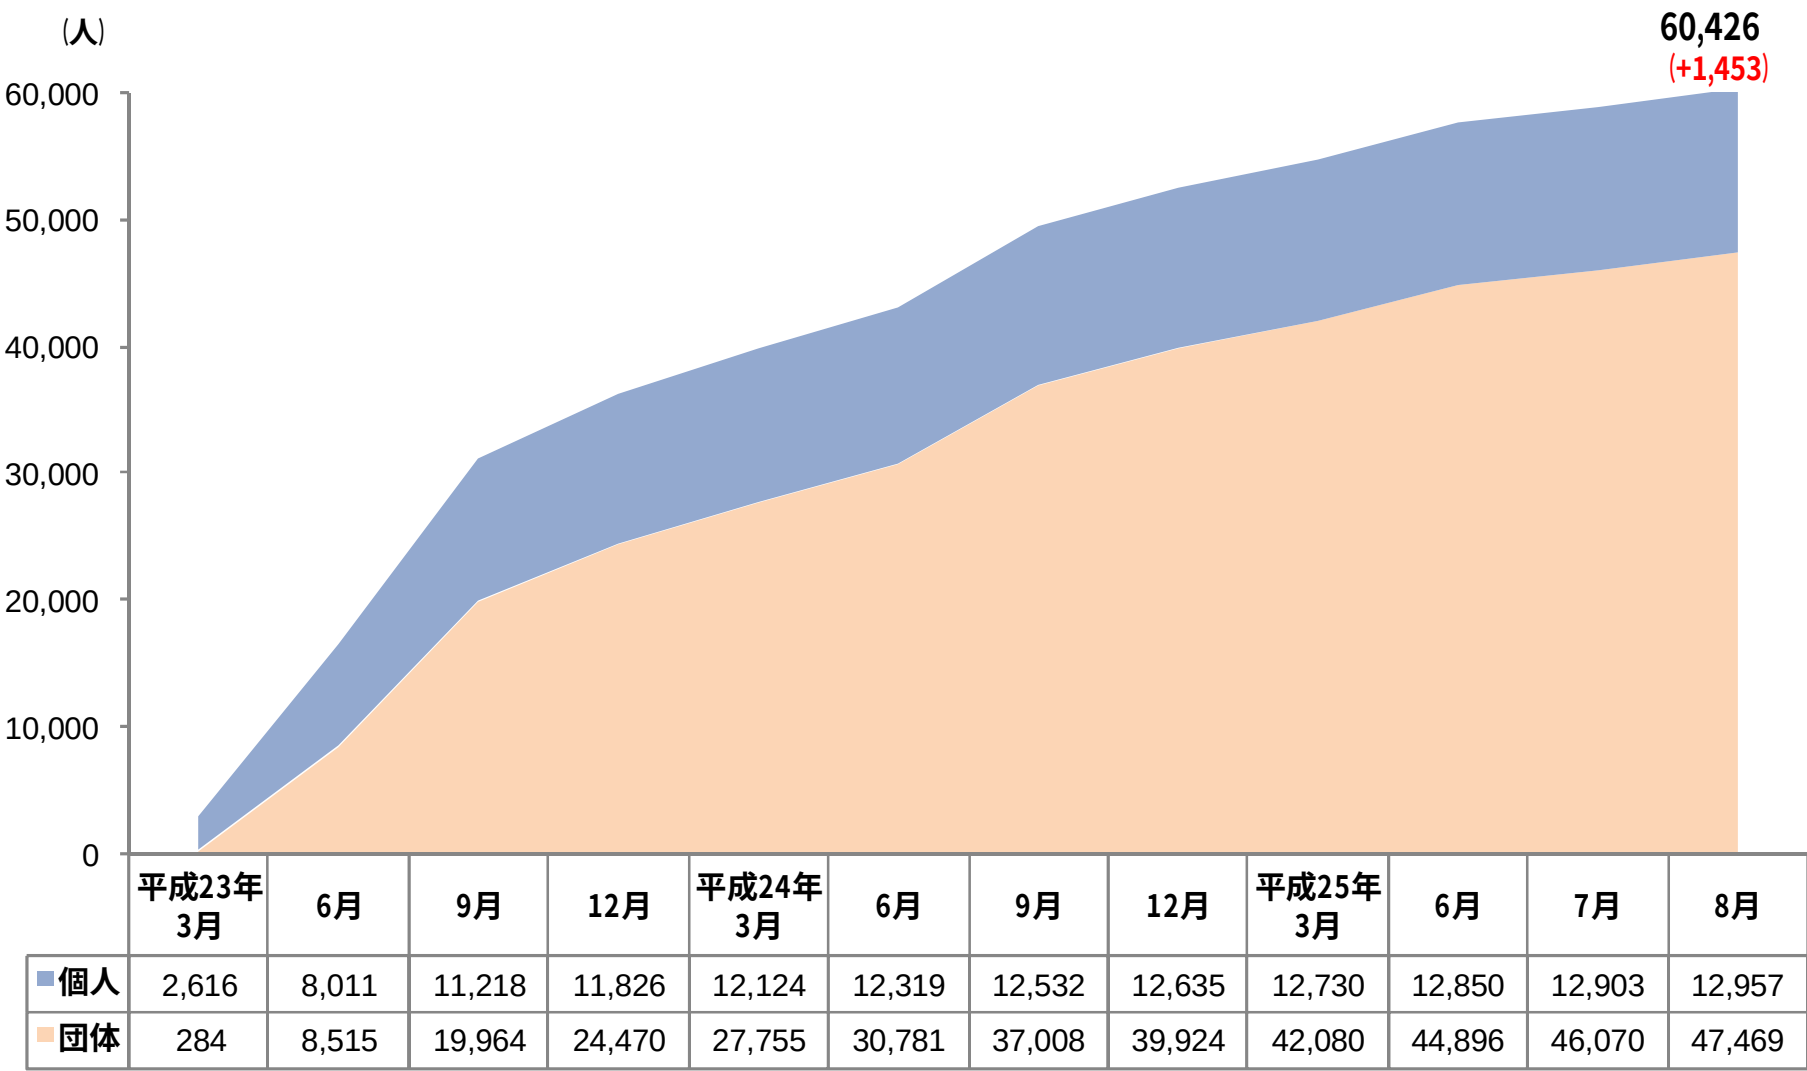

※釜石市社会福祉協議会で把握している人数


2-6 その他 (2)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

ボランティア受け入れの人数 (月別)

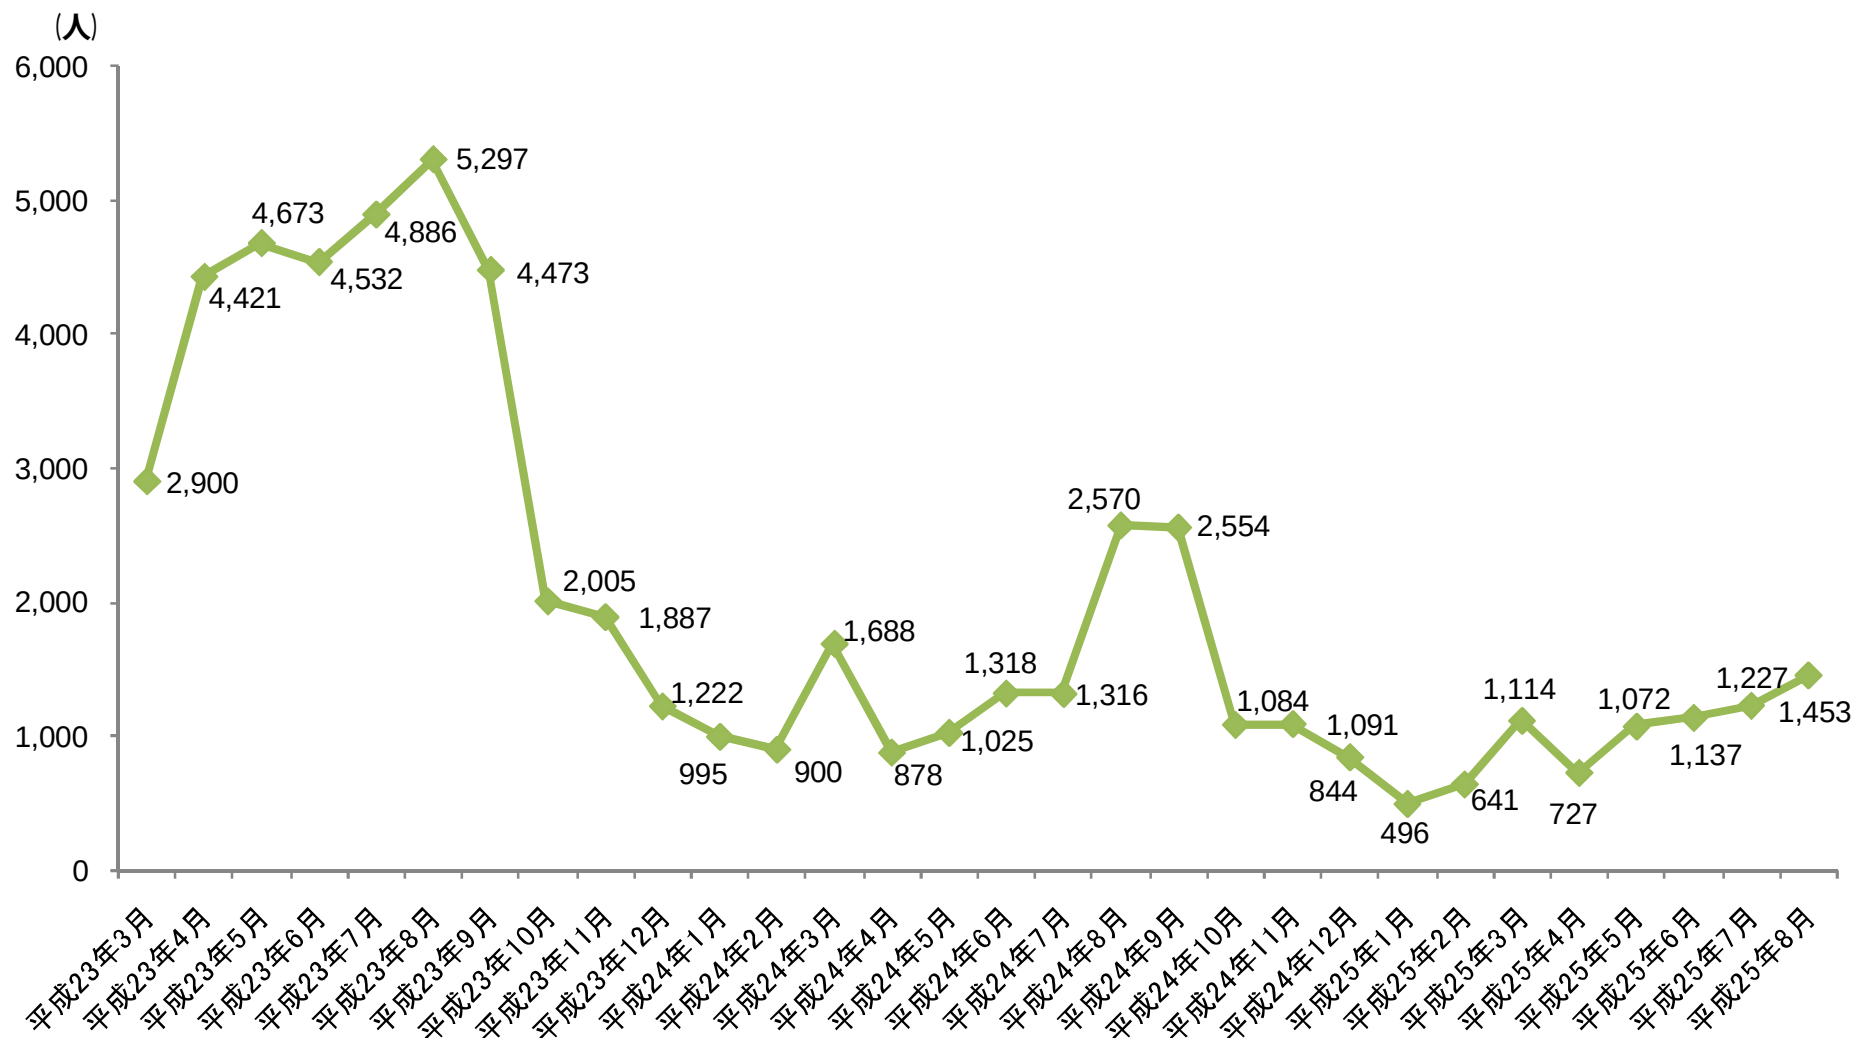

※釜石市社会福祉協議会で把握している人数


2-6 その他 (3)

目的

進捗
状況



問い合
わせ

人口 (月別)

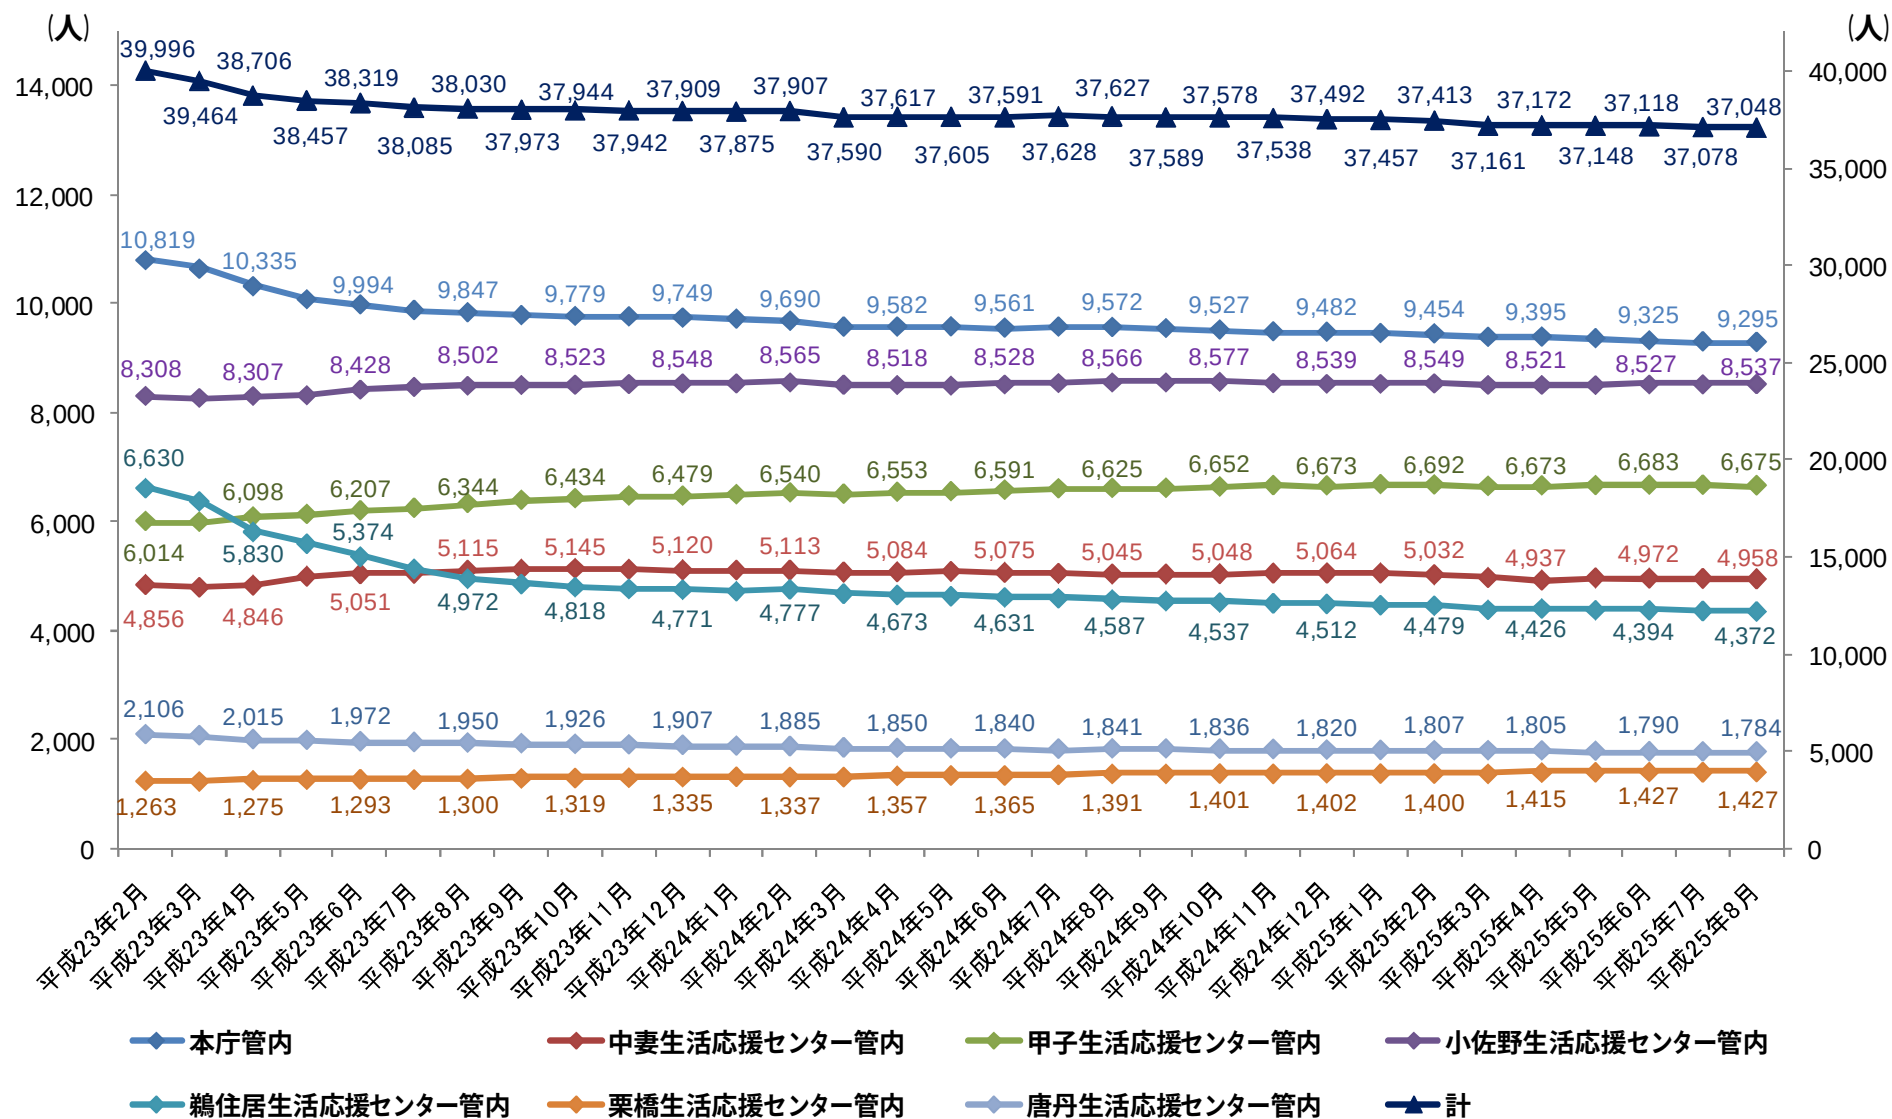

2-6 その他 (3)

人口 (社会動態)

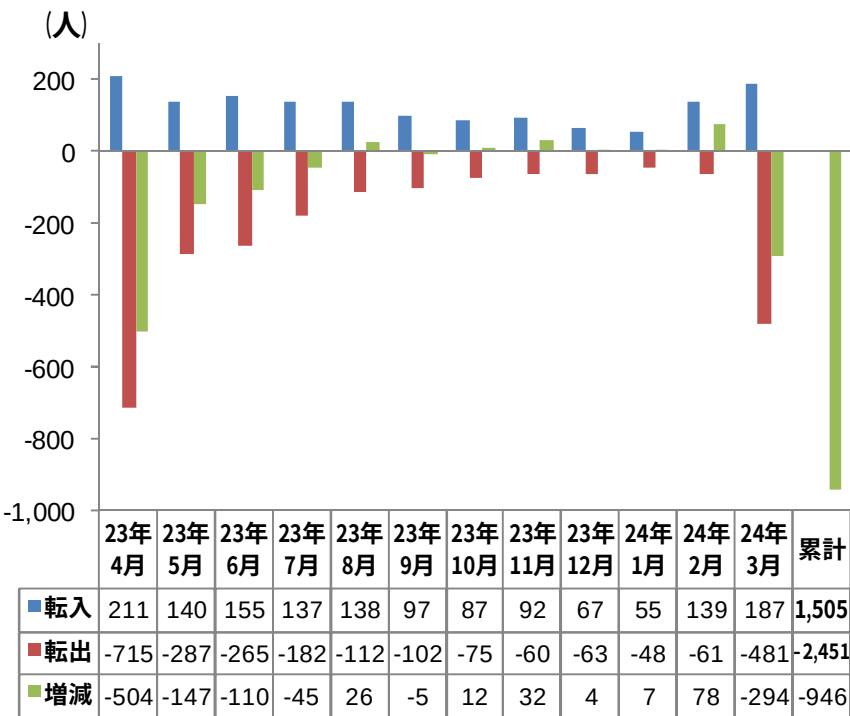

平成23年度	転入	1,505
	転出	2,451
	増減	-946

平成24年度	転入	1,292
	転出	1,347
	増減	-55

3 問い合わせ先

目的

進捗
状況

問い合
わせ

分類	項目	問い合わせ先	
全体		復興推進本部事務局	0193-22-2111 (内線192)
事業費	復旧事業費	総務企画部財政課	0193-22-2111 (内線125)
	復興事業費	復興推進本部事務局	0193-22-2111 (内線192)
	土地区画整理事業		0193-22-2111 (内線209)
	防災集団移転促進事業	復興推進本部都市整備推進室	
	漁業集落防災機能強化事業		0193-22-2111 (内線210)
土地利用	災害公営住宅整備事業	復興推進本部復興住宅整備室	0193-22-2111 (内線434)
	用地買収	復興推進本部用地調整室	0193-22-2111 (内線433)
	建物・基礎撤去		
	災害廃棄物の処理状況	復興推進本部廃棄物対策室	0193-22-2111 (内線470)
インフラ	道路災害復旧事業		
	橋りょう復旧事業	建設部建設課	0193-22-2111 (内線404)
	河川改修事業		
	下水道施設災害復旧事業	建設部下水道課	0193-22-1061
	漁港災害復旧事業 (市漁港)		
	海岸施設災害復旧事業 (市防潮堤)		
産業・雇用	水揚げ高 (魚市場)	産業振興部水産農林課	0193-22-2111 (内線306)
	水産加工業企業数		
	農地農業用施設災害復旧事業		
	観光客数	産業振興部観光交流課	0193-22-2111 (内線333)
	釜石公共職業安定所釜石本所 (釜石市・大槌町) の求人・求職状況	産業振興部商工労政課	0193-22-2111 (内線321)
教育	幼稚園・保育園復旧工事		
	小学校復旧工事	教育委員会総務課	0193-22-8832
	児童館・学童育成クラブ復旧事業	保健福祉部子ども課	0193-22-5121
	中学校復旧工事		
その他	ボランティア受入数	社会福祉協議会	0193-24-2511
	人口 (月別・社会動態)	市民生活部市民課	0193-22-2111 (内線204)
