

根浜地区  
復興まちづくり協議会・地権者連絡会

平成26年5月25日（日）

17:00～18:30

# 次 第

1. 市長からの挨拶
2. これまでの経緯
3. 土地利用計画
4. 事業実施スケジュール
5. 意見交換


## 2. これまでの経緯

---

## 2. これまでの経緯(平成25年度まちづくり協議会スケジュール)

平成25年4月29日(月)14:00～16:00

根浜地区連絡会 式次第




- 前回の意見を反映させた土地利用計画の提示
- 今後のスケジュール
- 災害危険区域の設定について

協議会での意見をふまえた計画の見直し

平成25年12月23日(月)13:30～15:00

根浜地区連絡会 式次第



- 前回の意見を反映させた土地利用計画の提示
- 今後のスケジュール


協議会での意見をふまえた計画の見直し

今回


### 3. 土地利用計画


---

土地利用計画案(前回) ※H25.12.23 提示

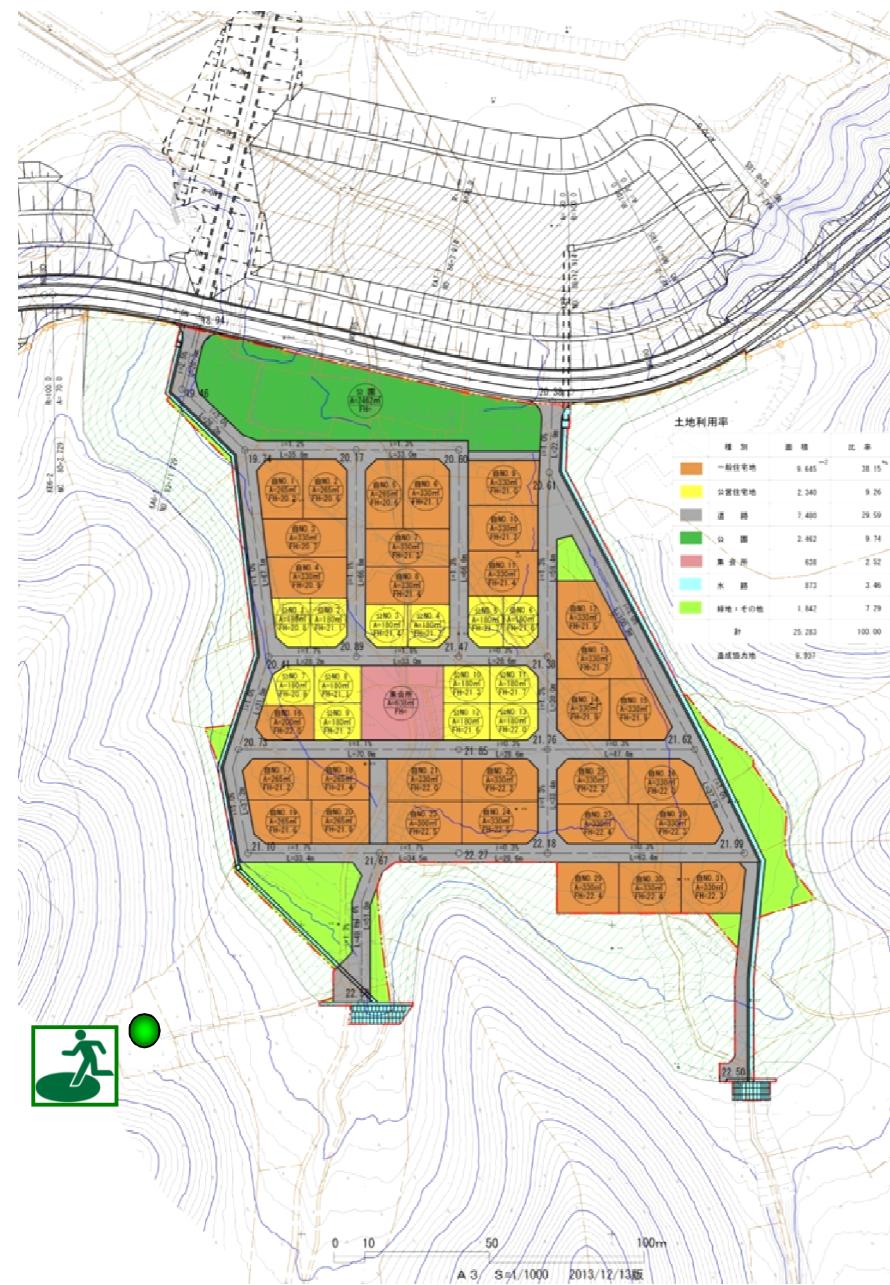


# 土地利用計画案(詳細設計)

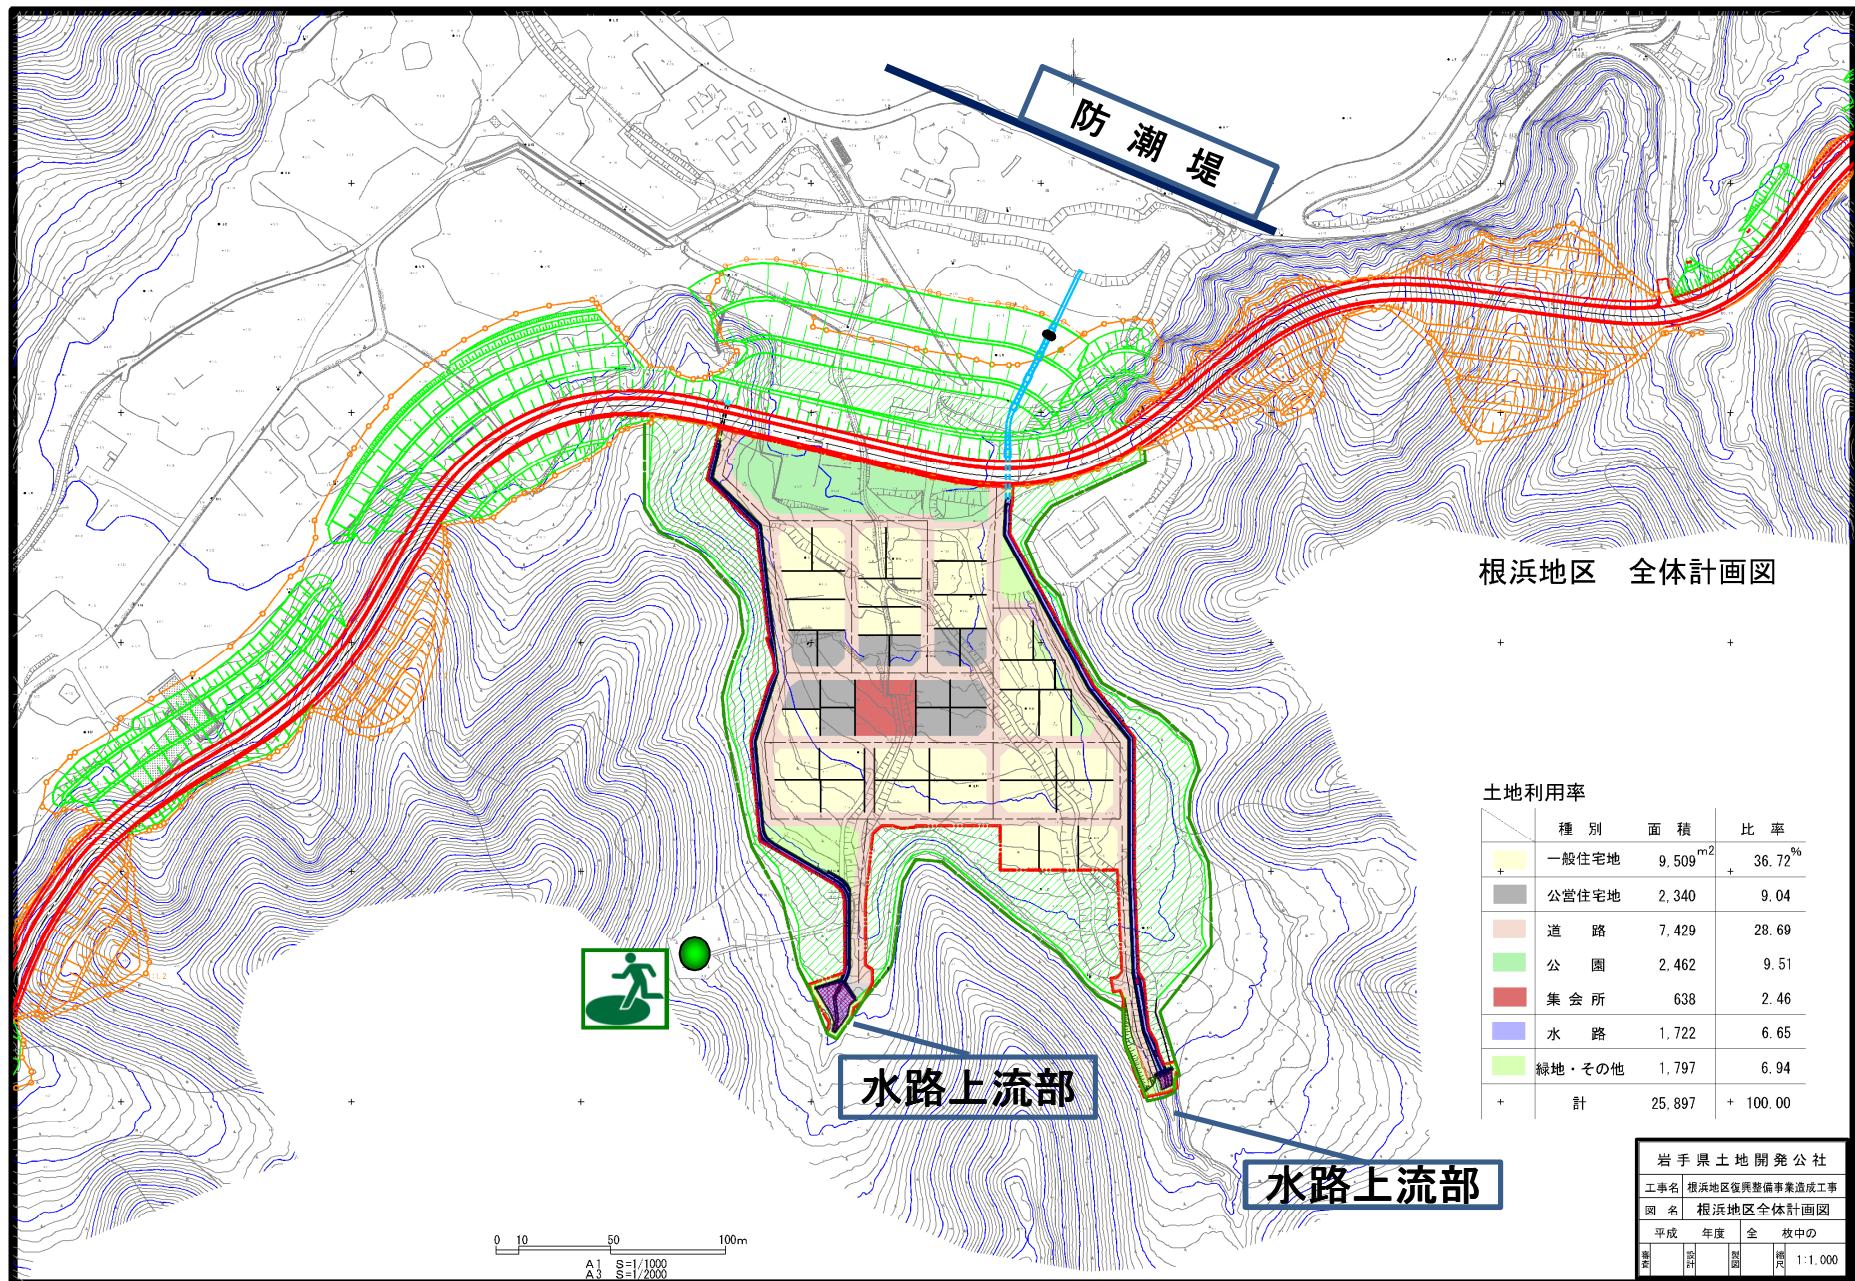


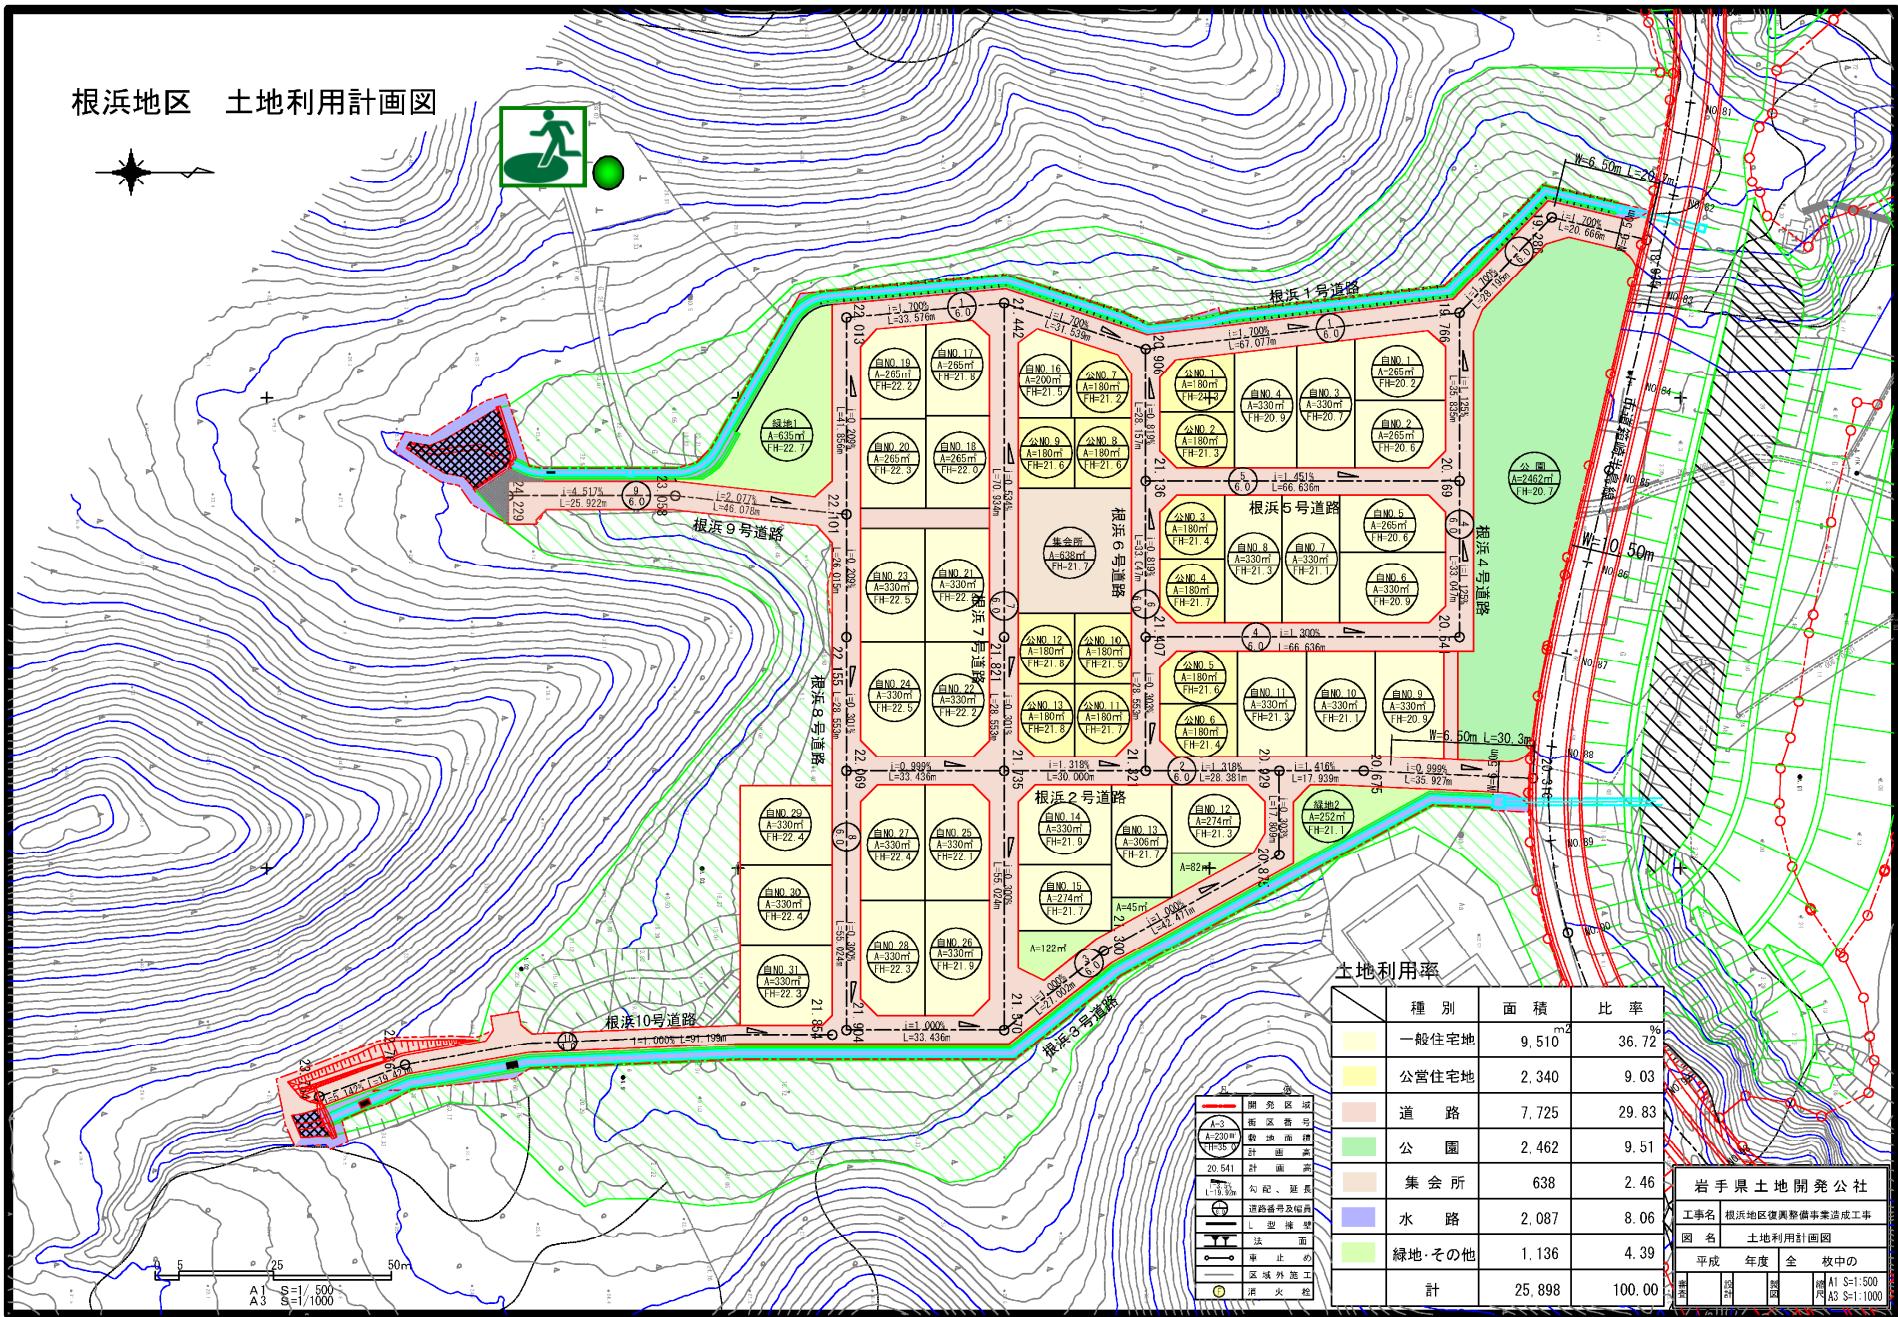

標準断面図 (W=6.0m)

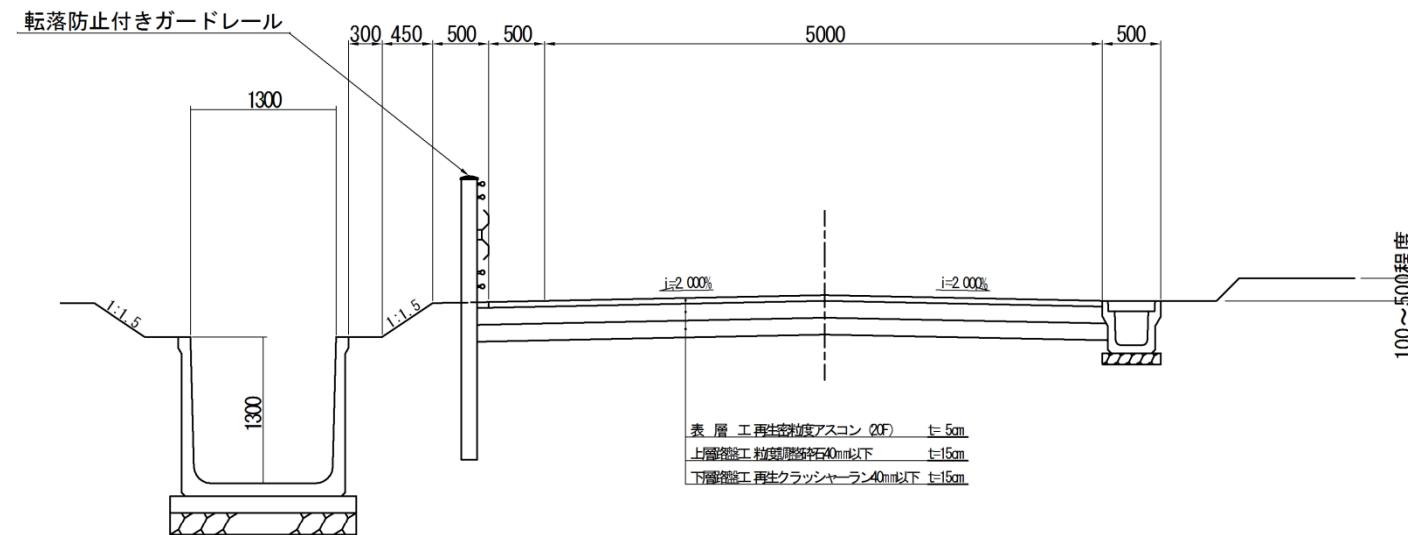


東側水路呑口工詳細図 S=1:50

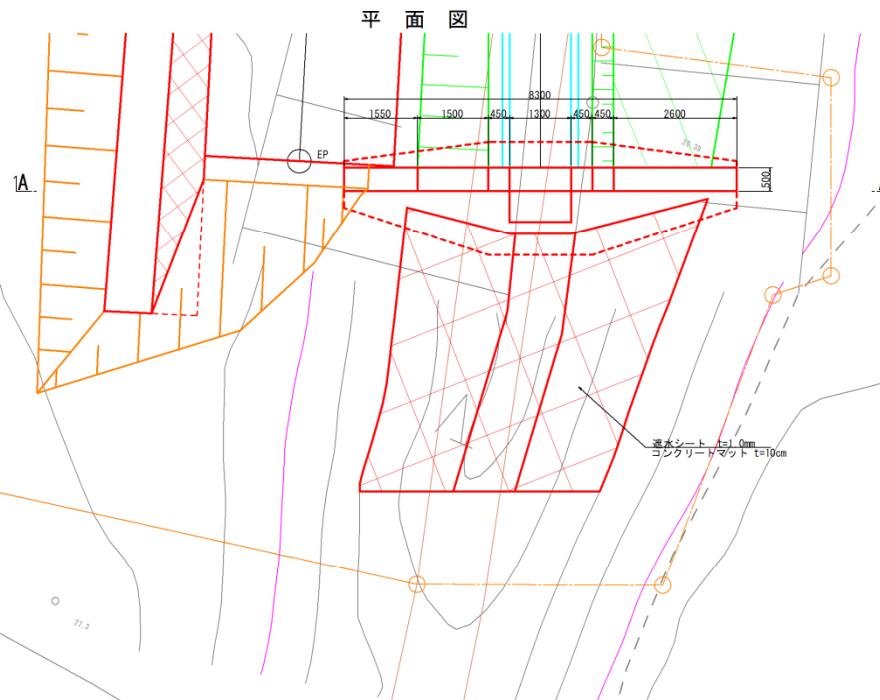


現況水路断面 S=1:20

計画水路断面 S=1:20



A-A断面図 S=1:50

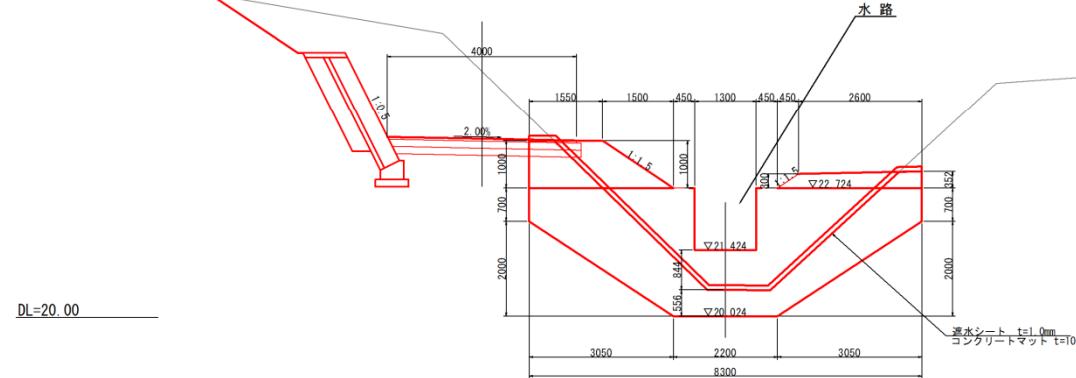


岩手県土地開発公社				
工事名	根浜地区復興整備事業造成工事			
図名	東側水路吞口詳細図			
平成	年度	全	枚中の	
廿五	四〇	四〇	八五	1:50

## 西側水路吞口工詳細図 S=1:50


平面図 S=1:100




現況水路断面 S=1:20



計画水路断面 S=1:20




A-A 断面図 1:50



DL=20.00


岩手県土地開発公社			
工事名：根浜地区復興整備事業造成工事			
図名：西側水路吞口詳細図			
平成	年度	全	枚中の
2008	計数	別紙	丸括弧

# 暗渠排水管敷設計画図

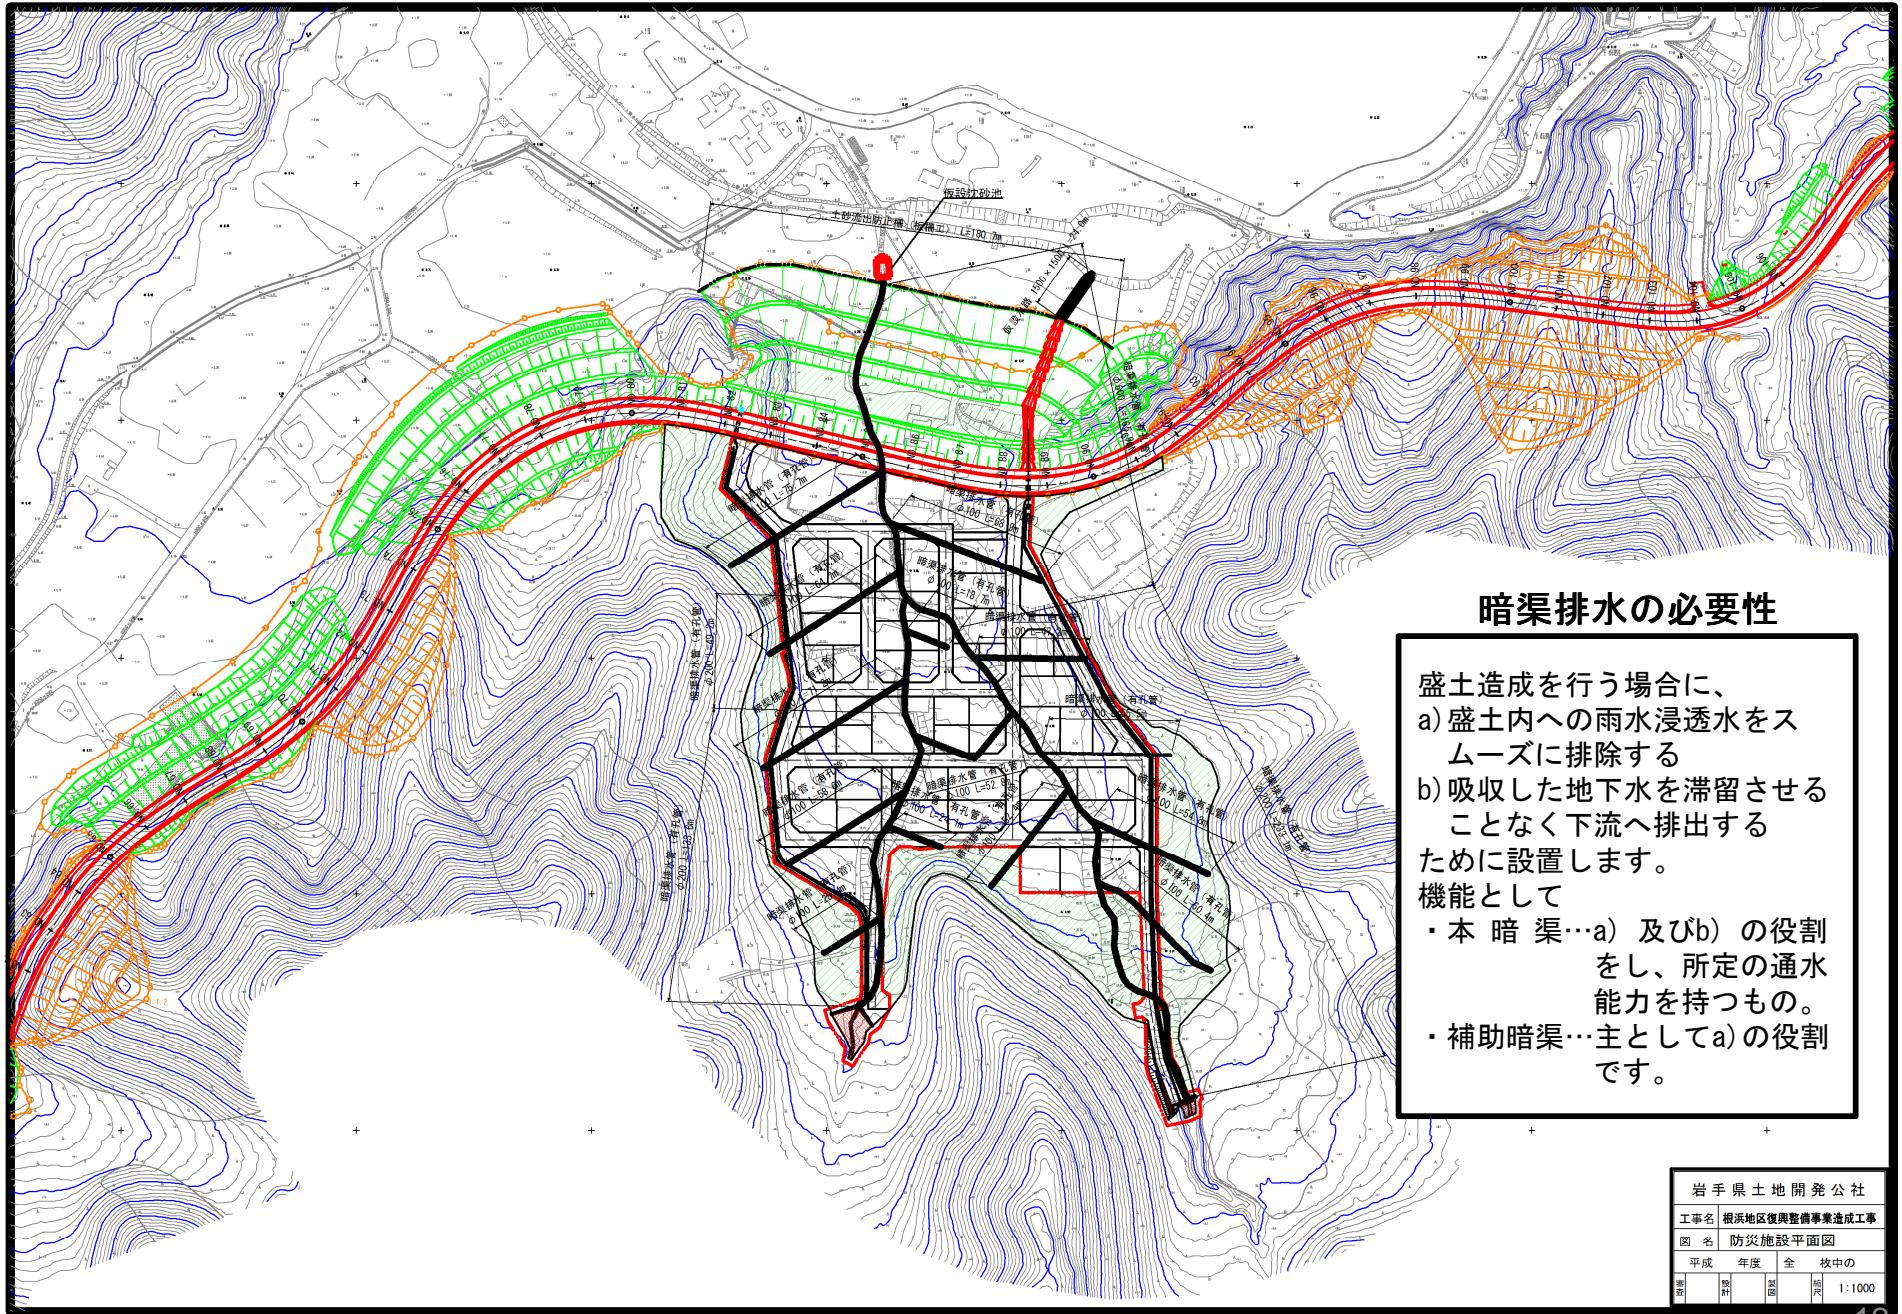


碎石排水工

計画地盤

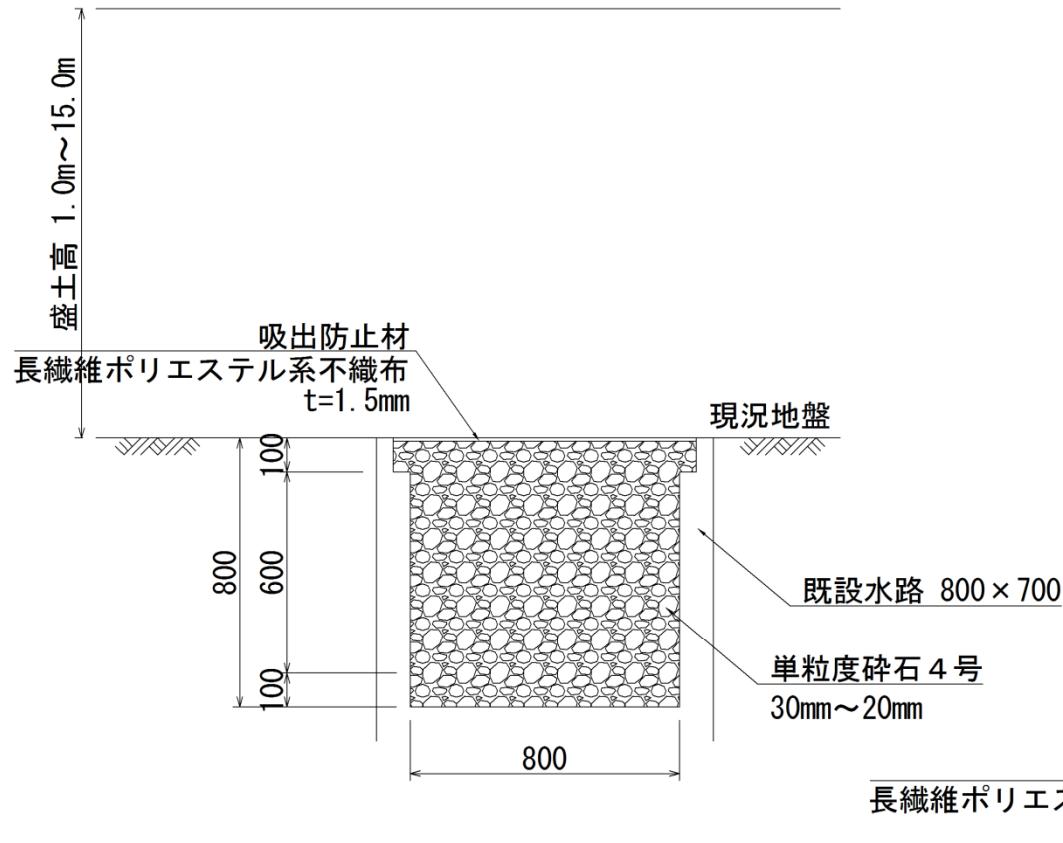

# 暗渠排水工

計画地盤

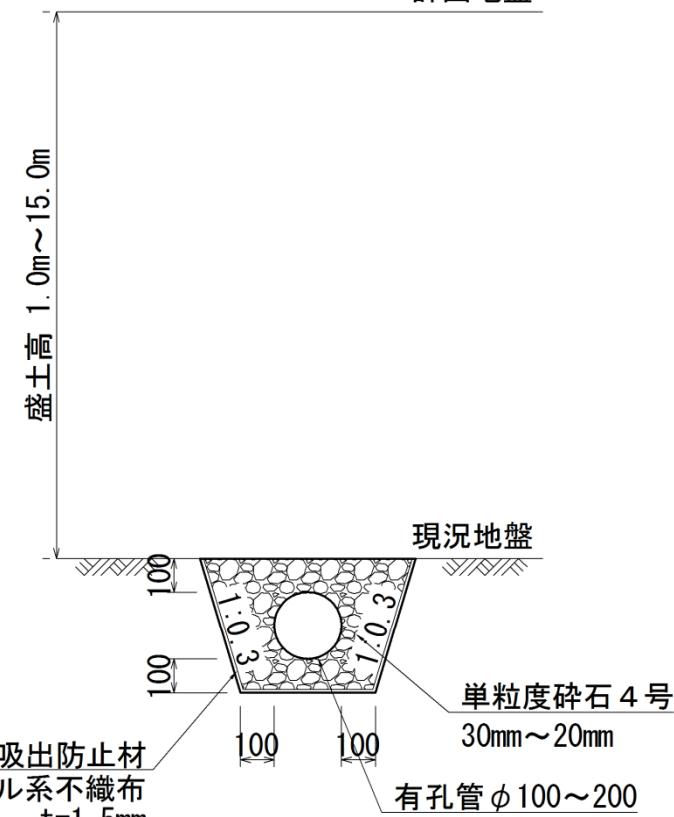

## 4. 事業実施スケジュール

---

# 事業実施スケジュール【根浜地区】

※進捗状況に応じて前後します。

地区	項目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	
根浜	まちづくり協議会	● 4/29		● 12/23			5/25										
	設計・協議	→	→	→		現時点											
	用地買収	→								25.9~26.12							
	造成工事			→						26.6~28.2							
	現場見学会				● 5/27									→			
	復興公営住宅									27.1~27.9					28.3~28.10		
	自力再建住宅							27.1					28.3				
	移転跡地整備事業	跡地利用検討		→													

凡例

→ 黒:前回  
赤:実施

## 5. 意見交換

---
