


甲子川水門の進捗状況について

---


(岩手県沿岸広域振興局土木部)

## 甲子川水門計画

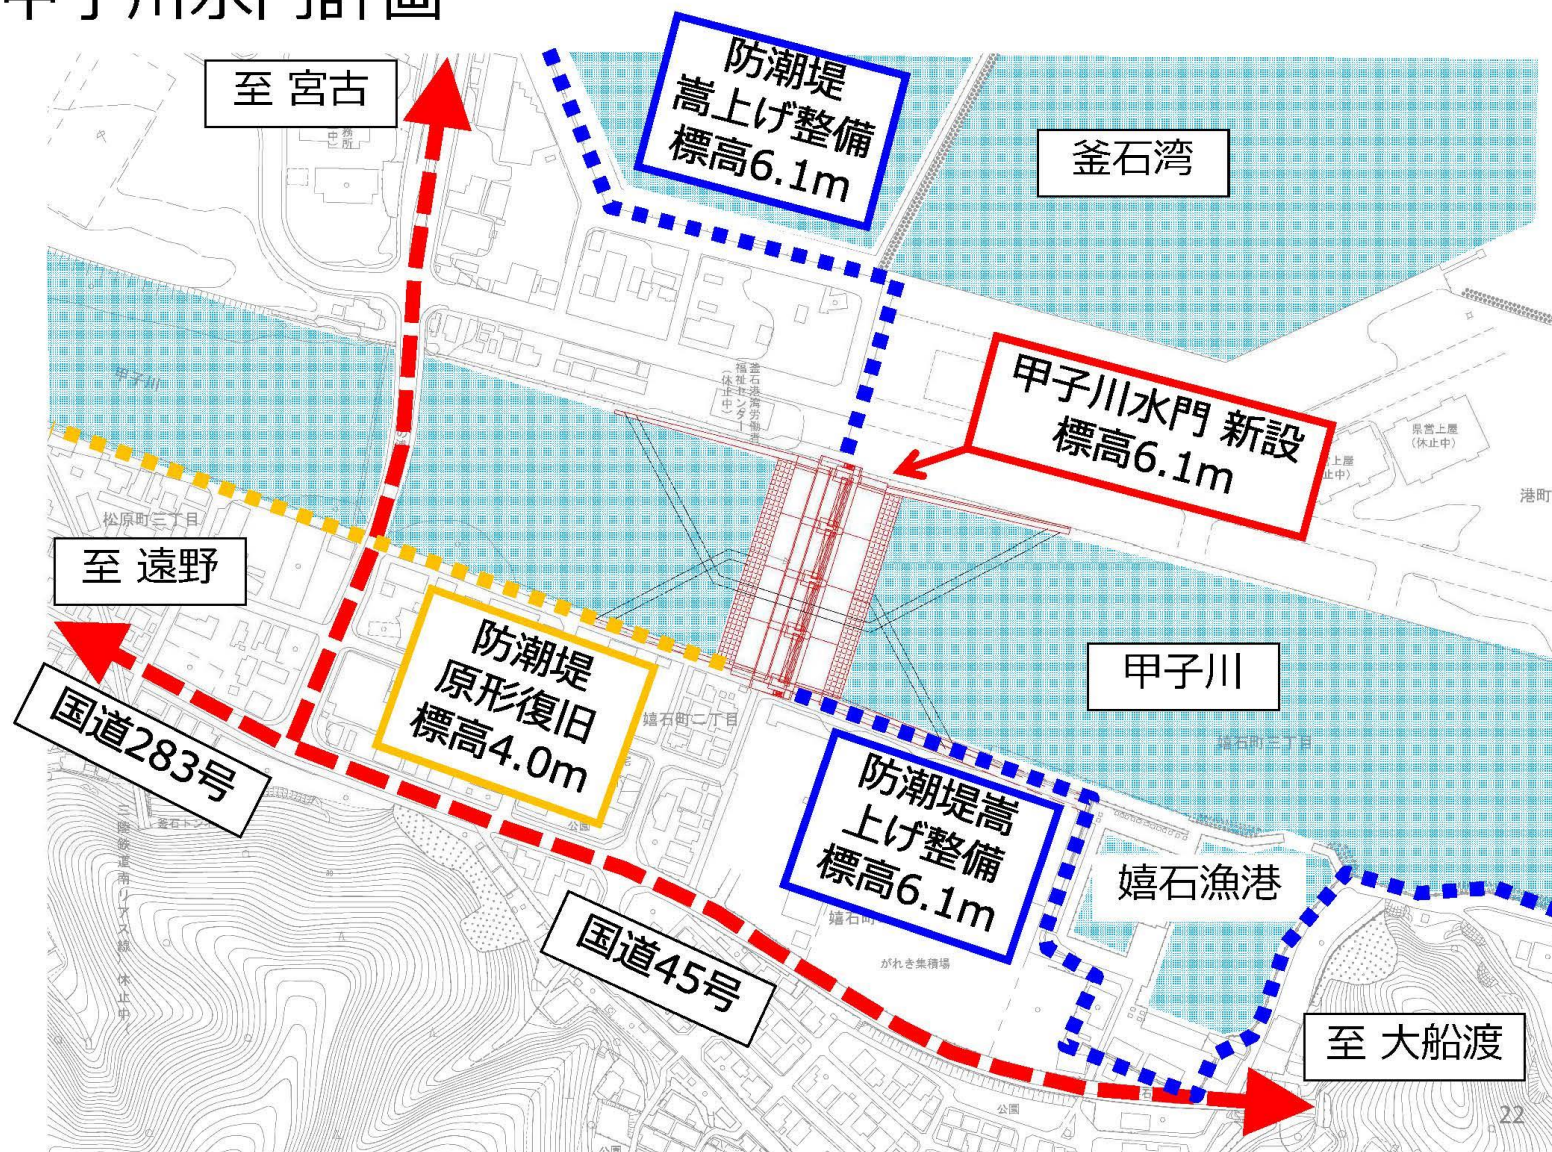

# 甲子川水門の進捗状況について

## 甲子川水門 計画図

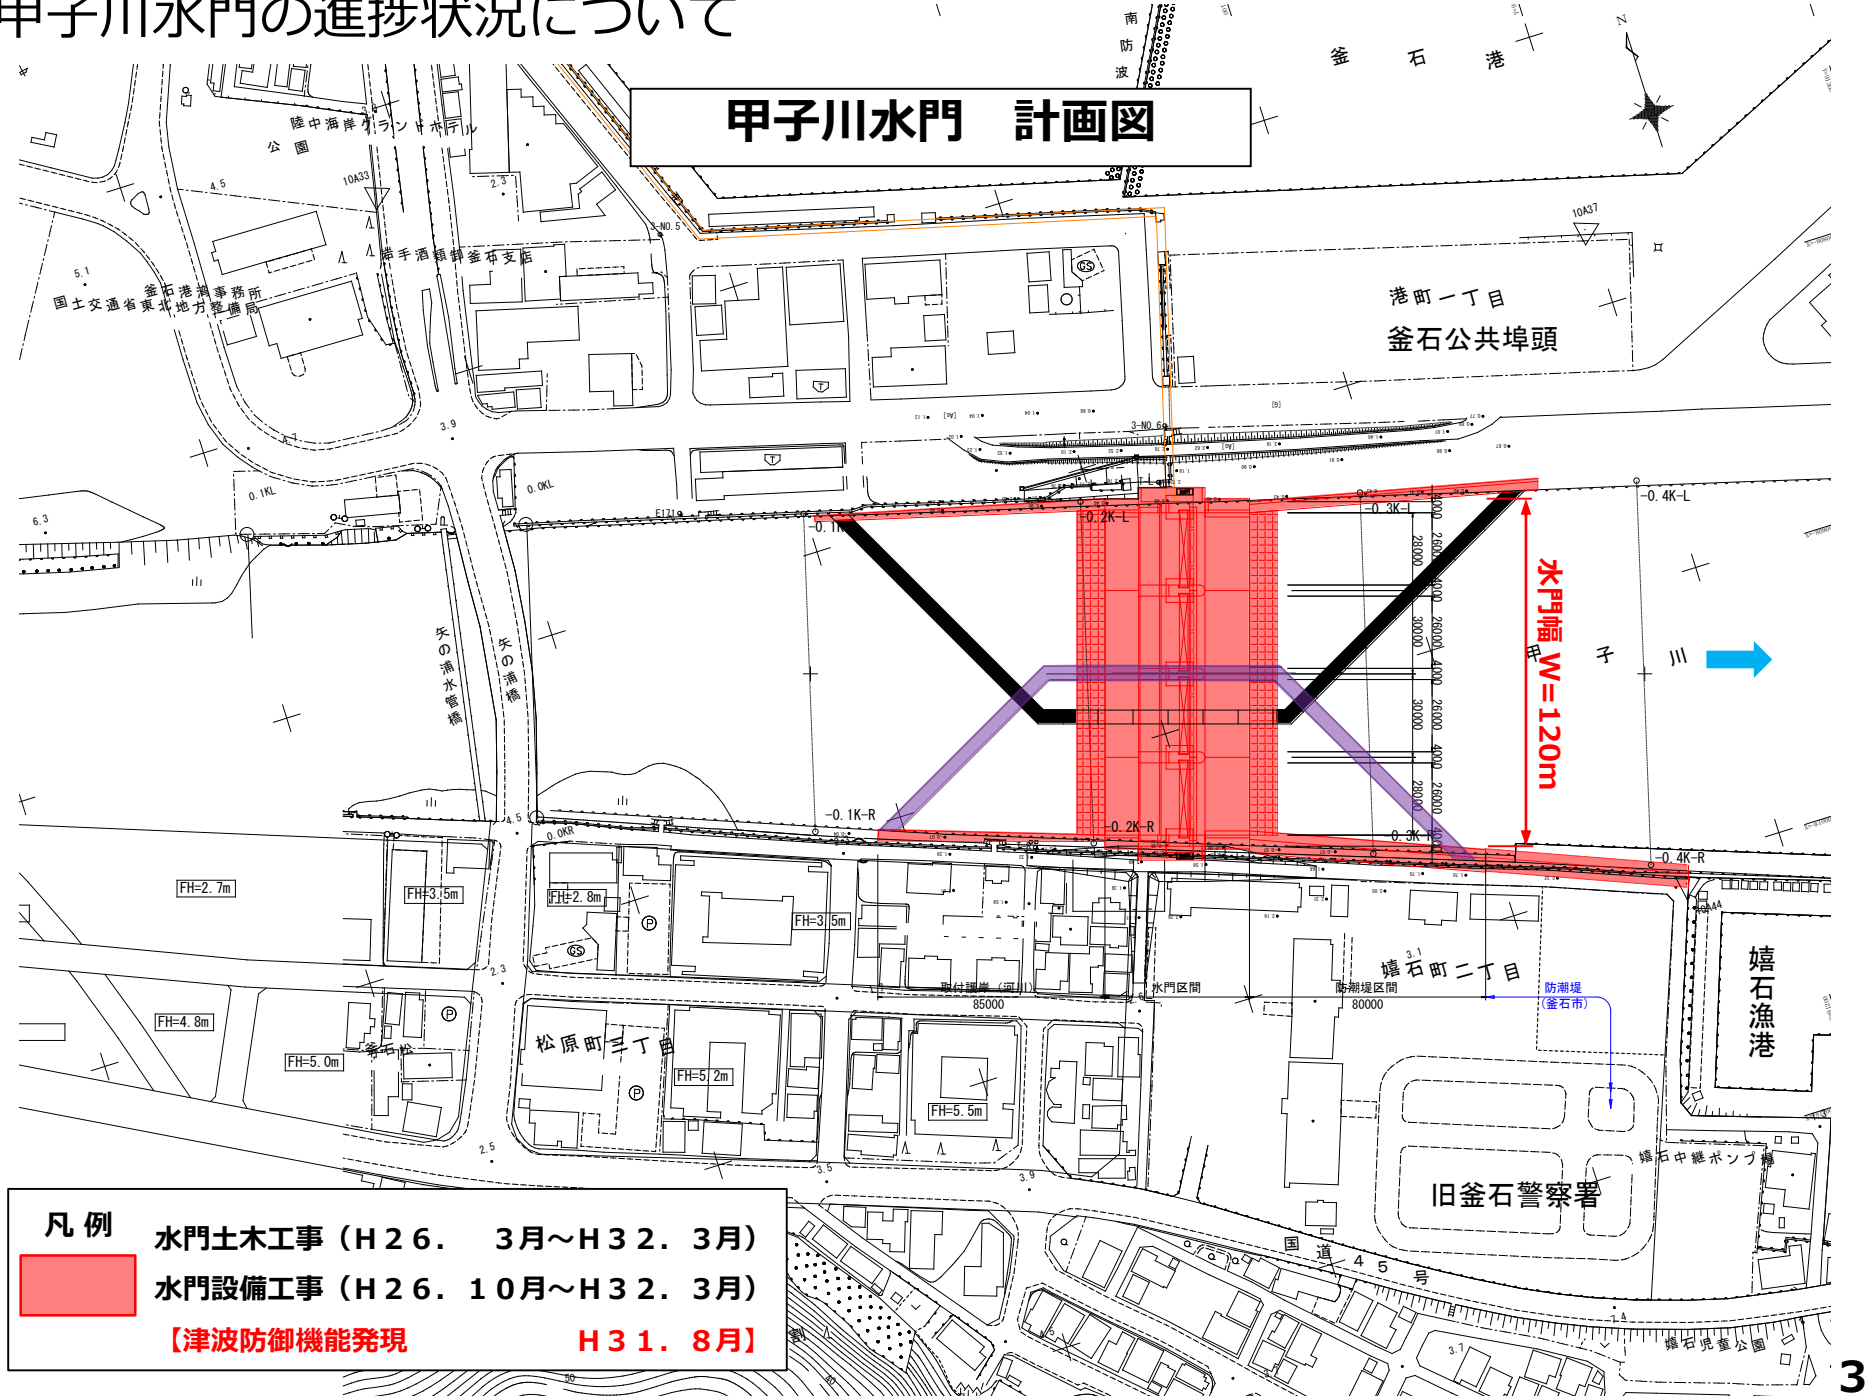

凡例	水門土木工事 (H26. 3月~H32. 3月)
	水門設備工事 (H26. 10月~H32. 3月)
	【津波防御機能発現 H31. 8月】

# 甲子川水門(釜石市)工事かわら版 Vol.1

平成 30 年6月8日発行  
岩手県沿岸広域振興局土木部

## 1. 今回のトピック：工事概要

本工事は、釜石市を流れる甲子川に、釜石湾海岸の防潮堤とつながる水門をつくり、津波から人命・財産や種々の産業・経済活動および国土を守ることを目的としています。

## 2. 現在の状況



### ○仮締切内工事

5月は、建設機械や運搬車両などが作業できるヤードを確保するために、赤枠内で囲った範囲の水を抜いて乾燥した状態にしていく作業を行っていました。

今後、水門本体の築造に向けて、工事用道路の設置や河床の掘削を行い、引き続き、基礎杭の打込み作業を行う予定です。

## 3. 工事の状況



仮締切内排水の様子



掘削の様子

## 4. 今後の予定

- (1) 右岸側仮締切内の排水と掘削（平成 30 年6月～7月中旬）
- (2) 基礎杭の打込み（平成 30 年7月中旬～10月）  
→工事に伴い大きな音が発生する場合があります。
- (3) 水門本体のコンクリート打設（平成 30 年11月～）
- (4) 津波防護機能の発現（ラグビーワールドカップ）
- (5) 水門完成（平成 32 年3月）

## 5. その他

「かわら版」は随時発行していきます。また、基礎杭の打込み作業を見学していただくための現場説明会（見学会）を開催しますので、詳細が決まりましたら、改めて案内させていただきます。

### ※問い合わせ

岩手県沿岸広域振興局土木部復興まちづくり課 TEL:0193-27-5574  
（株）熊谷組・（株）本間組・（株）小澤組特定共同企業体 TEL:0193-22-6515
