

**箱崎地区
復興まちづくり協議会・地権者連絡会**

**平成26年6月15日（日）
14:00～15:30**

次 第


1. 市長からの挨拶
2. 防潮堤の計画変更について
3. これまでの経緯
4. 土地利用計画
5. 事業実施スケジュール
6. 箱崎半島線の進捗状況について
7. 意見交換

2. 防潮堤の計画変更について


箱崎漁港海岸

事業主体	岩手県
所在地	岩手県釜石市


昨年までの防潮堤計画（杭式直立堤＋堤内盛土）を**傾斜堤(案)**に計画の変更。(財務省の認可を得られなかったため)
再設計が必要のため、設計の発注からのやり直しとなった。

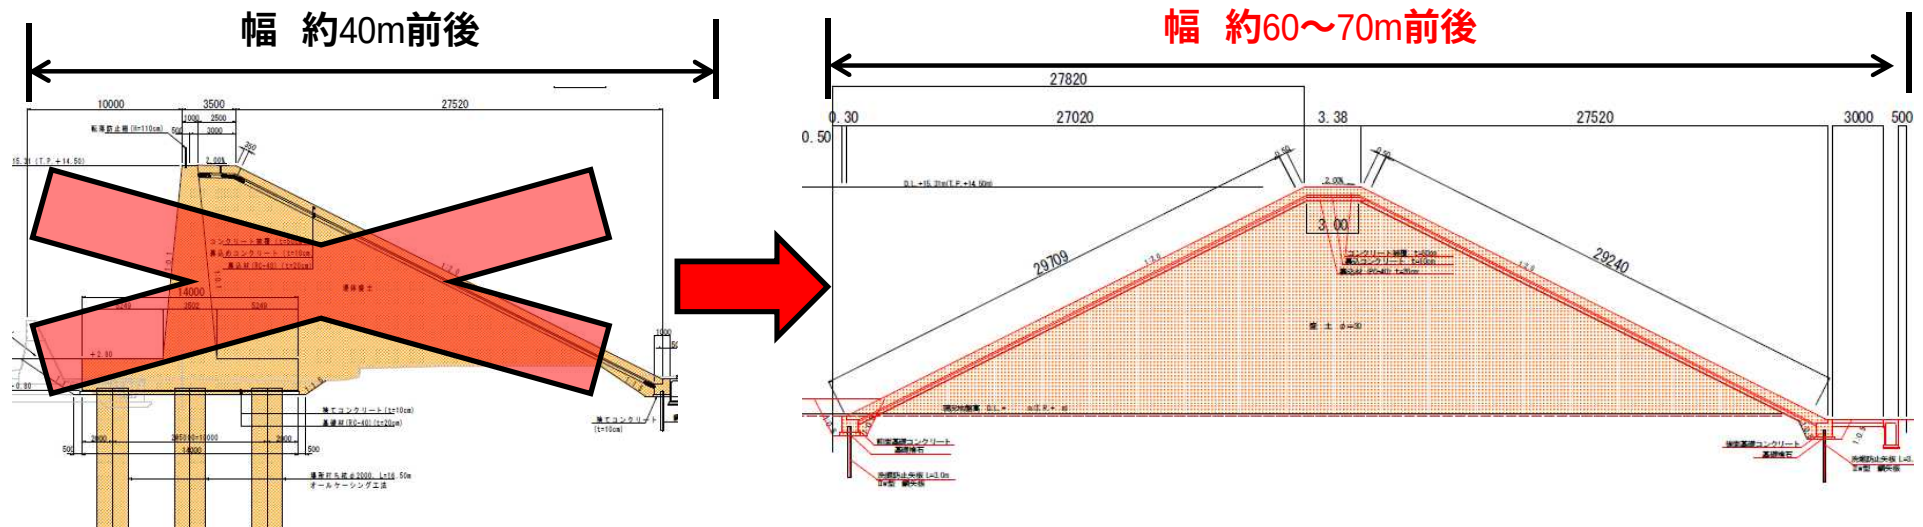

昨年度末より新しくコンサルと契約し、新断面(傾斜堤)での設計のやり直しを進める。

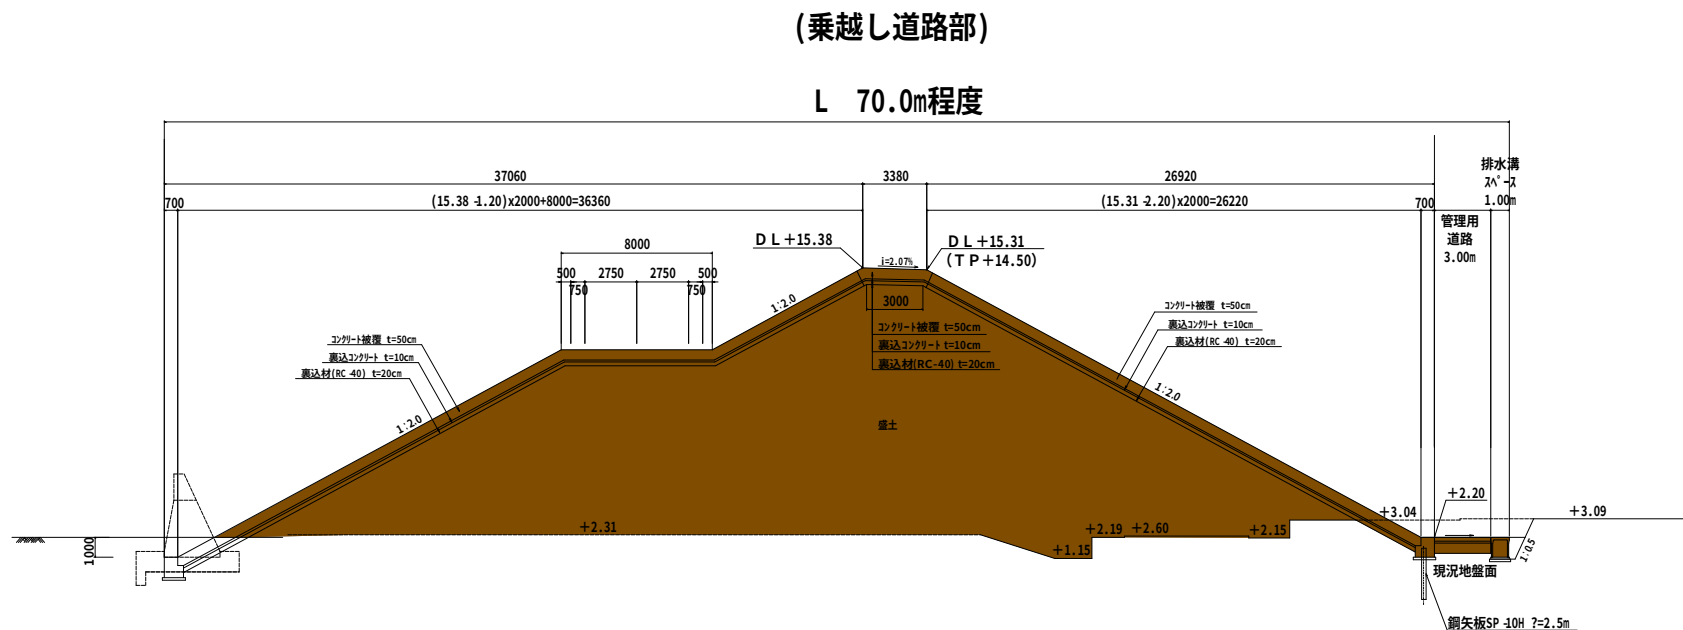


新断面(傾斜堤)の構造決定の為の地質調査。

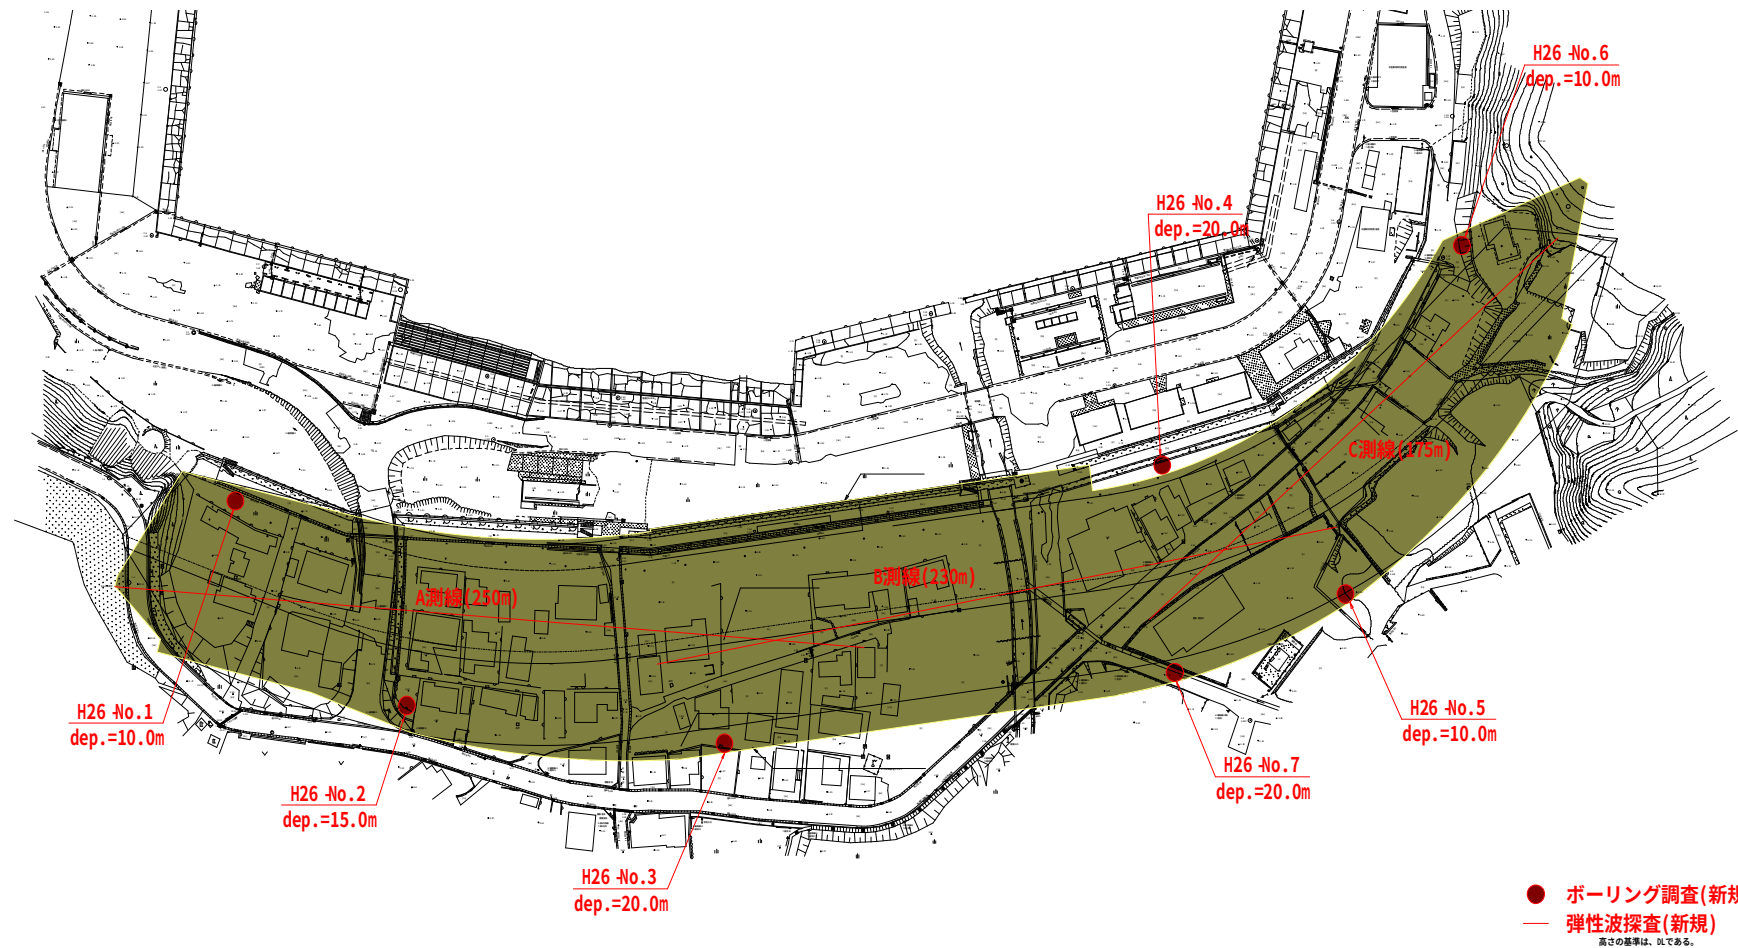

現地調査の結果をふまえ、新断面(傾斜堤)の構造を決定していく。
調査の成果のとりまとめ作業中。(現地調査終了)



L 60.0m程度

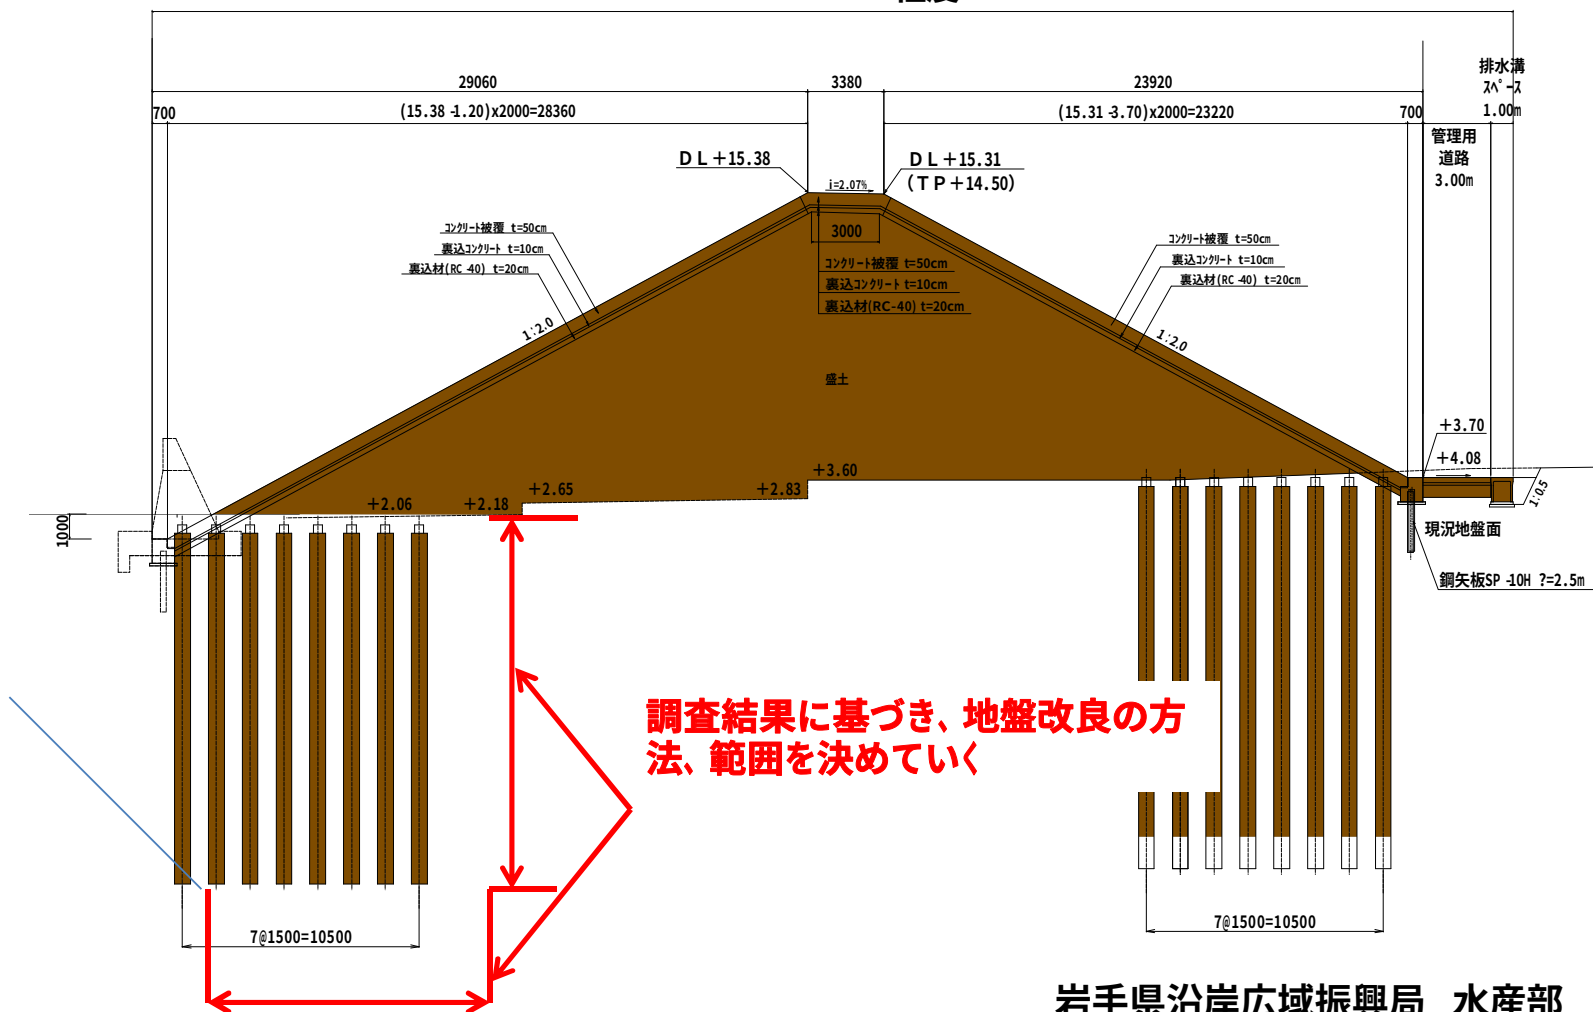


新断面(傾斜堤)の構造決定の為の現地測量。



現地測量の結果をふまえ、新断面(傾斜堤)の位置や幅を決定していく。
 測量の成果のとりまとめ作業中。(現地測量作業は終了)

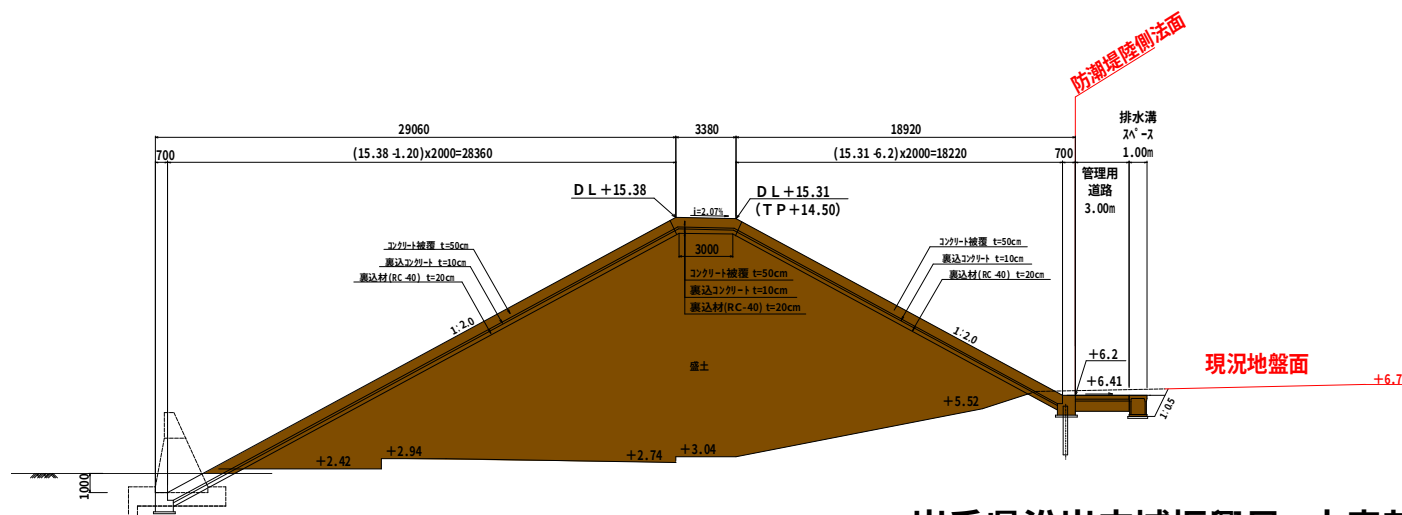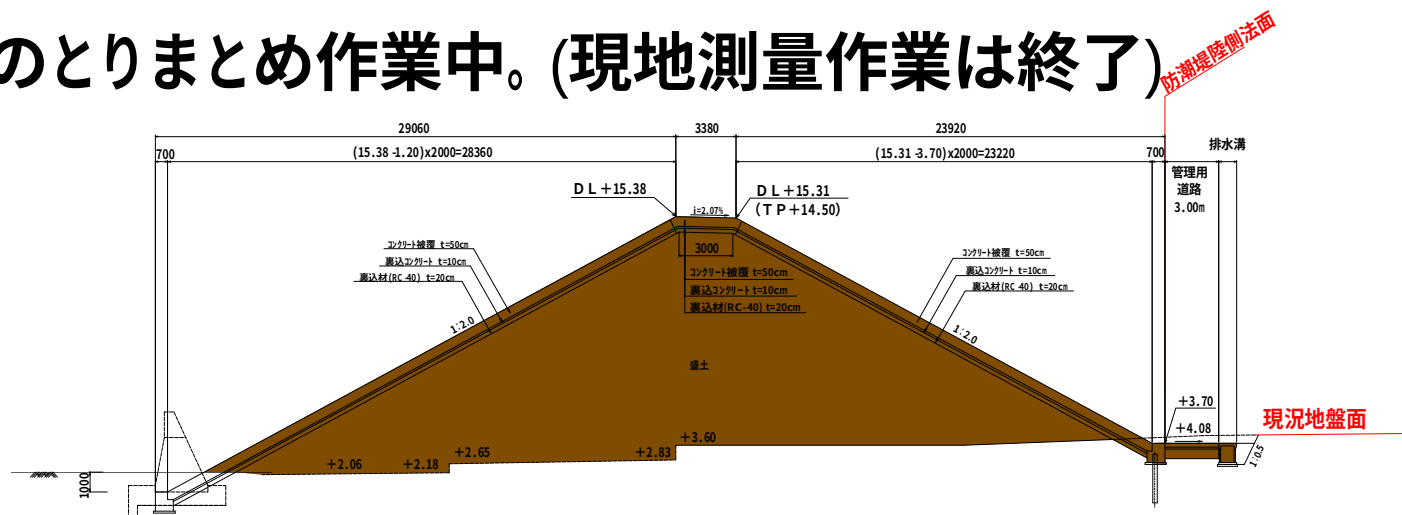

現地測量の結果をふまえ、新断面(傾斜堤)の位置や幅を決定していく。
測量の成果のとりまとめ作業中。

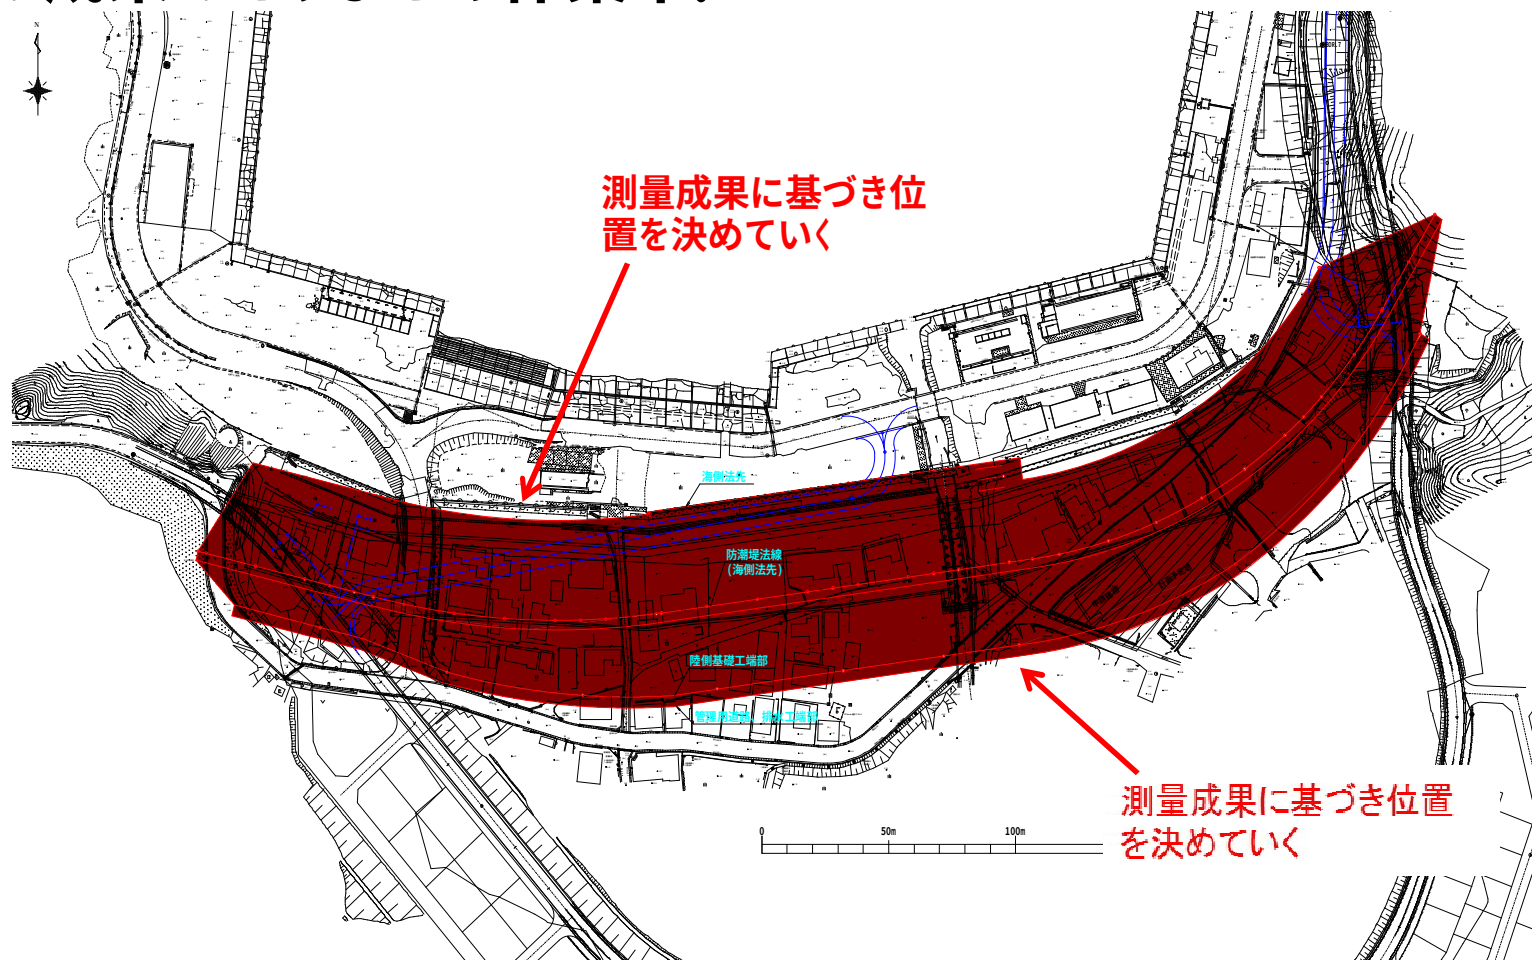

箱崎漁港海岸 計画工程表(案)

	平成26年度												平成27年度												平成28年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<箱崎地区>	現在																																				
地質調査・構造物設計業務委託	調査・設計																																				
	測量			ボーリング																																	
防潮堤（傾斜堤）	許認可																																				
						設計・積算																															
									工事契約		工事施工																										
用地関係						用地測量																															
									境界確認・立会																												
									用地交渉																												
												契約～代金支払																									
まちづくり(釜石市)				釜石市協議等																																	

3. これまでの経緯

平成25年2月9日(土) 14:00～17:00

浜のすまいを考える会



●土地利用計画について意見交換

平成25年5月14日(火) 10:00～17:00

意見交換



●土地利用計画について意見交換

意見をふまえた計画の見直し

平成25年7月20日(日) 14:00～15:30

まちづくり協議会・地権者連絡会

- 前回の意見を反映させた土地利用計画の提示
- 今後のスケジュール
- 災害危険区域

協議会での意見をふまえた計画の見直し

平成25年12月15日 箱崎地区防潮堤計画変更に伴う説明会


平成25年12月15日 安全祈願祭

平成26年 2月14日 現地に目印(丁張)を設置


現在

4. 土地利用計画


最終意向調査結果

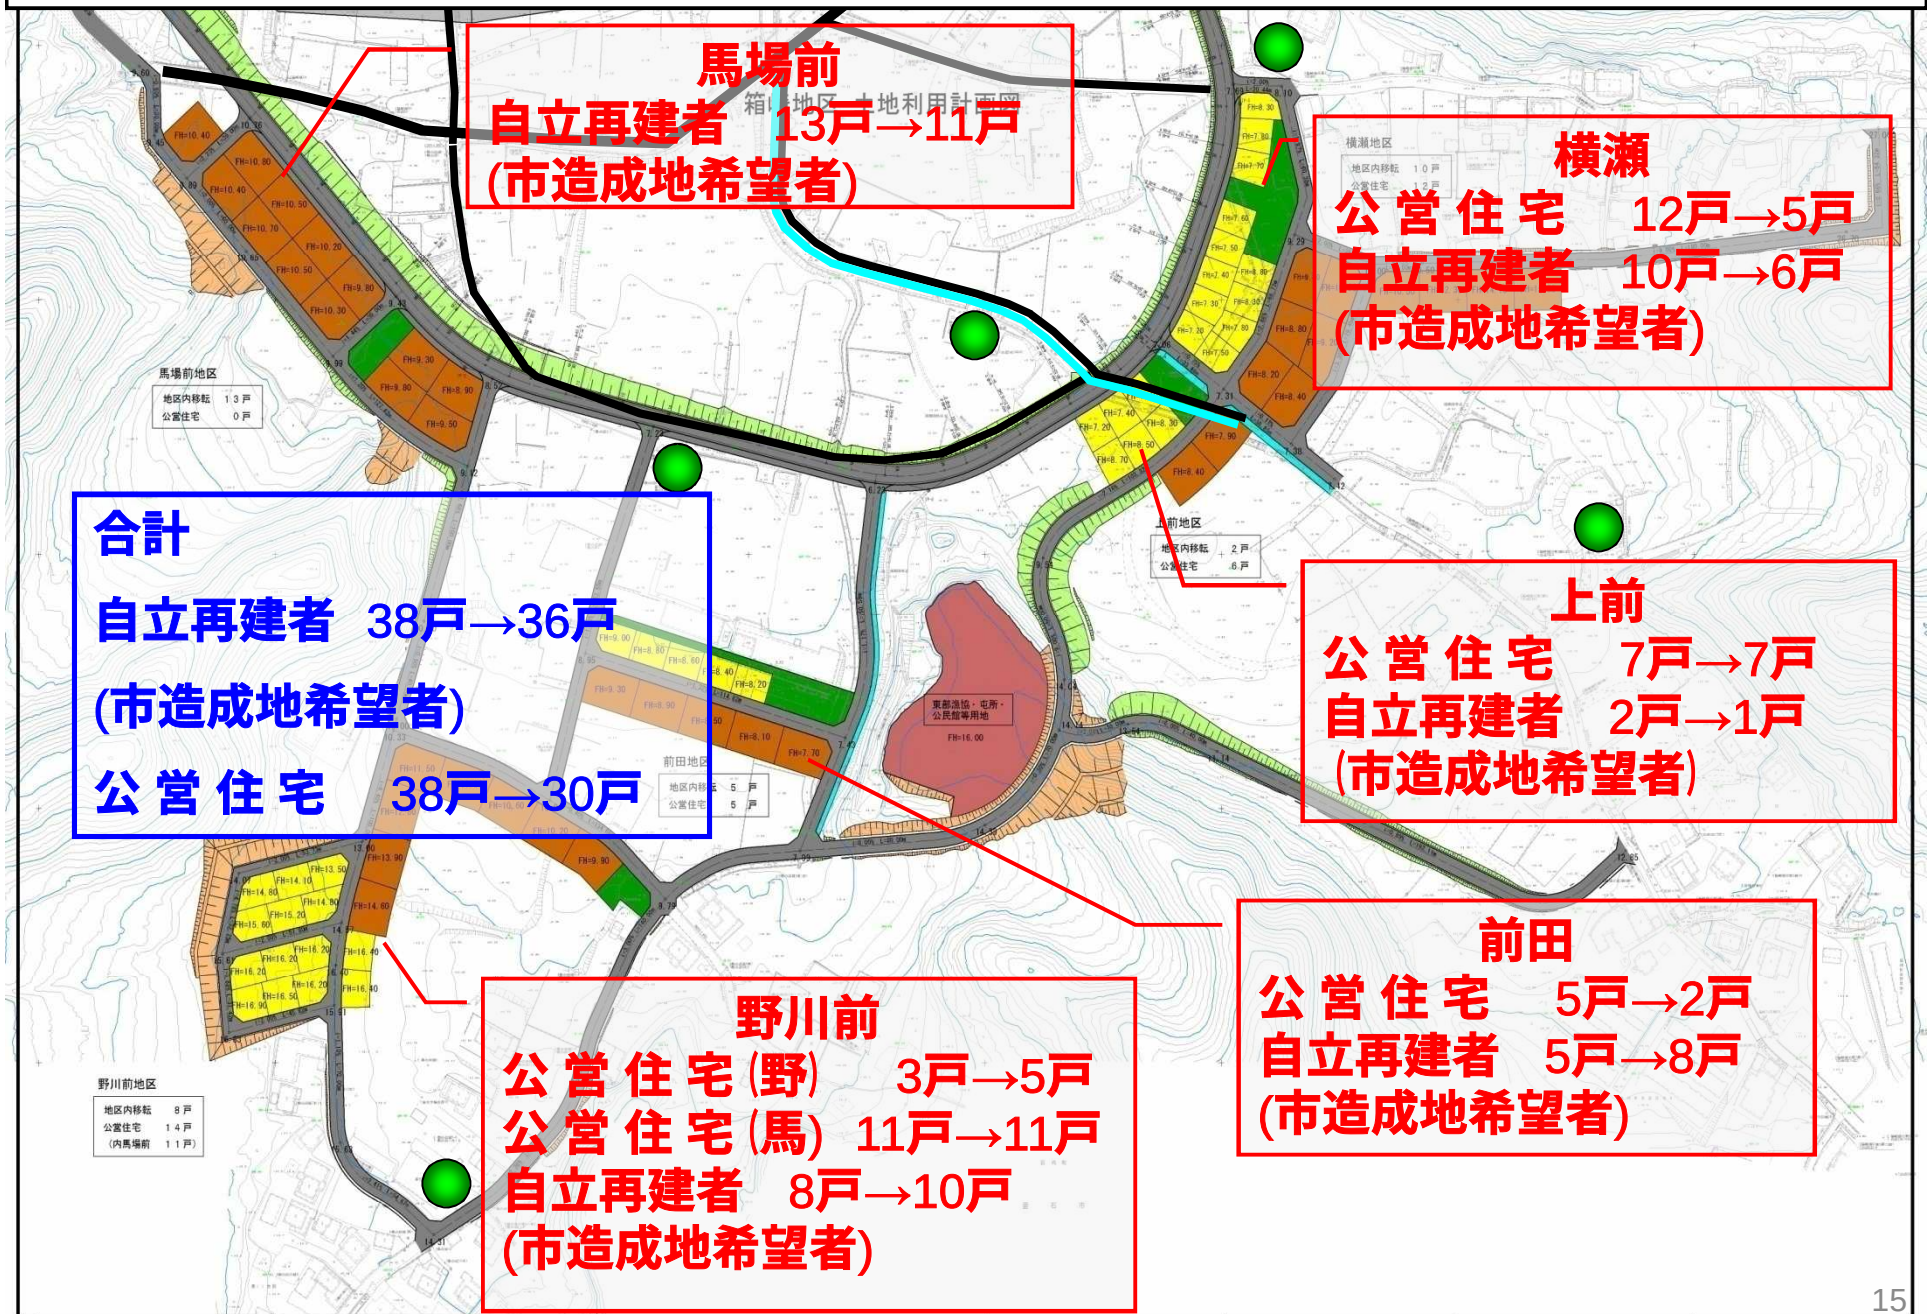


これまでの土地利用計画での課題

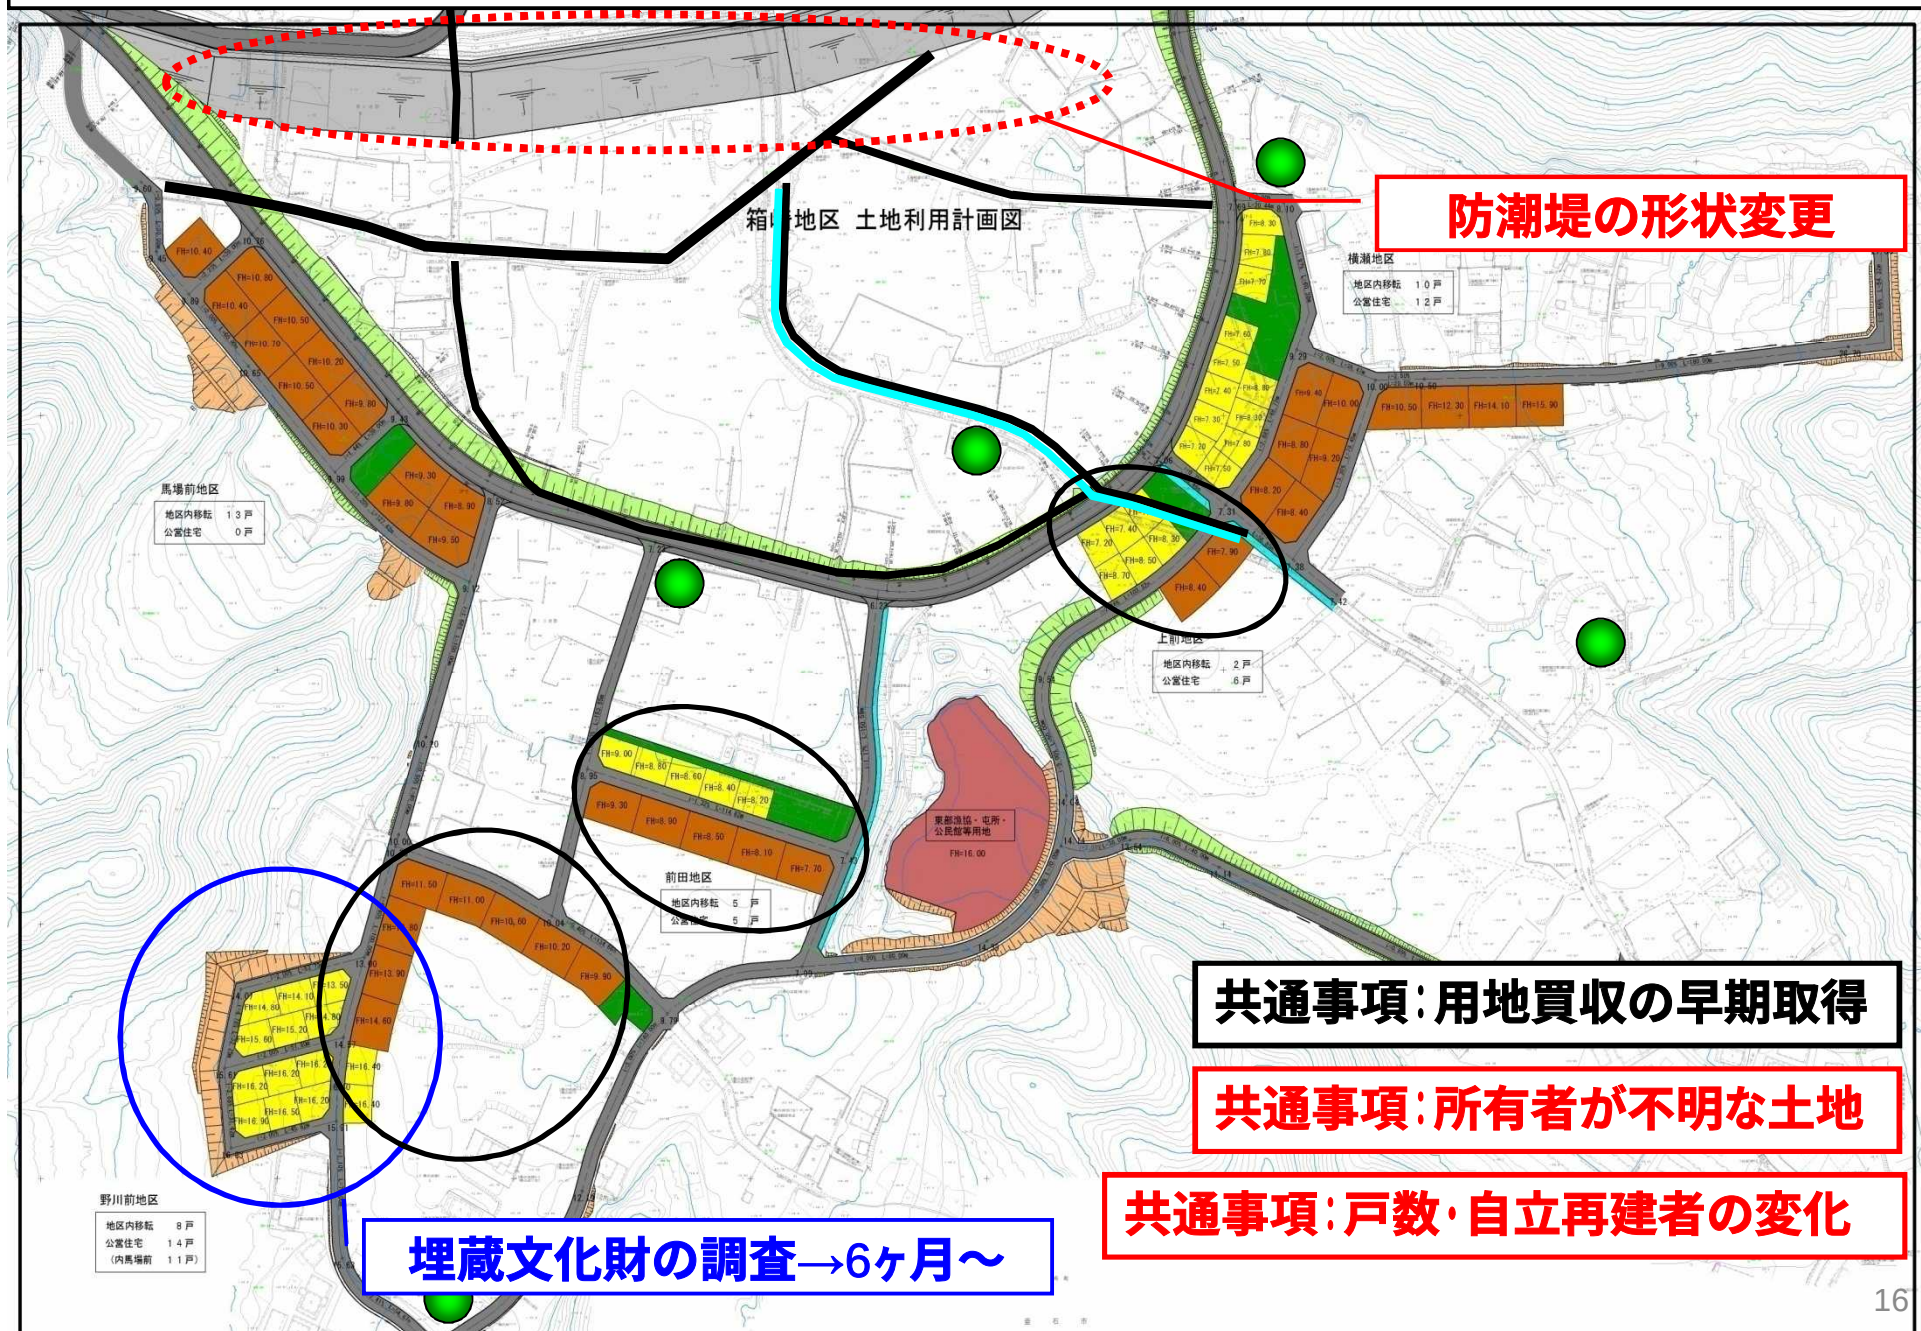

意向調査及び課題を踏まえた土地利用計画

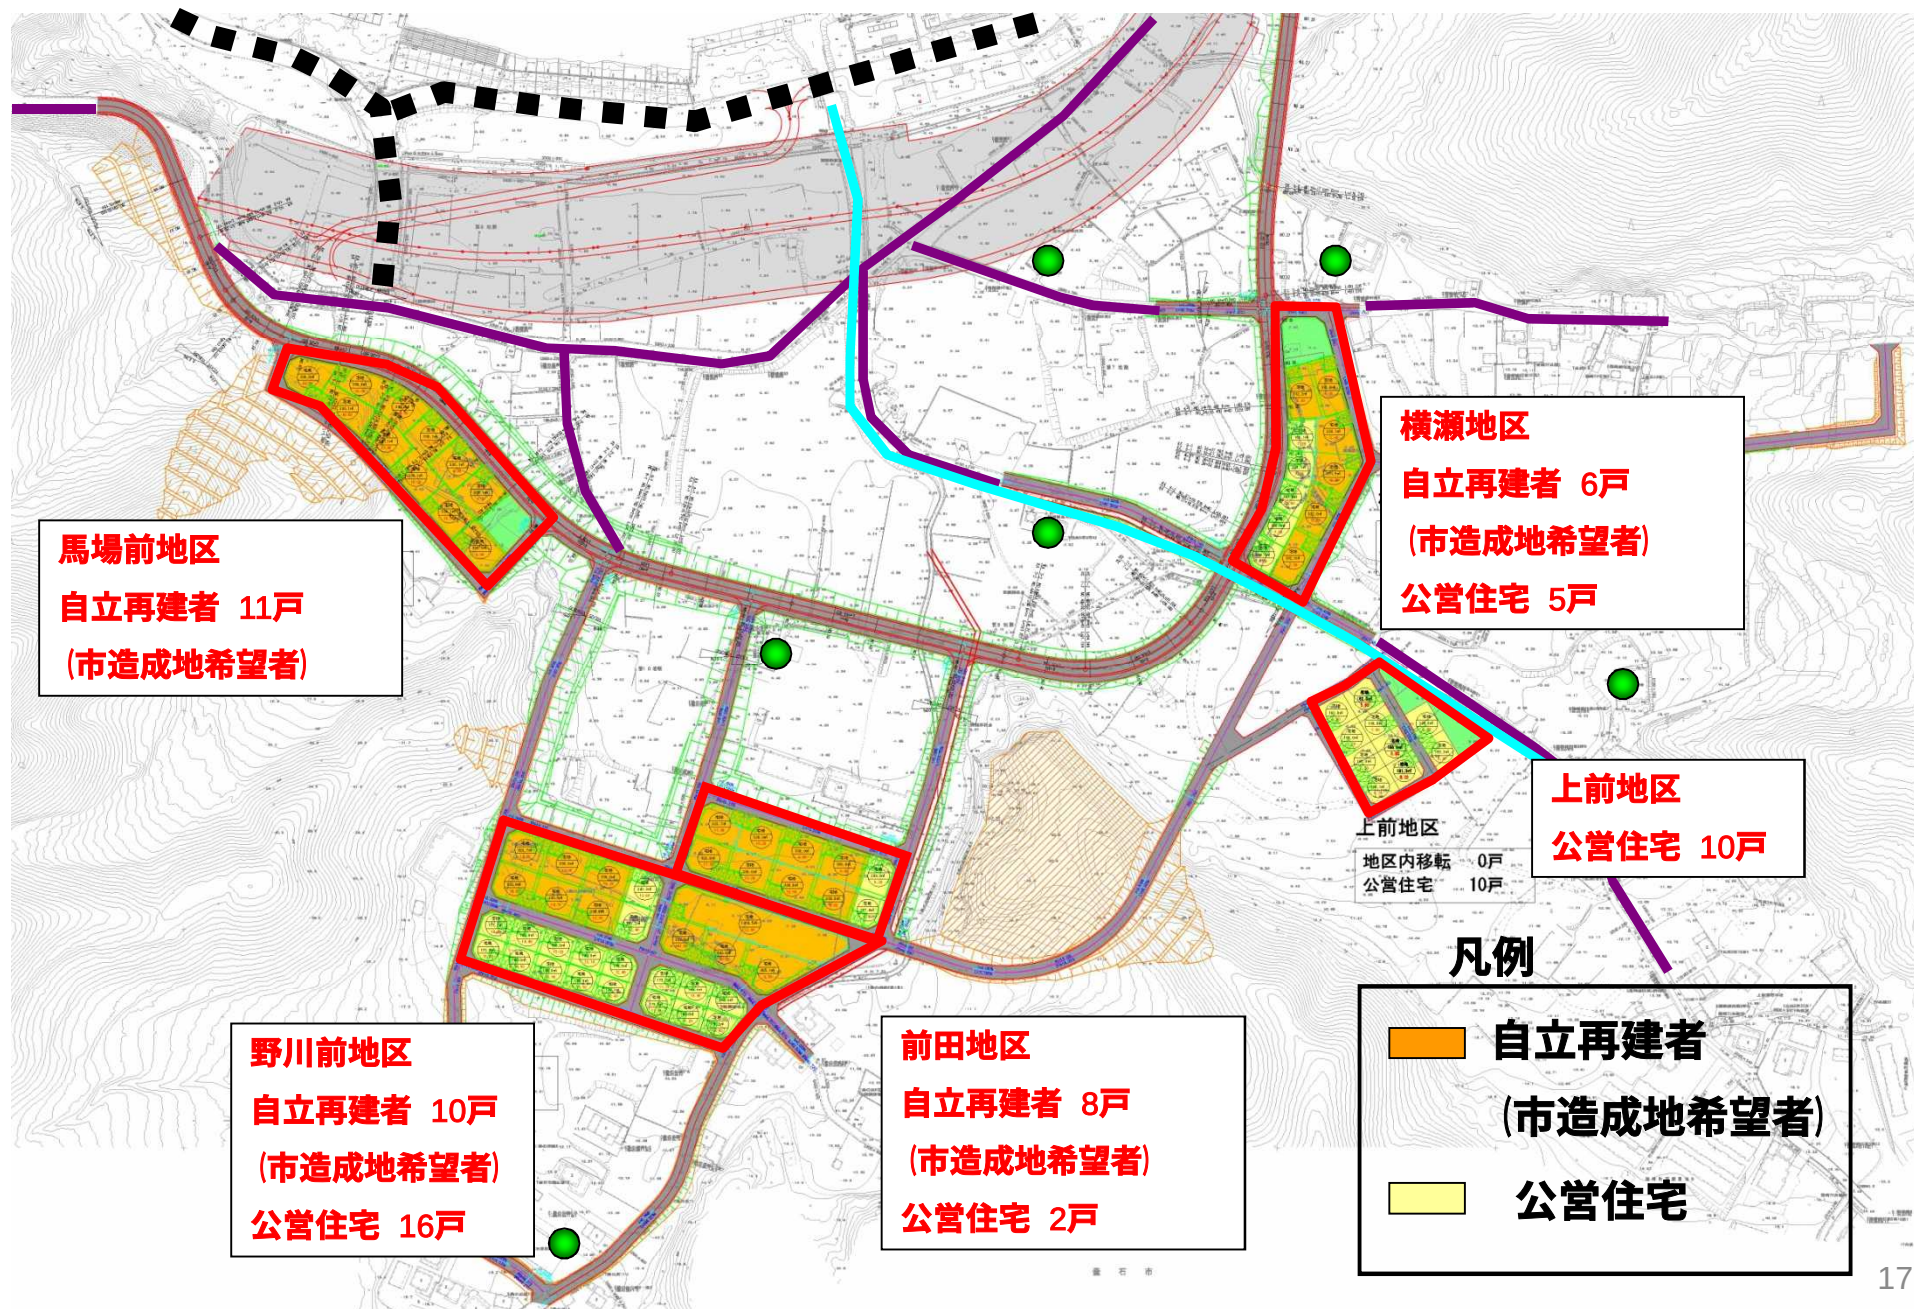


乗り越し道路詳細図

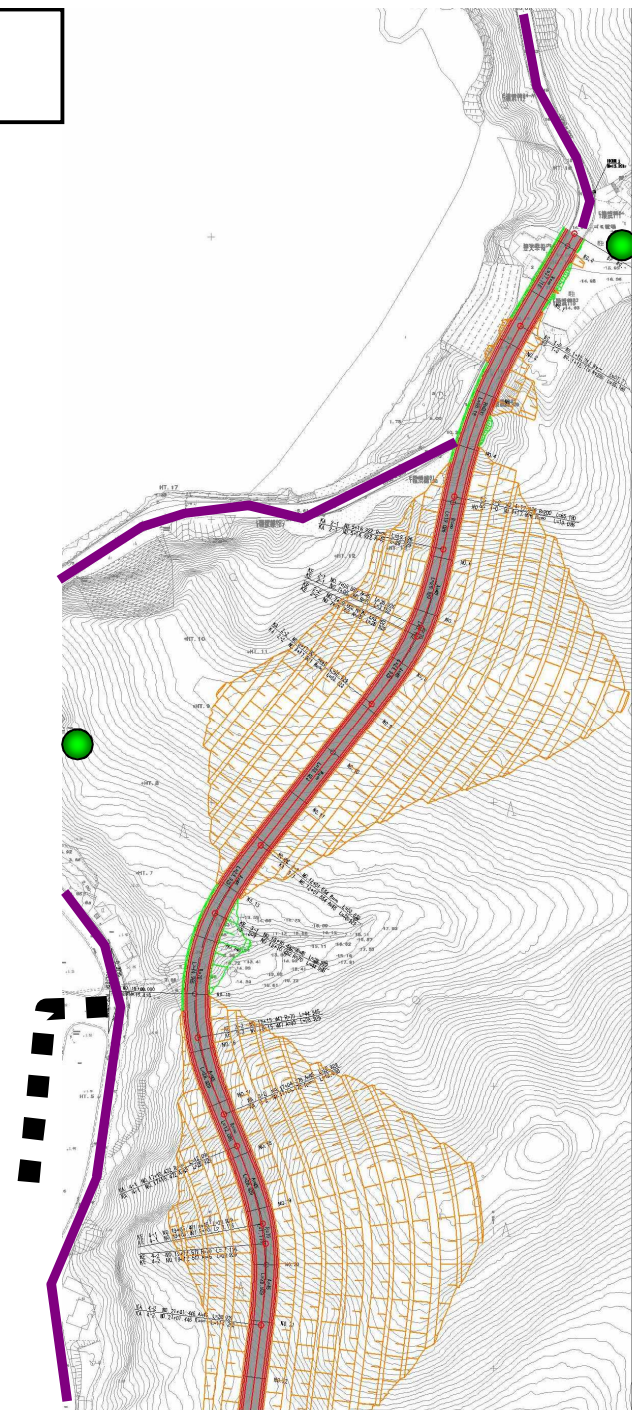

野川前・前田地区拡大図



横瀬地区拡大図

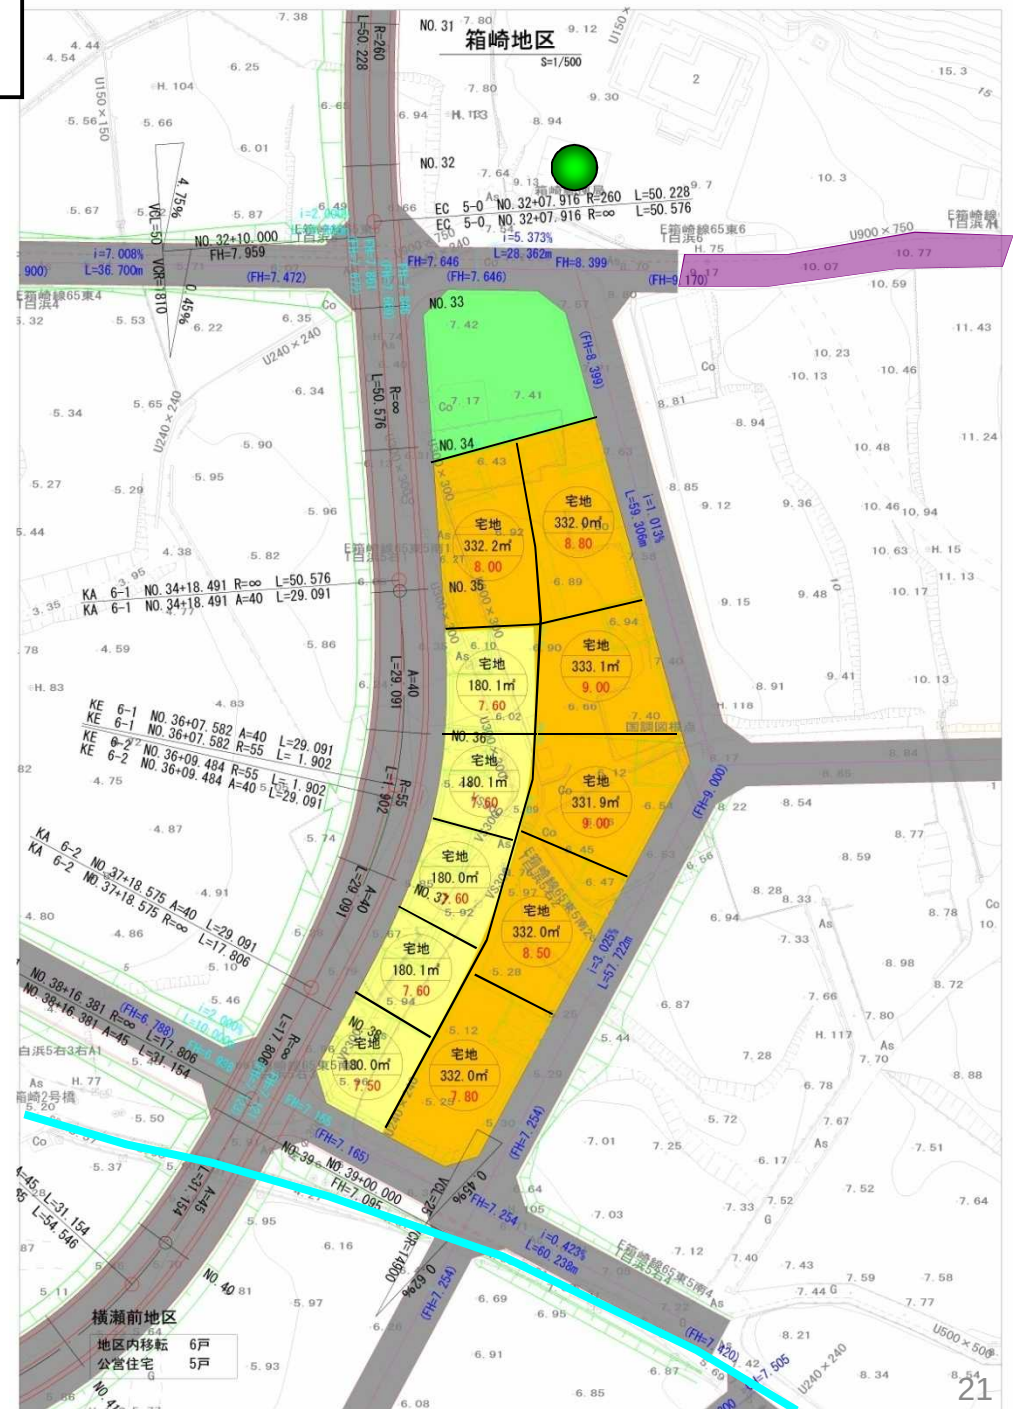

上前地区拡大図




5. 事業実施スケジュール

今後の工程

- ・7月～9月造成先の用地買収（道路部分も含む）
- ・箱崎-白浜間の防潮堤乗越道路工事着手（9月～）
→工程にあわせ、造成地へ搬出


事業実施スケジュール【箱崎地区】

※進捗状況に応じて前後します。

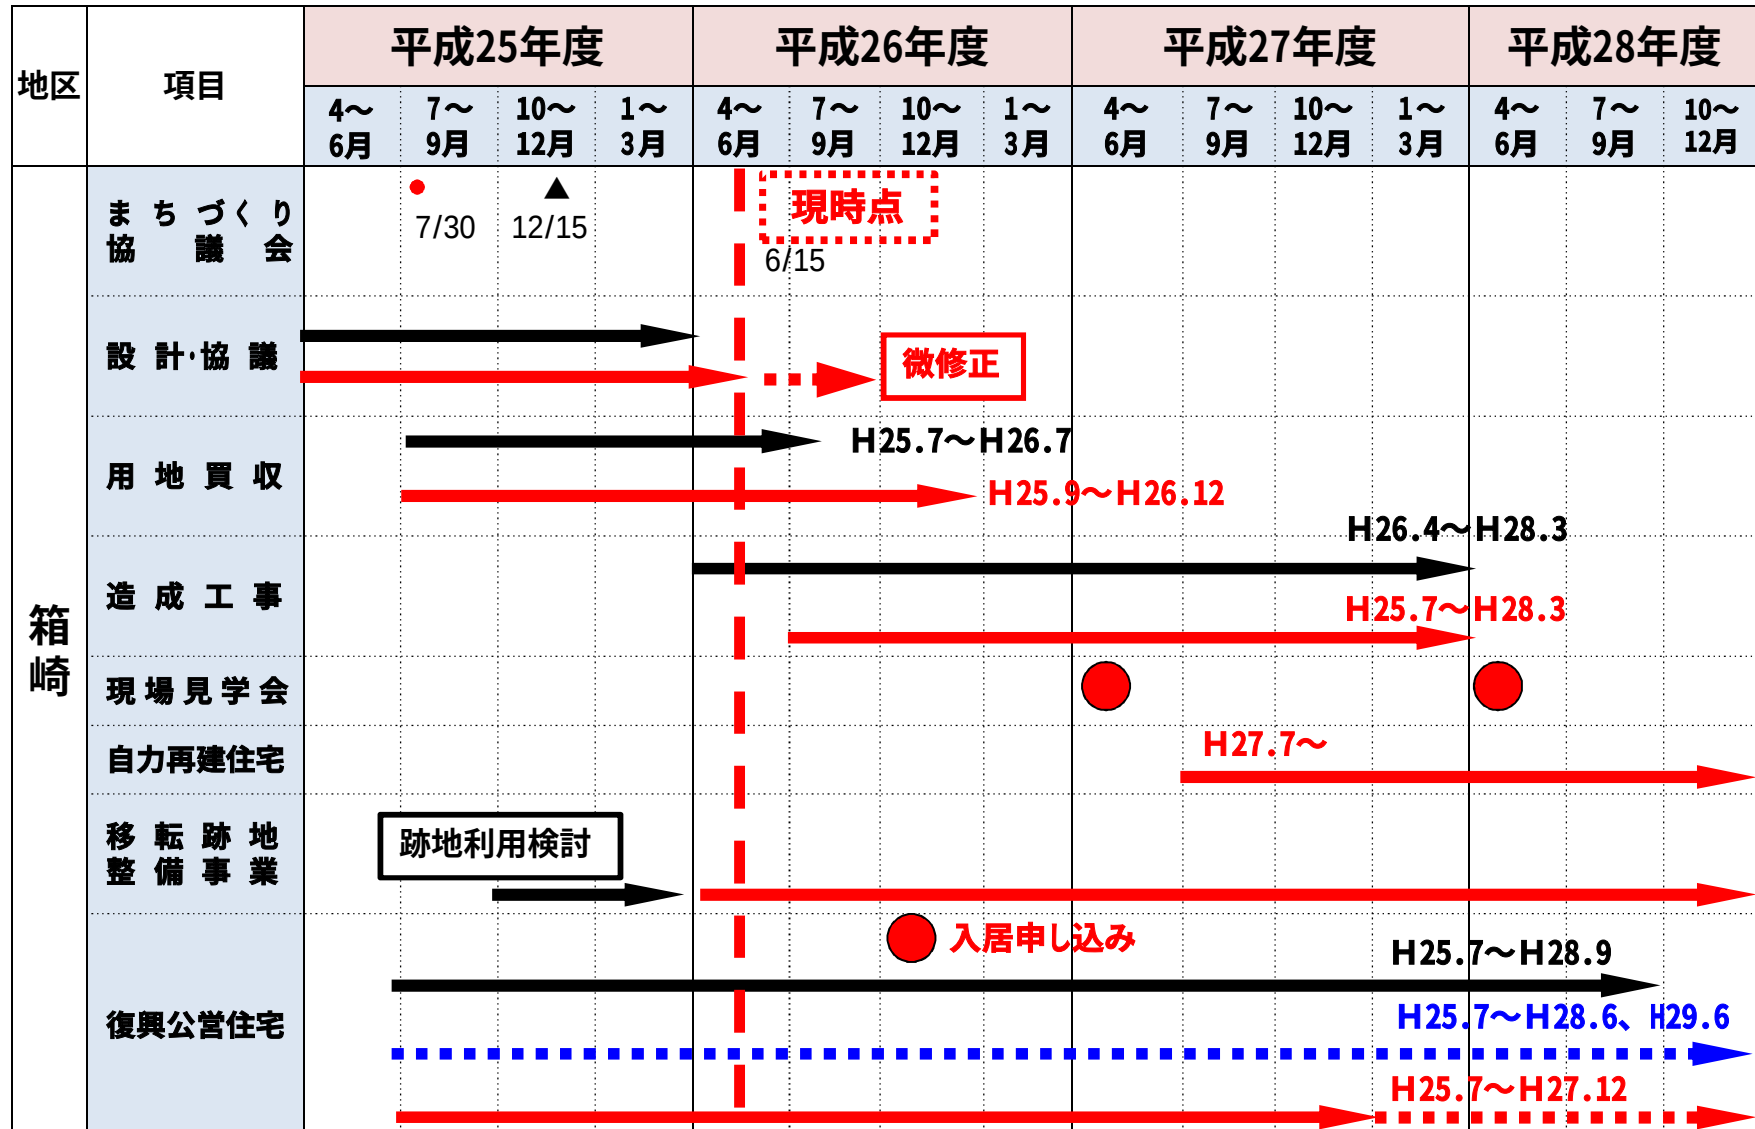

6. 箱崎半島線の進捗状況

箱崎半島線道路計画・進捗状況

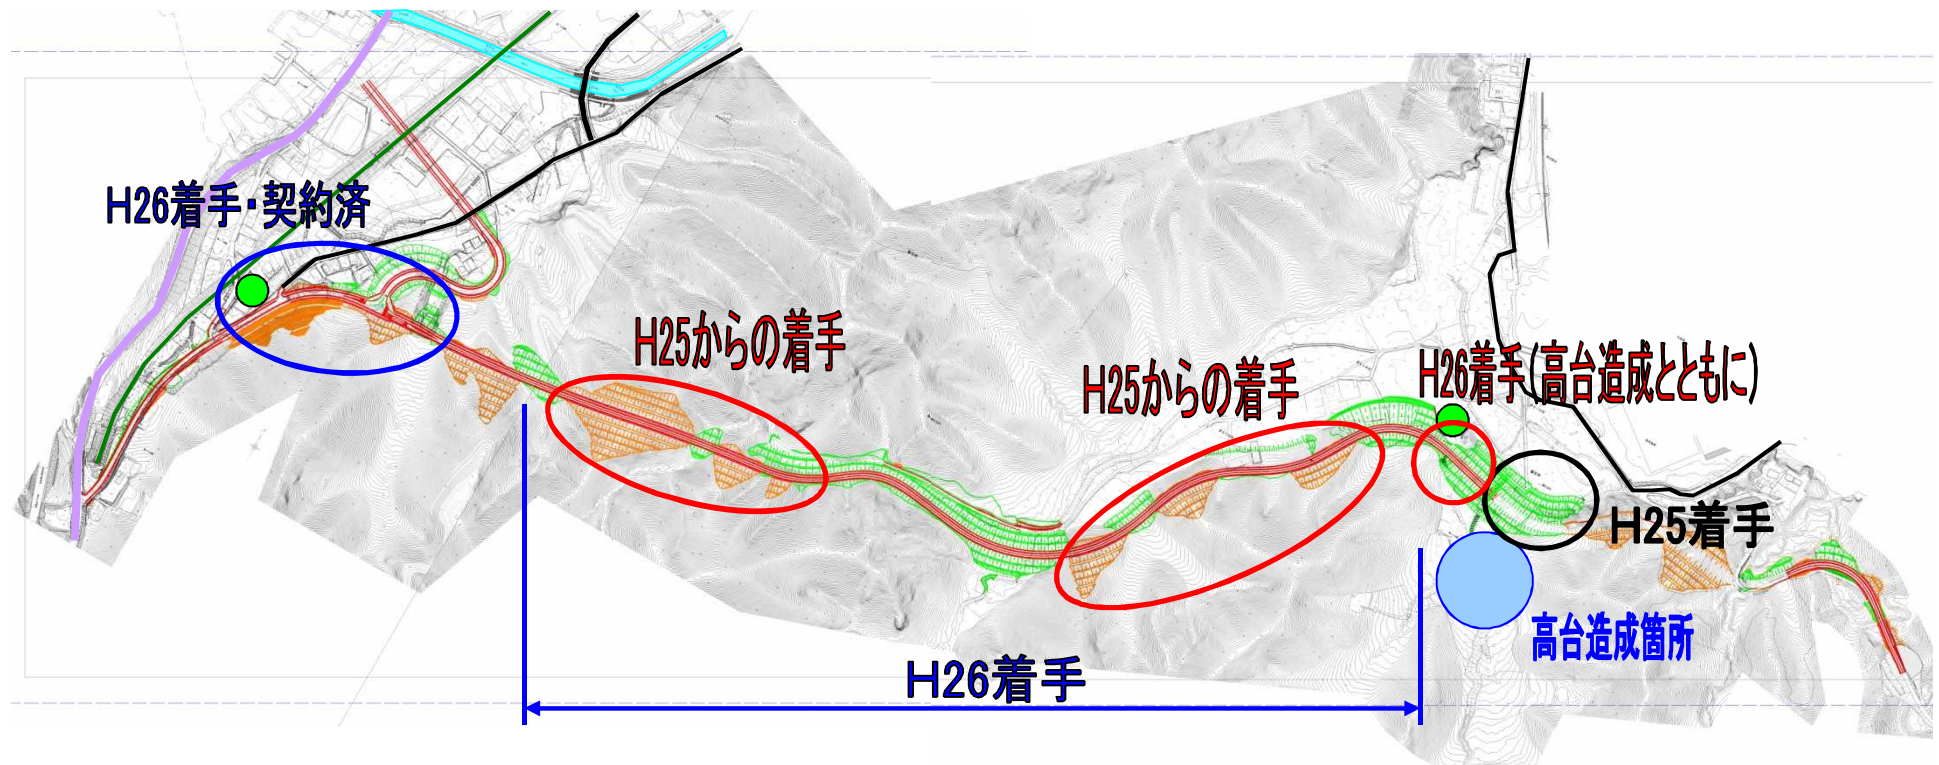

※平成28年度末完成を目指す

平成25年度からの着手 根浜西の沢から鵜住居側



H26.6.5現在

平成25年度からの着手 根浜西の沢から海側



平成25年度からの着手 根浜バス停から山側



H26.6.5現在

平成26年度着手 根浜東の沢 (高台移転箇所)



H26.6.5現在

7. 意見交換
