

まちづくり連携道路整備事業 一般県道吉里吉里釜石線 室浜・室浜の2地区

事業の進捗率

室浜の2地区

用地	引続き、ご協力お願いします 80%	交渉中
----	----------------------	-----

工事着手	340m契約/980m 34%	100%
------	--------------------	------

H29.3.31開通目標

(用地交渉・関係機関との協議により前後する場合があります)


室浜地区

用地	ご協力ありがとうございます 100%
----	-----------------------

工事着手	250m契約/700m 35%	100%
------	--------------------	------

H30.3.31開通目標

(市水産防潮堤との工程調整により前後する場合があります)

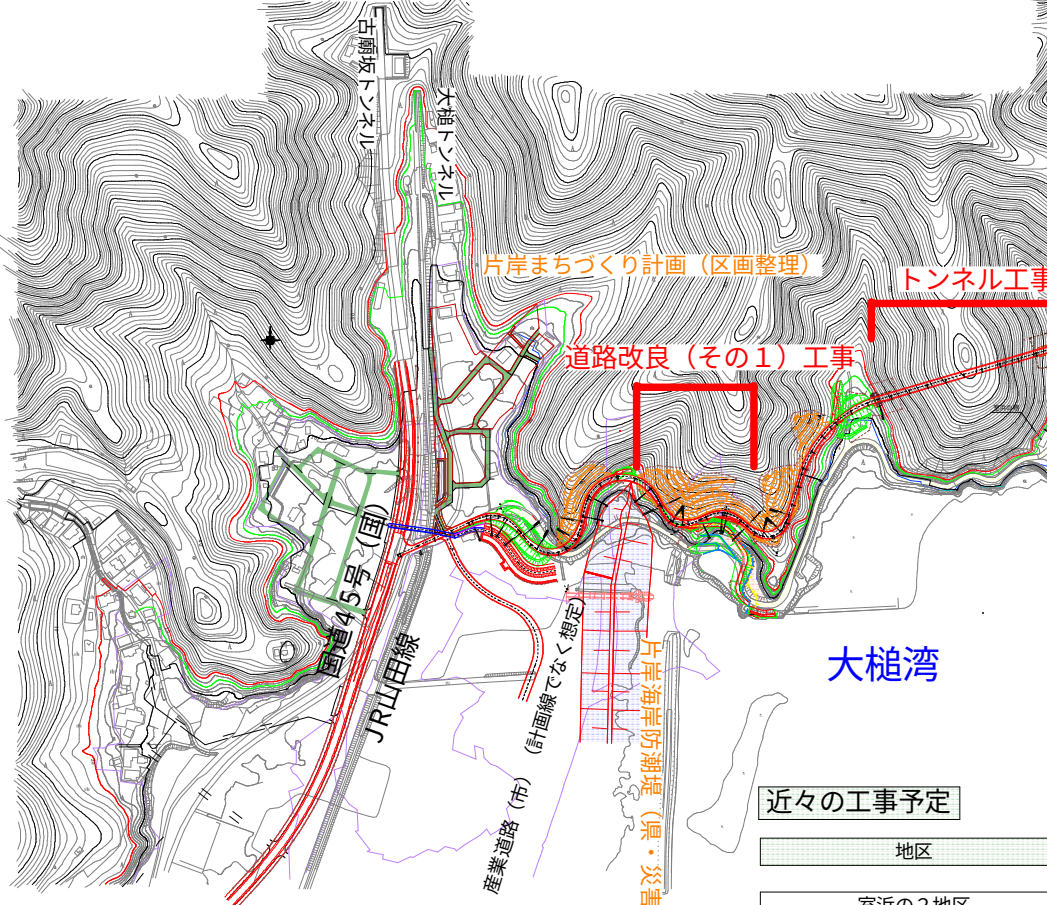

(室浜の2) 1.5km


孤立解消 (Lv2津波浸水回避) 0.98km (1.5車線)

現道区間 0.52km
(特に工事なし)

(室浜) 0.7km

(2車線)

H27.2.23現在

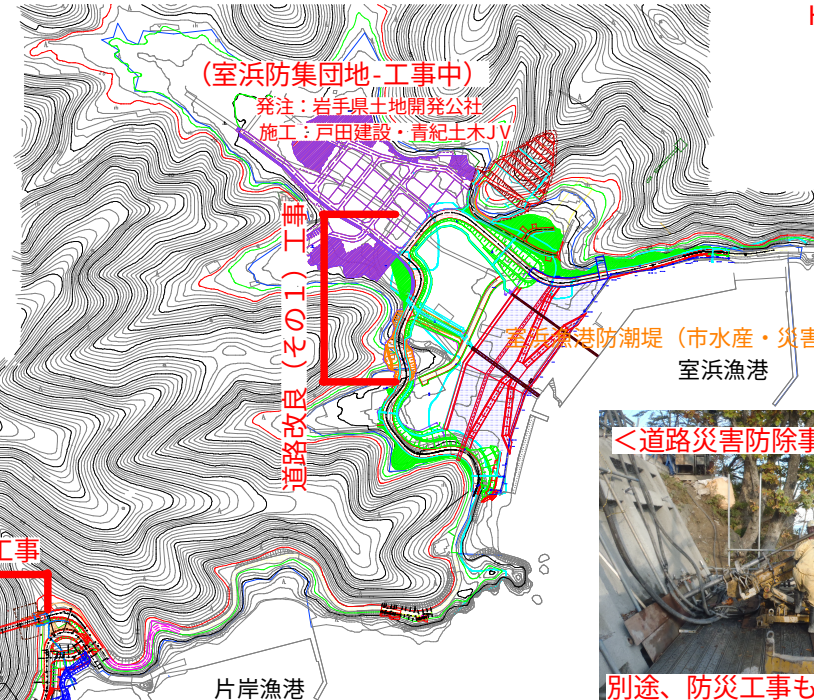

室浜の2地区：トンネル工事



室浜地区：防集&県道工事



近々の工事予定

地区	工事	3月	4月	5月	施工
室浜の2地区 (国道45号～片岸漁港)	道路改良(その1)	準備	盛土	盛土	小田島建設
	トンネル工事	準備	掘削(発破)	掘削(発破)	ビ-エス三菱・近江建設JV
室浜地区	道路改良(その1)	盛土	盛土	盛土	戸田建設
