

かまいし復興レポートVol.58

釜石市

令和3年4月1日

目次

1 「かまいし復興レポート」について

2 復旧・復興の進捗状況

2-1 土地利用

2-2 住まい

2-3 インフラ

2-4 産業・雇用

2-5 教育

2-6 その他

2-7 完了項目

1 「かまいし復興レポート」について

□目的


- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

□公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回(Vol. 58)の数値は令和3年3月31日時点
- 括弧内は前回数値(令和2年12月31日時点)からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする
 - 令和3年1月1日改定

2-1 土地利用(1)


各地区の主な事業種別

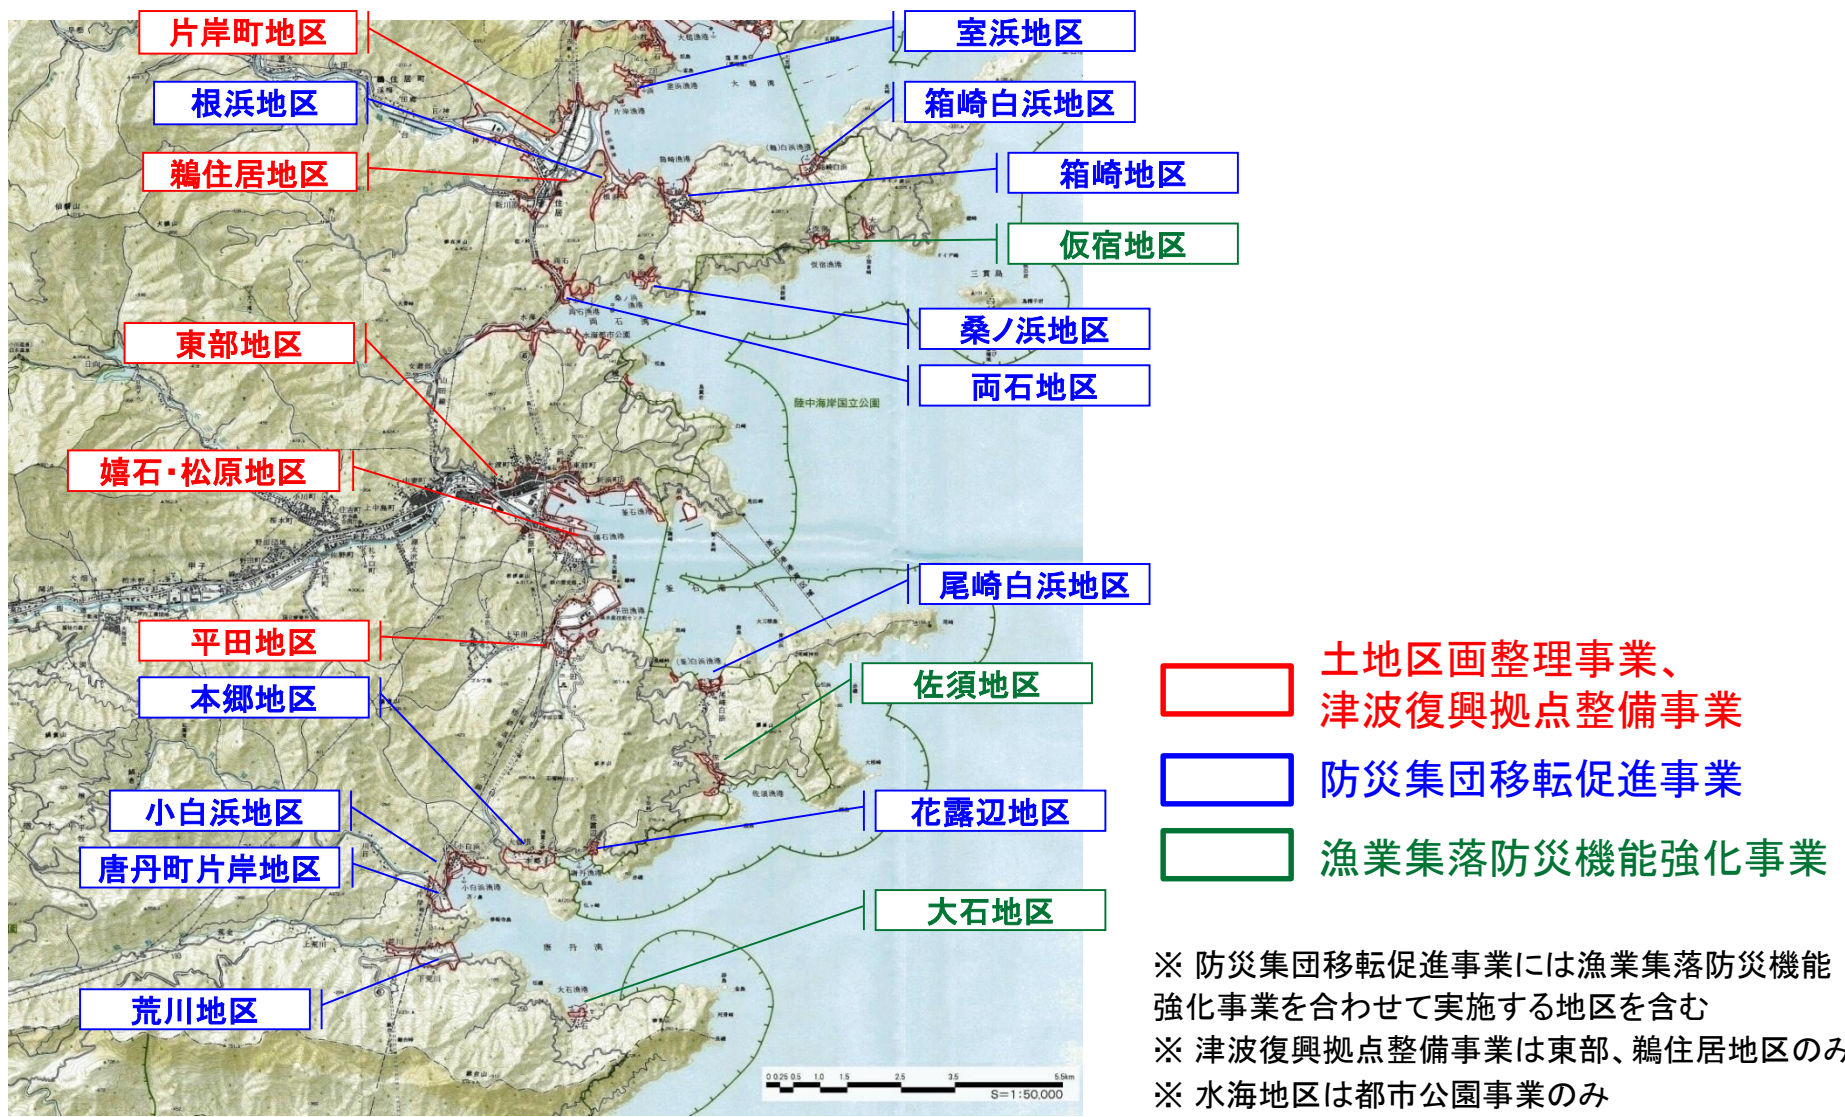

※ 防災集団移転促進事業には漁業集落防災機能強化事業を合わせて実施する地区を含む
※ 津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居地区のみ
※ 水海地区は都市公園事業のみ

2-1 土地利用(3)


防災集団移転促進事業の進捗

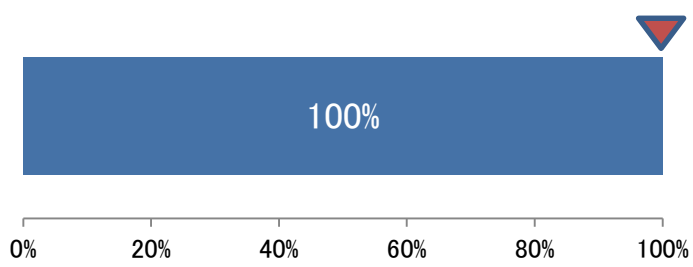

分子	整備完了区画数	124
分母	全体整備予定区画数	124

「防災集団移転促進事業」とは？

- ・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
- ・移転元の土地は住宅地としては利用不可

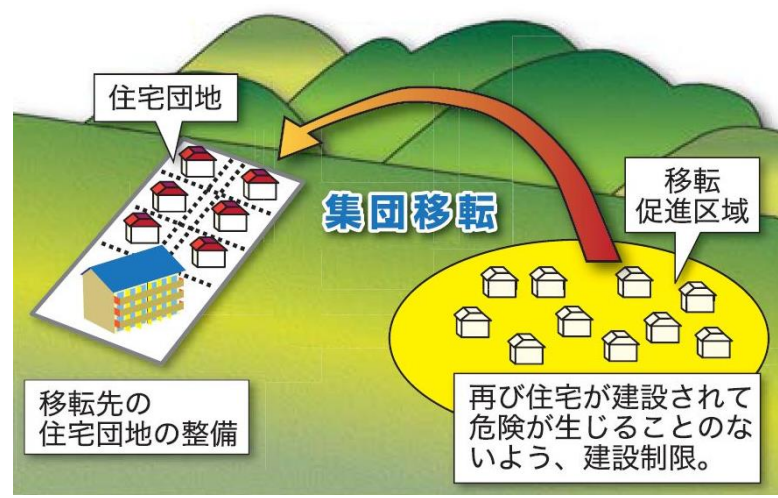


スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
防災集団移転促進事業大臣同意	平成24年6月 1地区 平成24年9月 7地区 平成24年10月 3地区
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年5月～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-1 土地利用(4)

漁業集落防災機能強化事業の進捗

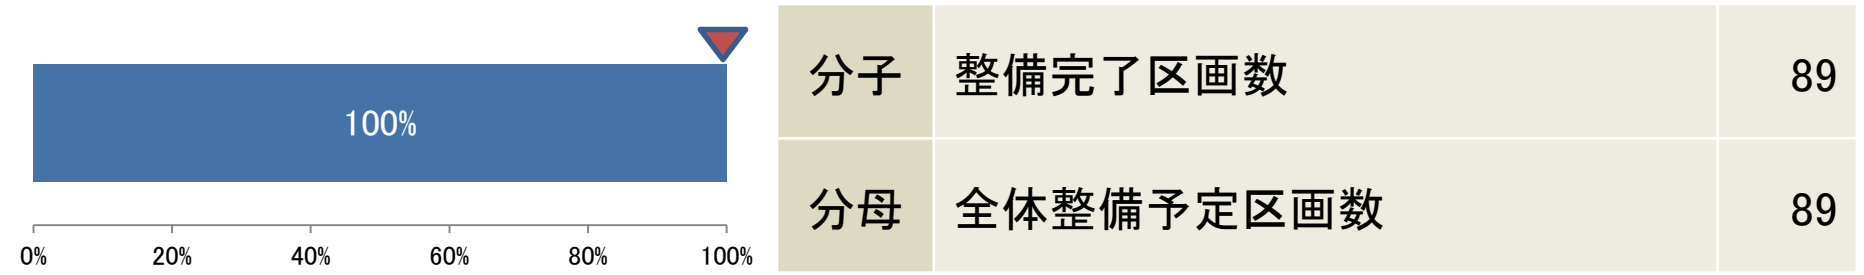

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

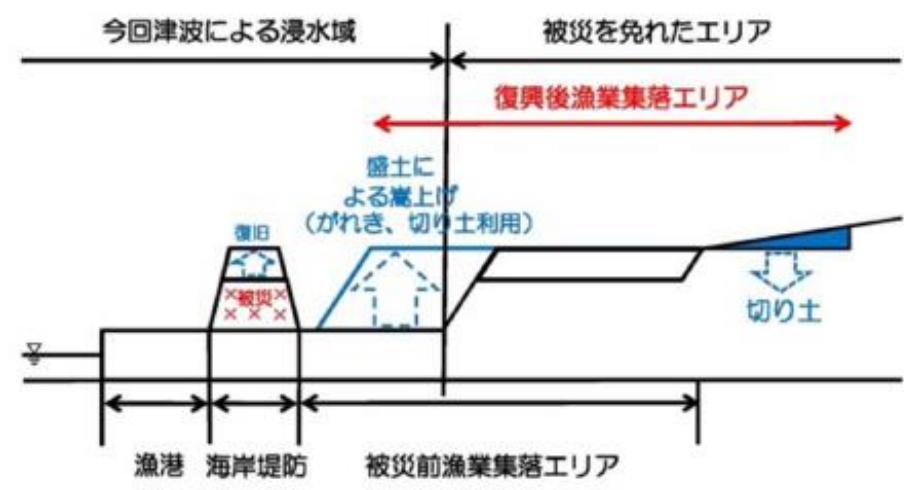


スケジュール

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-1 土地利用(5)

用地買収の進捗



分子	買収面積	1,111,160
分母	買収予定面積	1,111,160


※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位: m²

2-2 住まい(1)




復興公営住宅事業の進捗

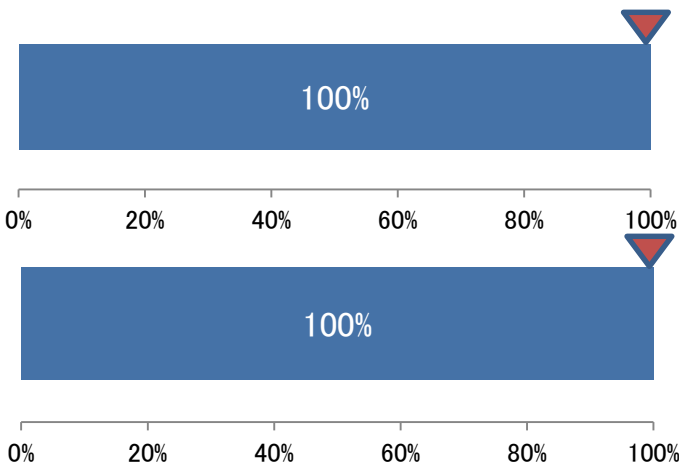


分子	建設済みの戸数	1,316
分母	計画戸数(予定)	1,316
分子	工事発注済みの戸数	1,316
分母	計画戸数(予定)	1,316

2-2 住まい(2)

住宅の自力再建の状況(全体)

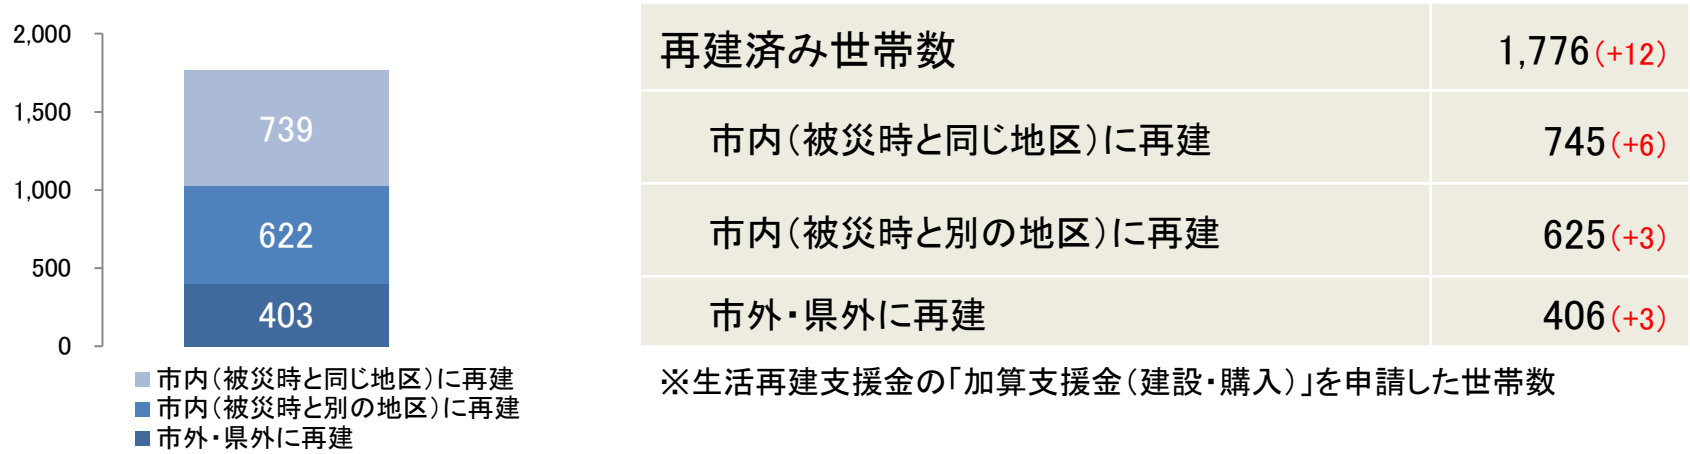


住宅の自力再建の状況(地区別)

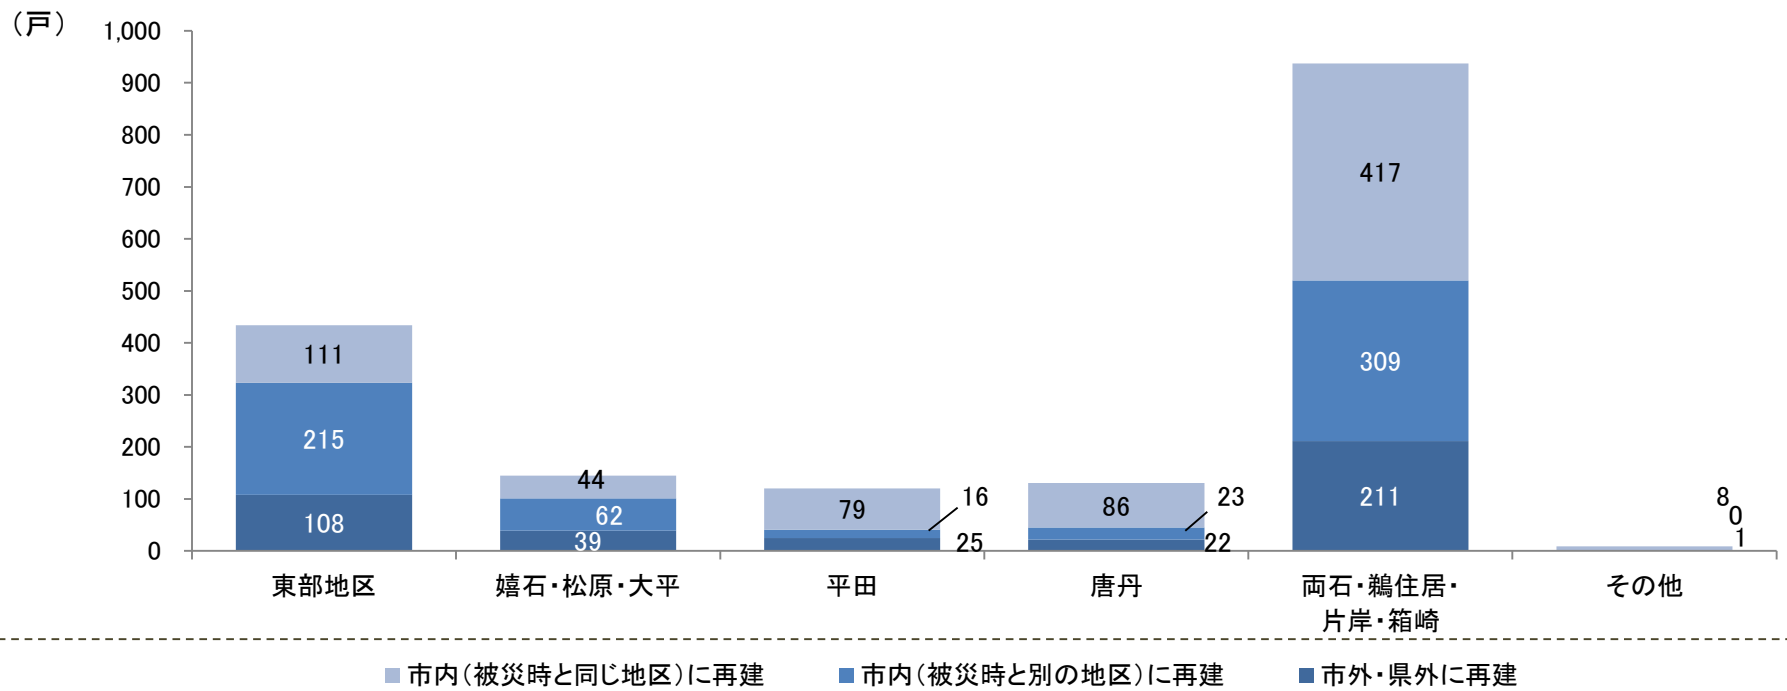

2-2 住まい(3-1)

応急仮設住宅入居戸数の推移

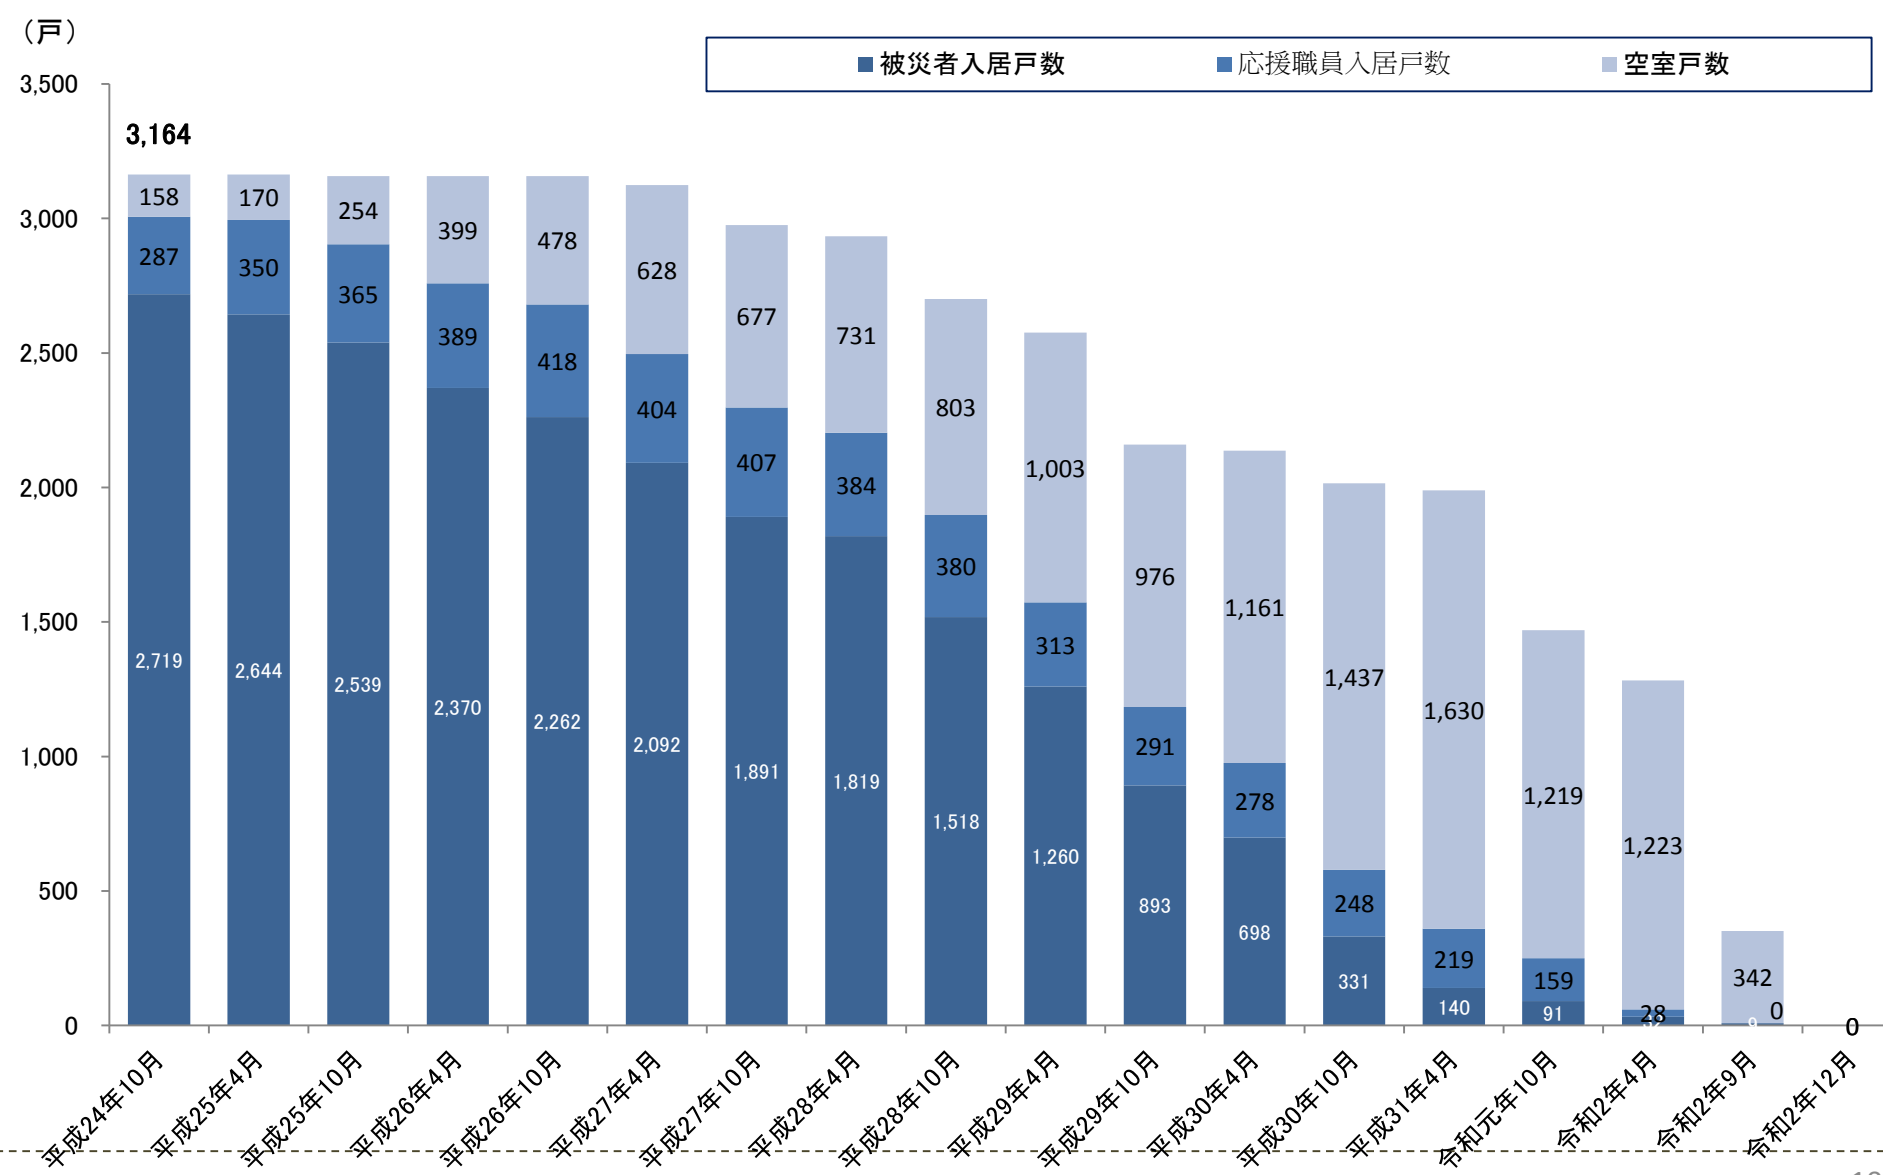

2-2 住まい(3-2)

応急仮設住宅の解体状況


解体完了時期	団地名称	棟数	戸数
H25. 9月末	平田第3（一部）	2棟	6戸
H26. 10月末	唐丹町大石	1棟	6戸
H26. 11月末	鵜住居町第5（一部）	6棟	28戸
H27. 3月末	桜木町（一部）	9棟	54戸
H27. 7月末	箱崎町第3（一部）	2棟	14戸
H27. 8月末	鵜住居第4	6棟	24戸
H27. 9月末	唐丹町小白浜 ほか	12棟	57戸
H28. 3月末	鵜住居町第5	8棟	41戸
H28. 12月末	中妻町	18棟	118戸
H28. 8月末	甲子町B ほか	21棟	103戸
H28. 11月末	大只越町	2棟	12戸
H28. 12月末	甲子町第10 ほか	7棟	53戸
H29. 3月末	栗林町第2A ほか	16棟	72戸
H29. 8月末	甲子町A ほか	47棟	368戸
H29. 9月末	平田第5	8棟	42戸
H30. 3月末	平田第4 ほか	7棟	23戸
H30. 10月末	唐丹町大曾根 ほか	9棟	60戸
H30. 11月末	大平町第2 ほか	5棟	31戸
H30. 12月末	平田（一部）	7棟	27戸
H31. 1月末	甲子町第7	7棟	36戸
R1. 8月末	平田第2（一部）	7棟	34戸
R1. 9月末	甲子町第3 ほか	35棟	178戸
R1. 11月末	天神町	9棟	52戸
R1. 12月末	鵜住居町C ほか	14棟	83戸

解体完了時期	団地名称	棟数	戸数
R2. 3月末	小佐野町ほか	74棟	359戸
R2. 10月末	上中島	31棟	185戸
	野田町	6棟	36戸
	野田第2	11棟	49戸
	鵜住居A	2棟	11戸
	鵜住居B	6棟	36戸
	平田第2	15棟	89戸
	唐丹町川目B	4棟	20戸
	鵜住居第2D	6棟	32戸
R2. 11月末	栗林町	15棟	87戸
	栗林第5	5棟	36戸
R2. 12月末	平田第6	41棟	240戸
	栗林第4	16棟	111戸
R3. 1月末	平田	14棟	84戸
R3. 3月末	桜木町	6棟	36戸
	天神町	16棟	87戸
	甲子第2	10棟	45戸
	甲子第5	5棟	27戸
	鵜住居第2A	8棟	47戸
	鵜住居第8	4棟	17戸
	両石町女遊部	2棟	8戸

562棟	3,164戸
------	--------

漁港災害復旧事業(市漁港)の進捗


単位:箇所

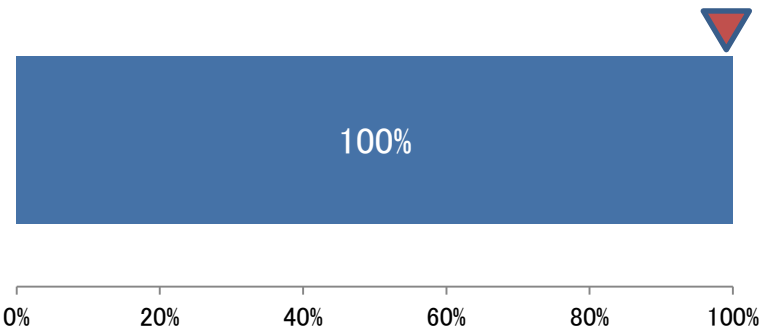

分子	復旧完了漁港数	9
分母	復旧予定漁港数	9

海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)の進捗

単位:箇所

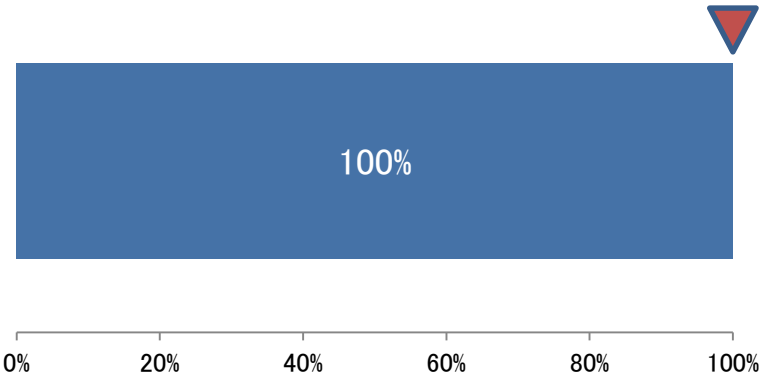


分子	復旧完了防潮堤数	7
分母	復旧予定防潮堤数	7

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4 産業・雇用(1)

水揚げ高(魚市場)


単位:千円

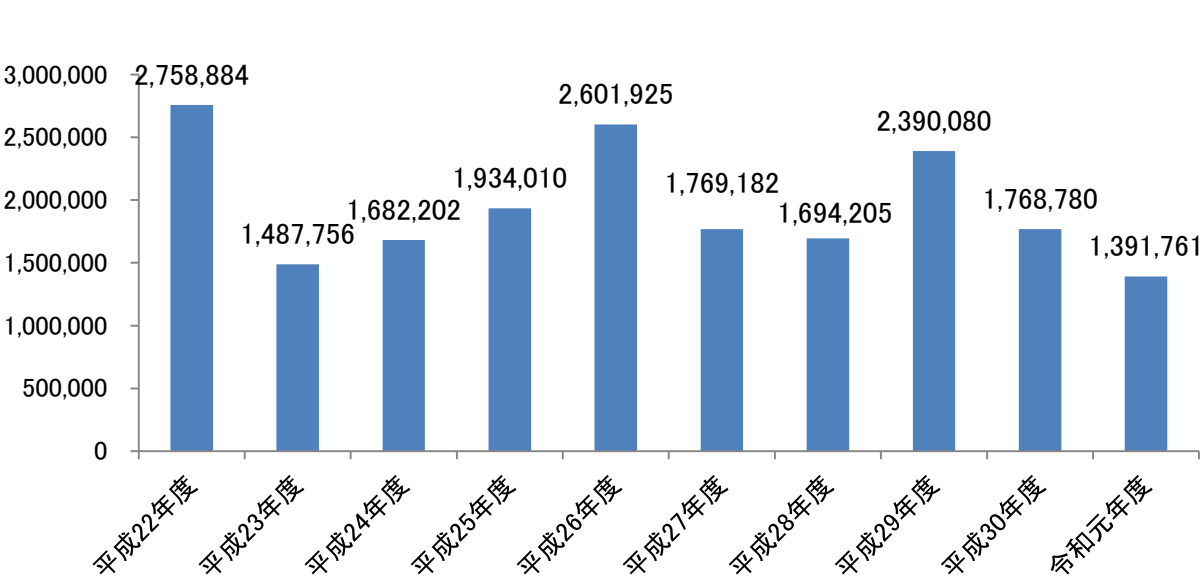

平成22年度	2,758,884
平成23年度	1,487,756
平成24年度	1,682,202
平成25年度	1,934,010
平成26年度	2,601,925
平成27年度	1,769,182
平成28年度	1,694,205
平成29年度	2,390,080
平成30年度	1,768,780
令和元年度	1,391,761

水産加工業企業数

単位:社

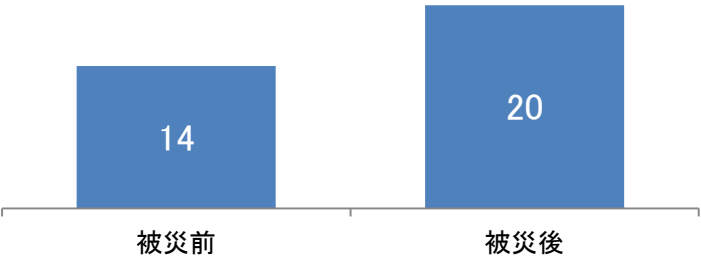

震災前の企業数

14


再開した企業数
(新規5を含む)

20

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-4 産業・雇用(2)

農地農業用施設災害復旧事業の進捗

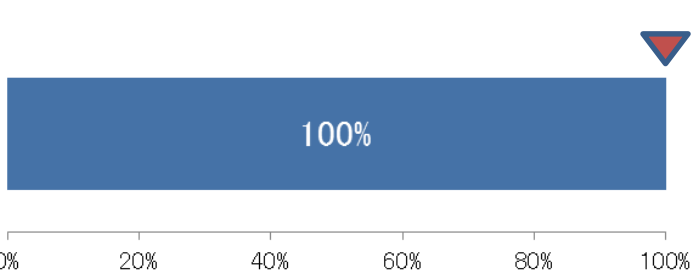

単位: ha		
分子	復旧農地面積	20.3
分母	復旧予定農地面積	20.3
(参考)	津波冠水農地面積	51.0

釜石市への観光客数

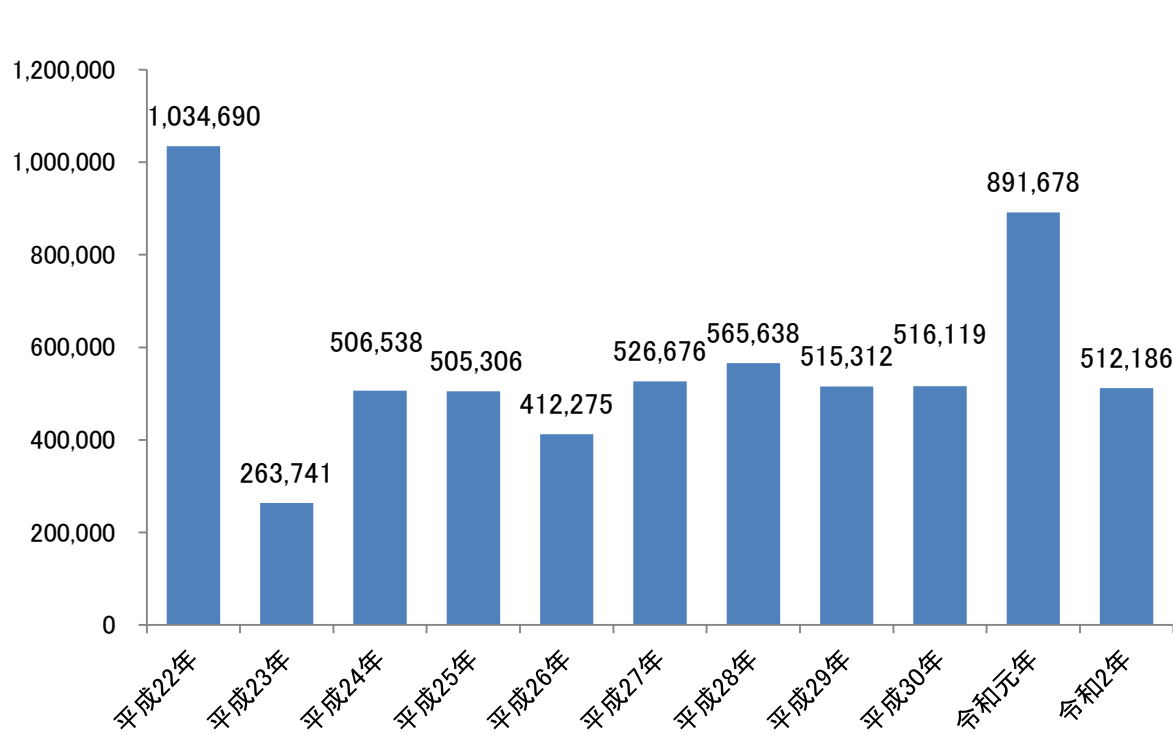


※1月～12月で集計		単位: 人
平成22年		1,034,690
平成23年		263,741
平成24年		506,538
平成25年		505,306
平成26年		412,275
平成27年		526,676
平成28年		565,638
平成29年		515,312
平成30年		516,119
令和元年		891,678
令和2年		512,186


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4 産業・雇用(3)

釜石港港湾取扱貨物量

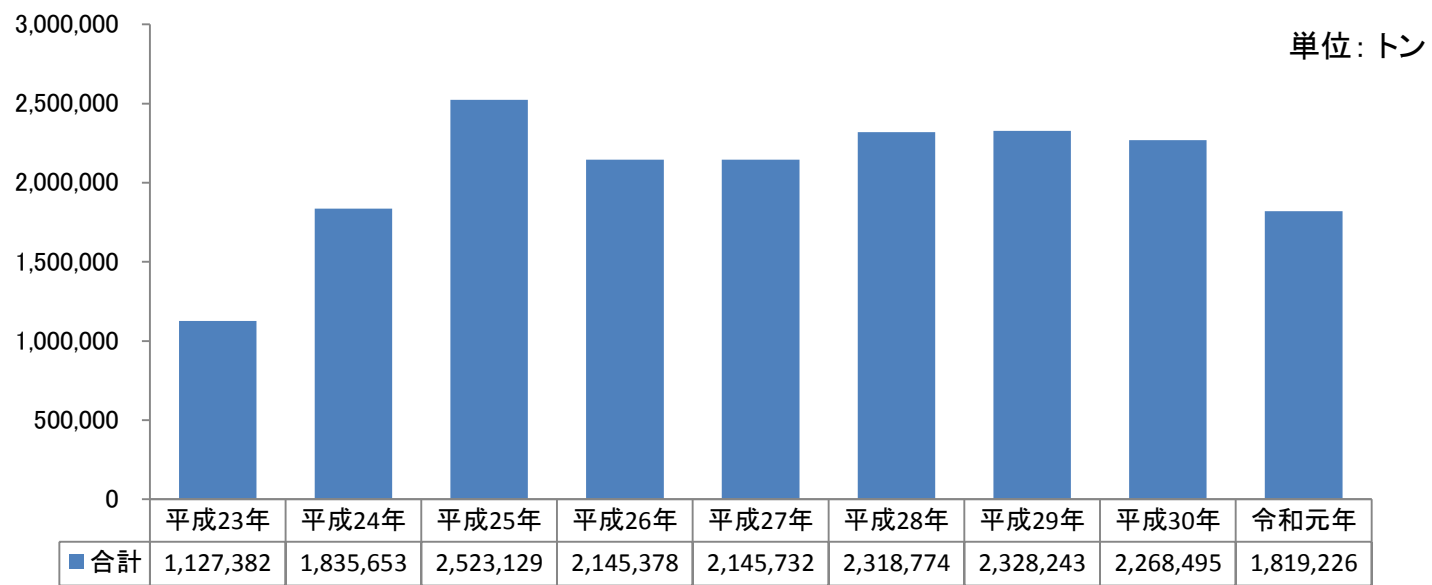

製造品出荷額等

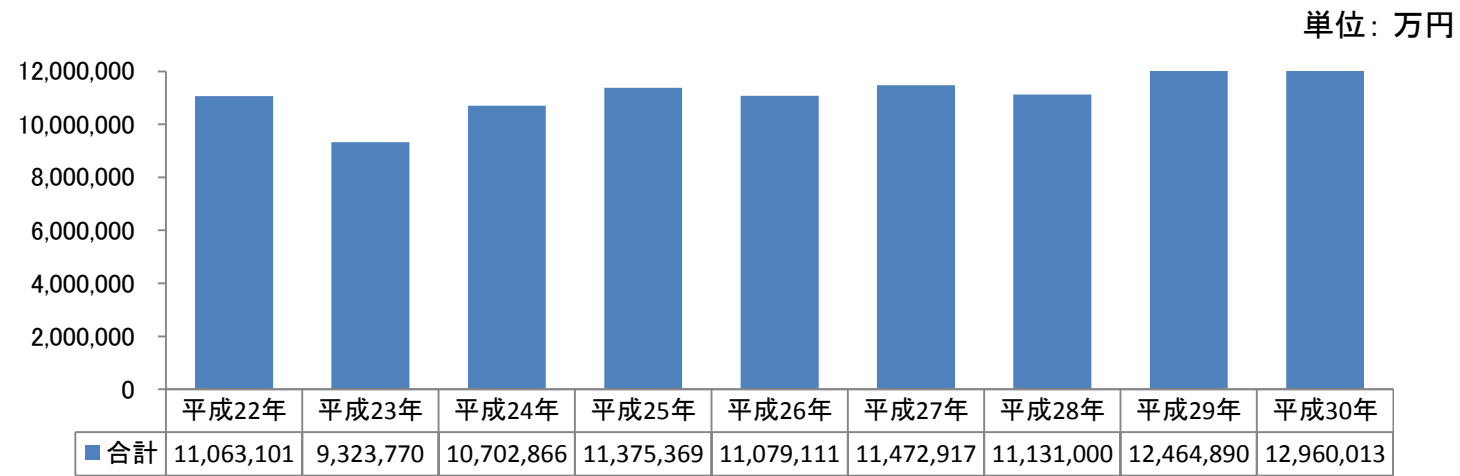


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4 産業・雇用(4)

釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別有効求人倍率

(人)


(%)

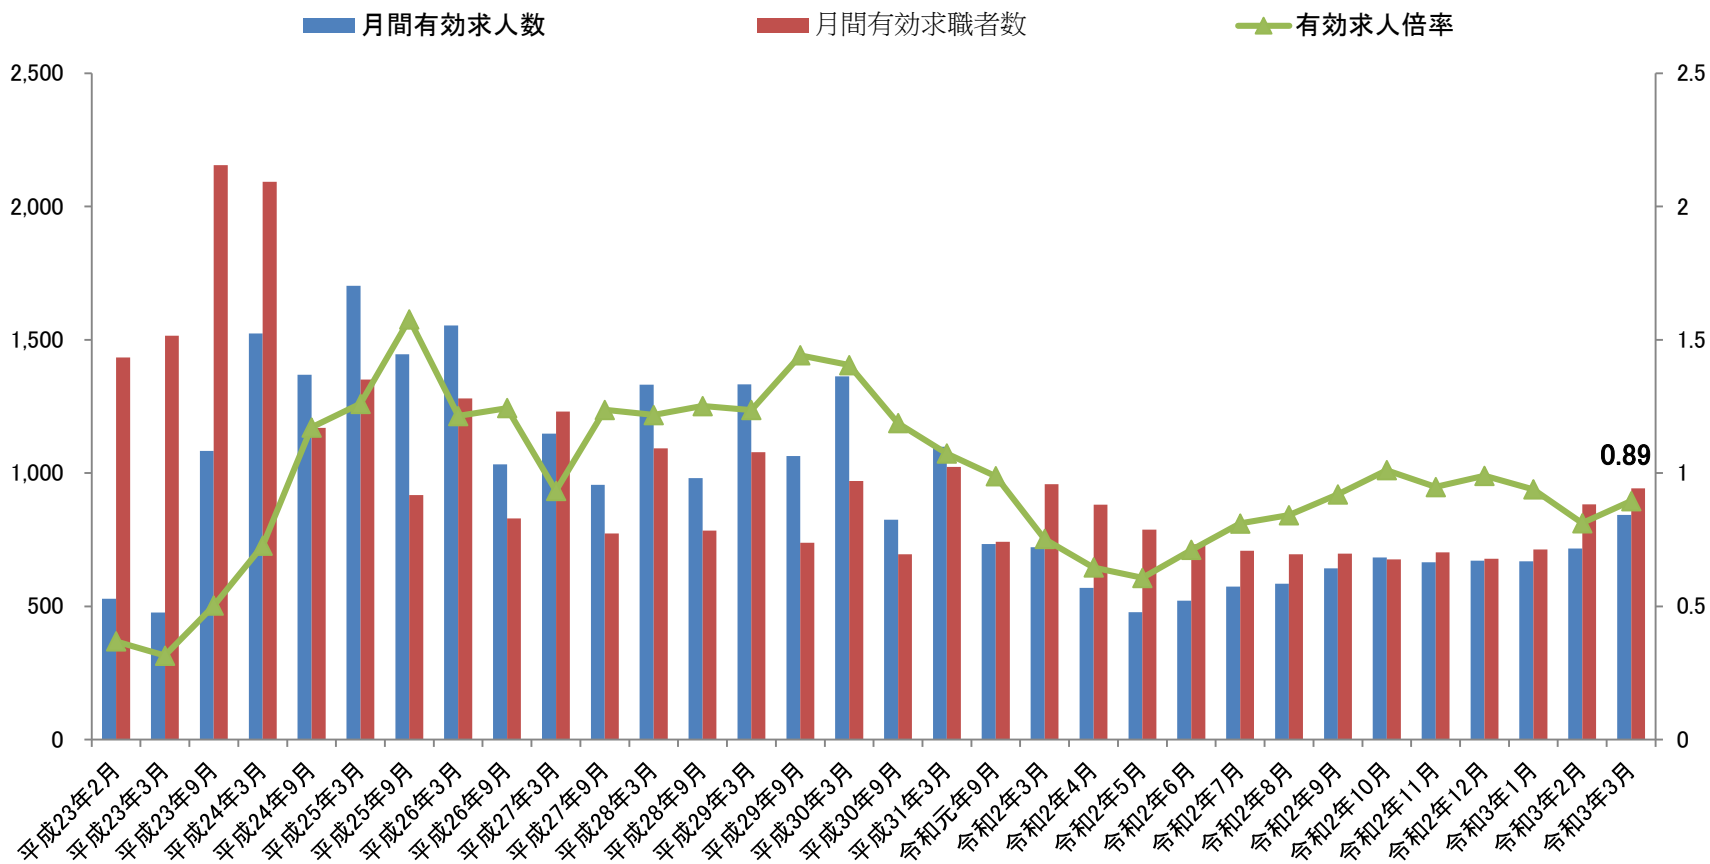


出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
有効求職者数: 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
有効求人倍率: 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

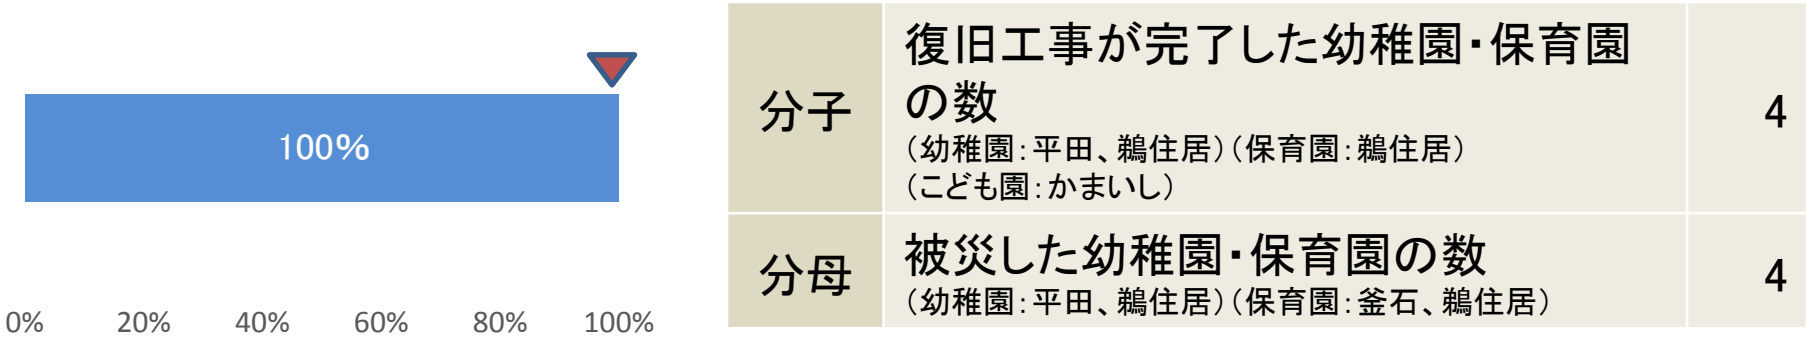


小学校復旧工事の進捗

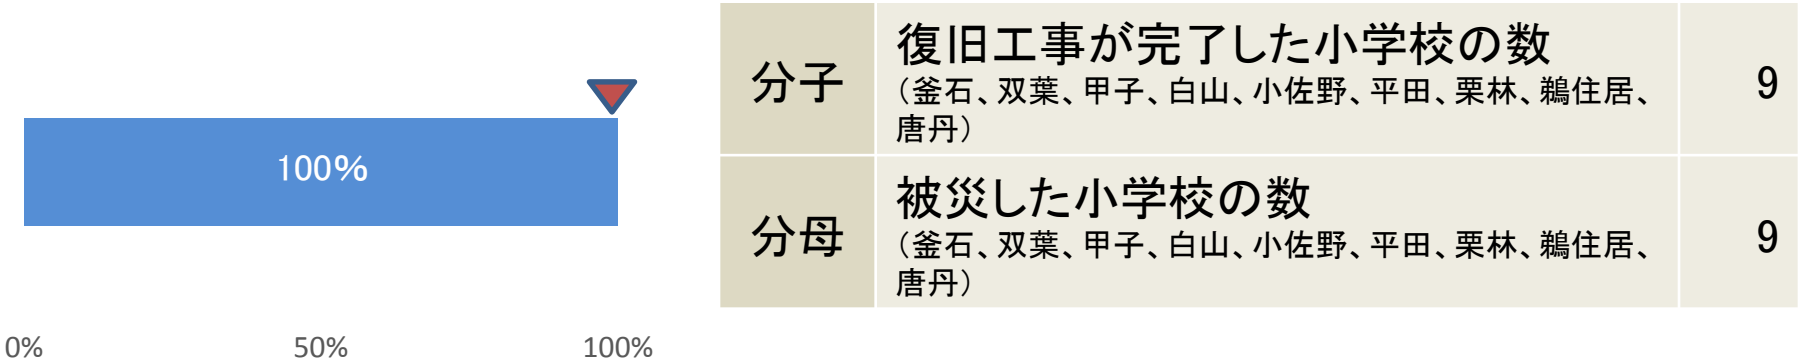


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

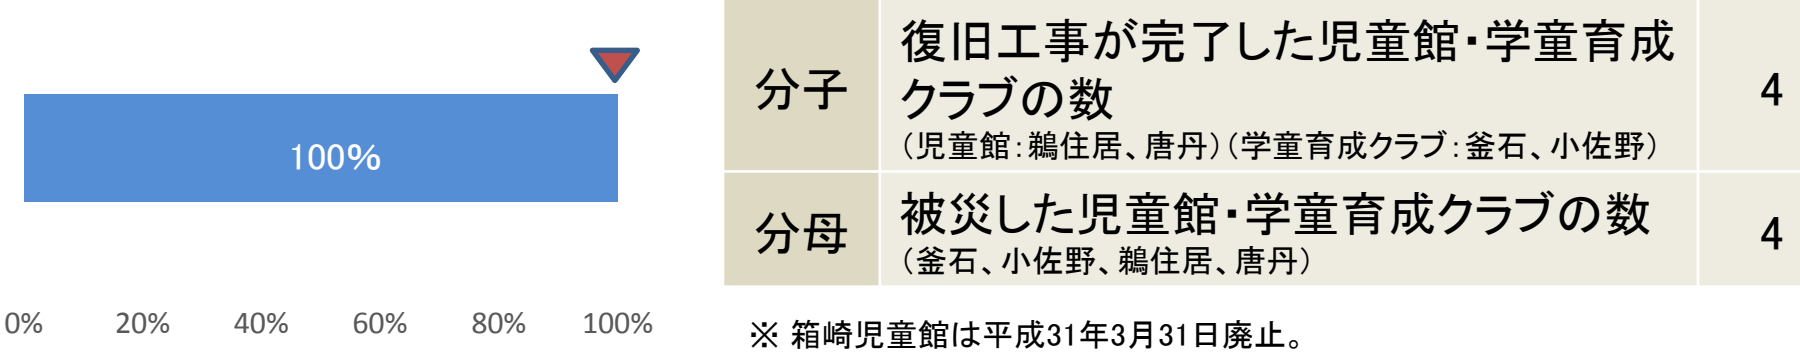


中学校復旧工事の進捗

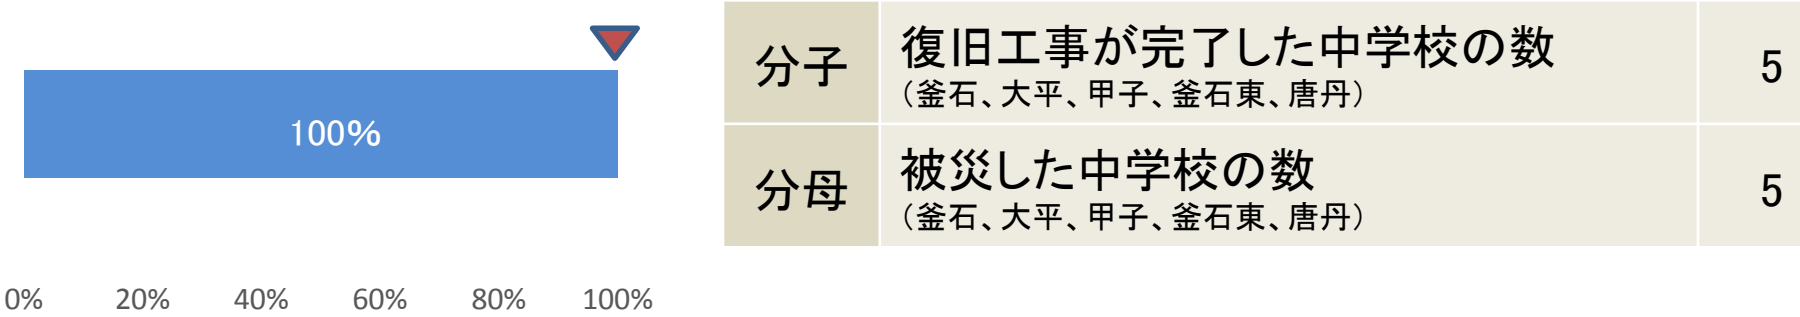

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-6 その他(1)


ボランティア受け入れの人数



※釜石市社会福祉協議会で把握している人数


2-6 その他(2)

人口(月別)

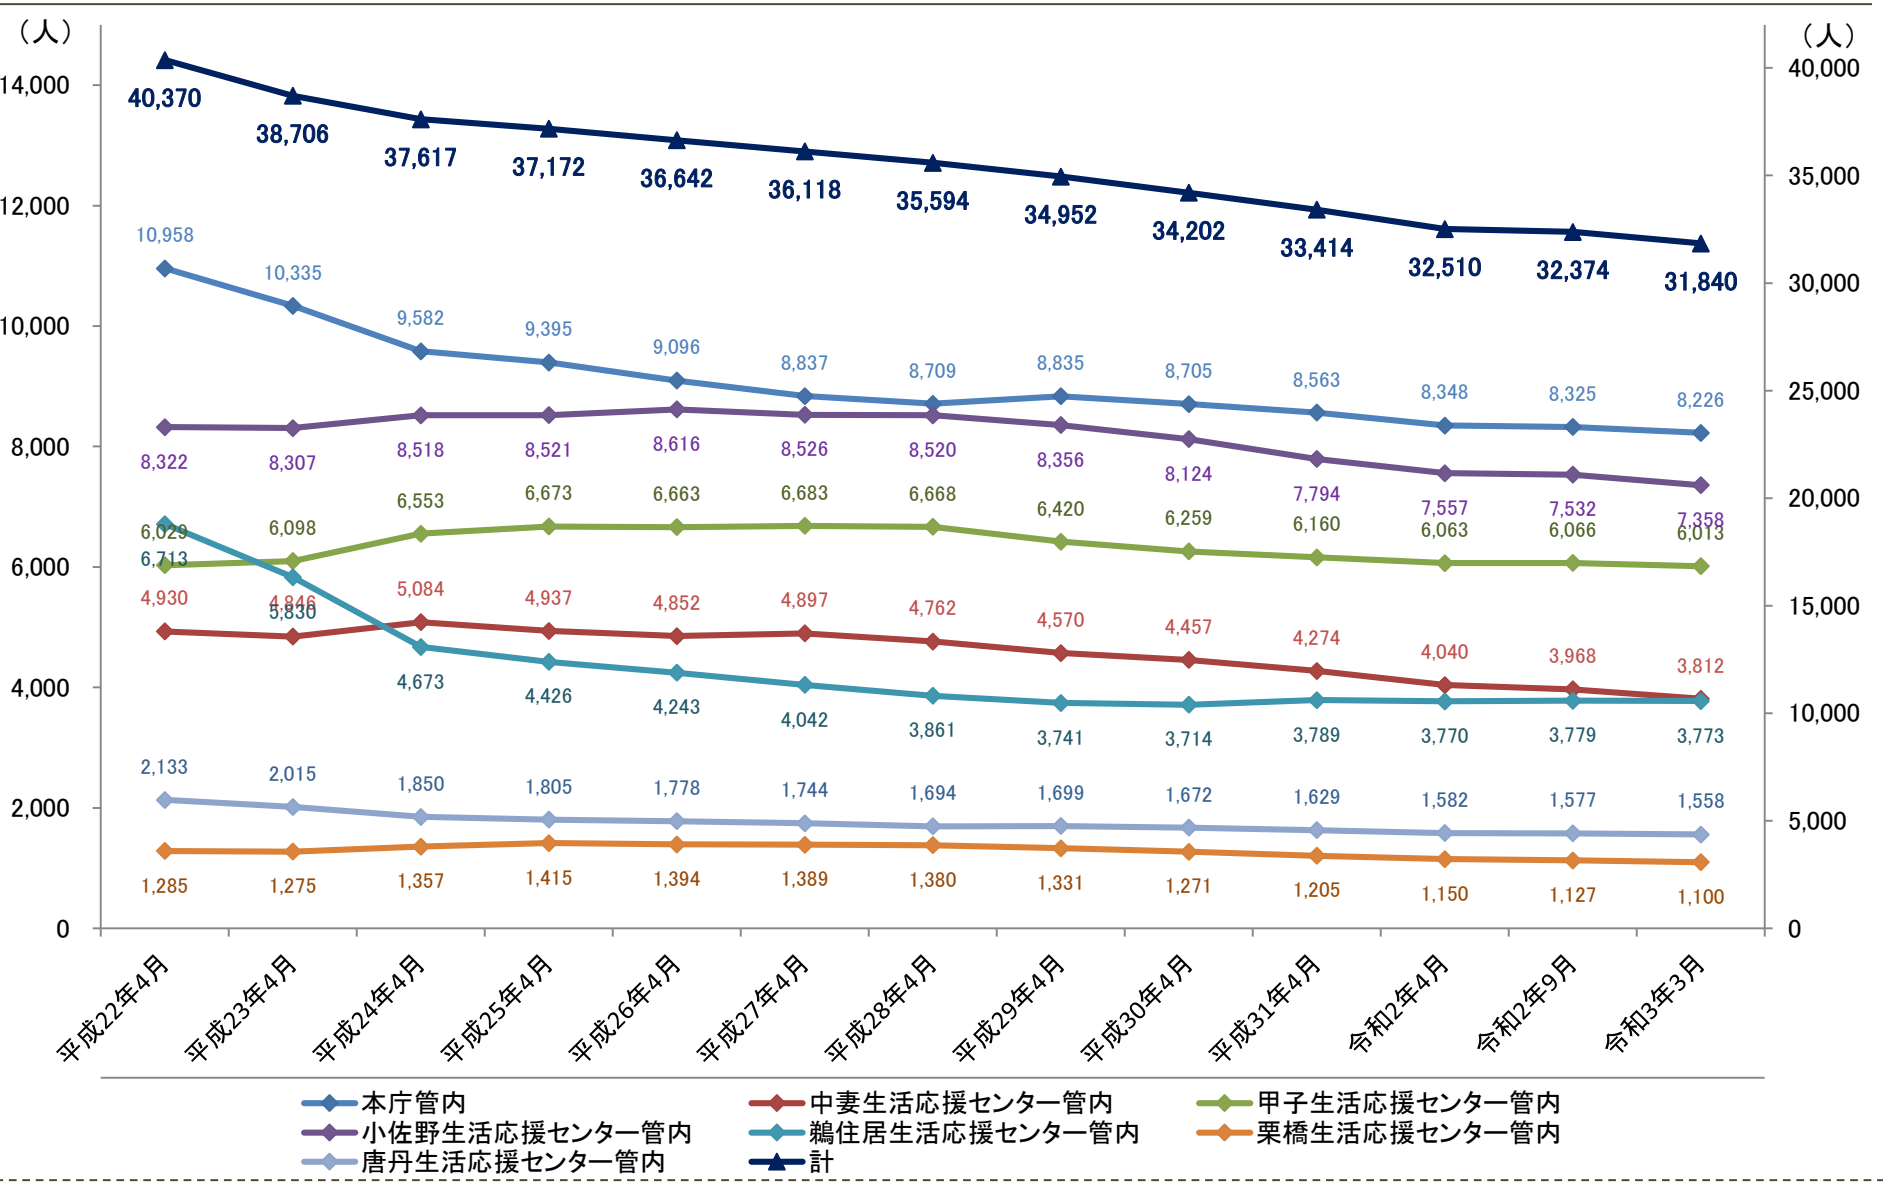

2-6 その他(3)


人口(社会動態)



	転入	転出	増減
平成24年度	1,292	-1,347	-55
平成25年度	1,252	-1,443	-191
平成26年度	1,270	-1,345	-75
平成27年度	1,205	-1,311	-106
平成28年度	1,155	-1,274	-119
平成29年度	1,031	-1,414	-383
平成30年度	1,088	-1,444	-356
令和元年度	974	-1,304	-330
令和2年度	863	-1,139	-276

2-6 その他(4)

他市町村から釜石市への派遣職員等の人数

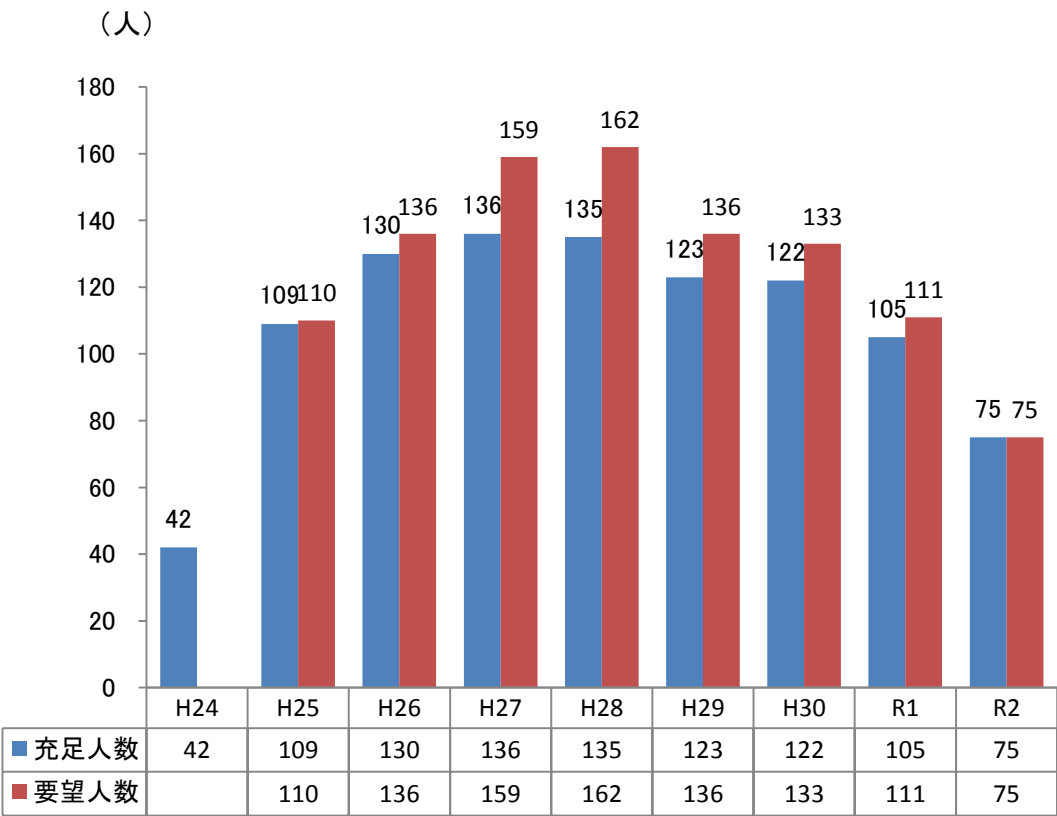

充足率(対要望人数比)	
平成24年度	—
平成25年度	99%
平成26年度	96%
平成27年度	86%
平成28年度	83%
平成29年度	90%
平成30年度	92%
令和元年度	95%
令和2年度	100%

2-7 完了項目

項目	指標	数値	単位
土地利用			
災害廃棄物処理の完了数	完了総量	946	千t
インフラ			
道路災害復旧事業の進捗	工事が完了した市道の箇所数	65	箇所
橋りょう復旧事業の進捗	工事が完了した橋りょうの箇所数	9	箇所
河川改修事業の進捗	工事が完了した箇所数	15	箇所
下水道施設災害復旧事業の進捗	復旧工事が完了した施設箇所(管路施設)	8	箇所
