

かまいし復興レポートVol.28

釜石市

平成27年8月1日

目次

- 1 「かまいし復興レポート」について
- 2 復旧・復興の進捗状況
 - 2-1 事業費
 - 2-2 土地利用
 - 2-3 インフラ整備
 - 2-4 住まい
 - 2-5 産業・雇用
 - 2-6 教育
 - 2-7 その他
- 3 問い合わせ先

1 「かまいし復興レポート」について


□目的

- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する


□公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回(Vol.28)の数値は平成27年7月31日時点
- 括弧内は前回数値(平成27年5月31日時点)からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする


主な復興事業費の配分済額(単位:億円)

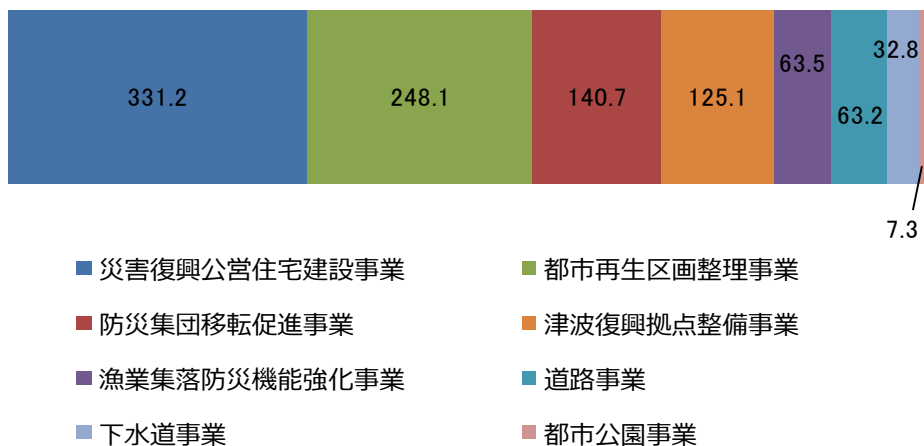

主な復興事業費の措置率

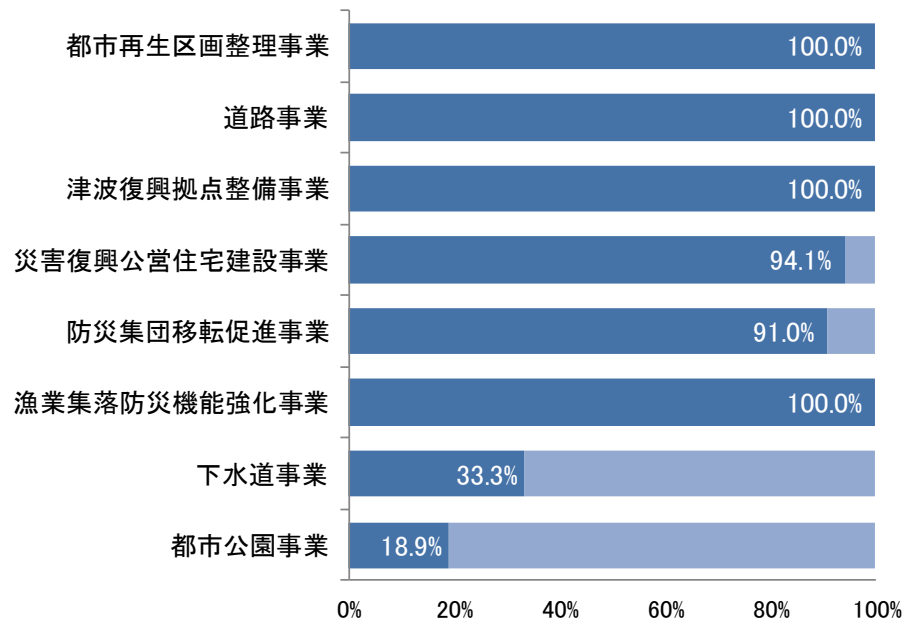


主な復旧事業費(単位:億円)

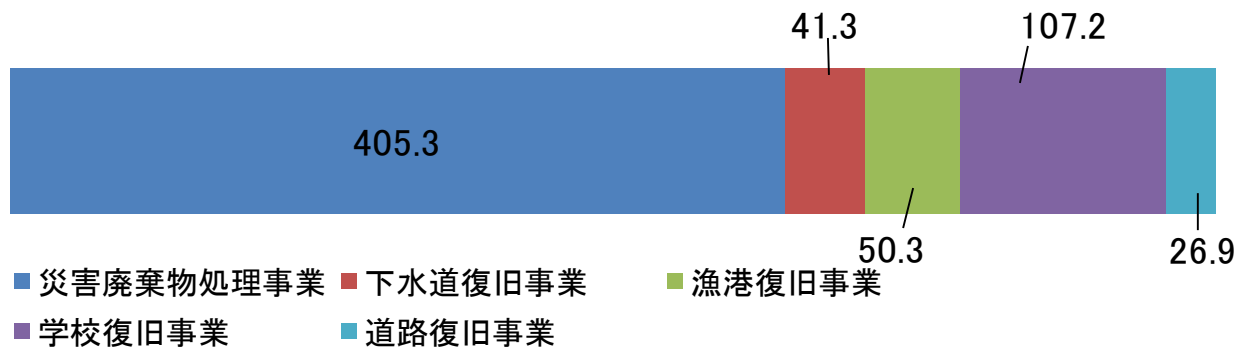


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

各地区の主な事業種別

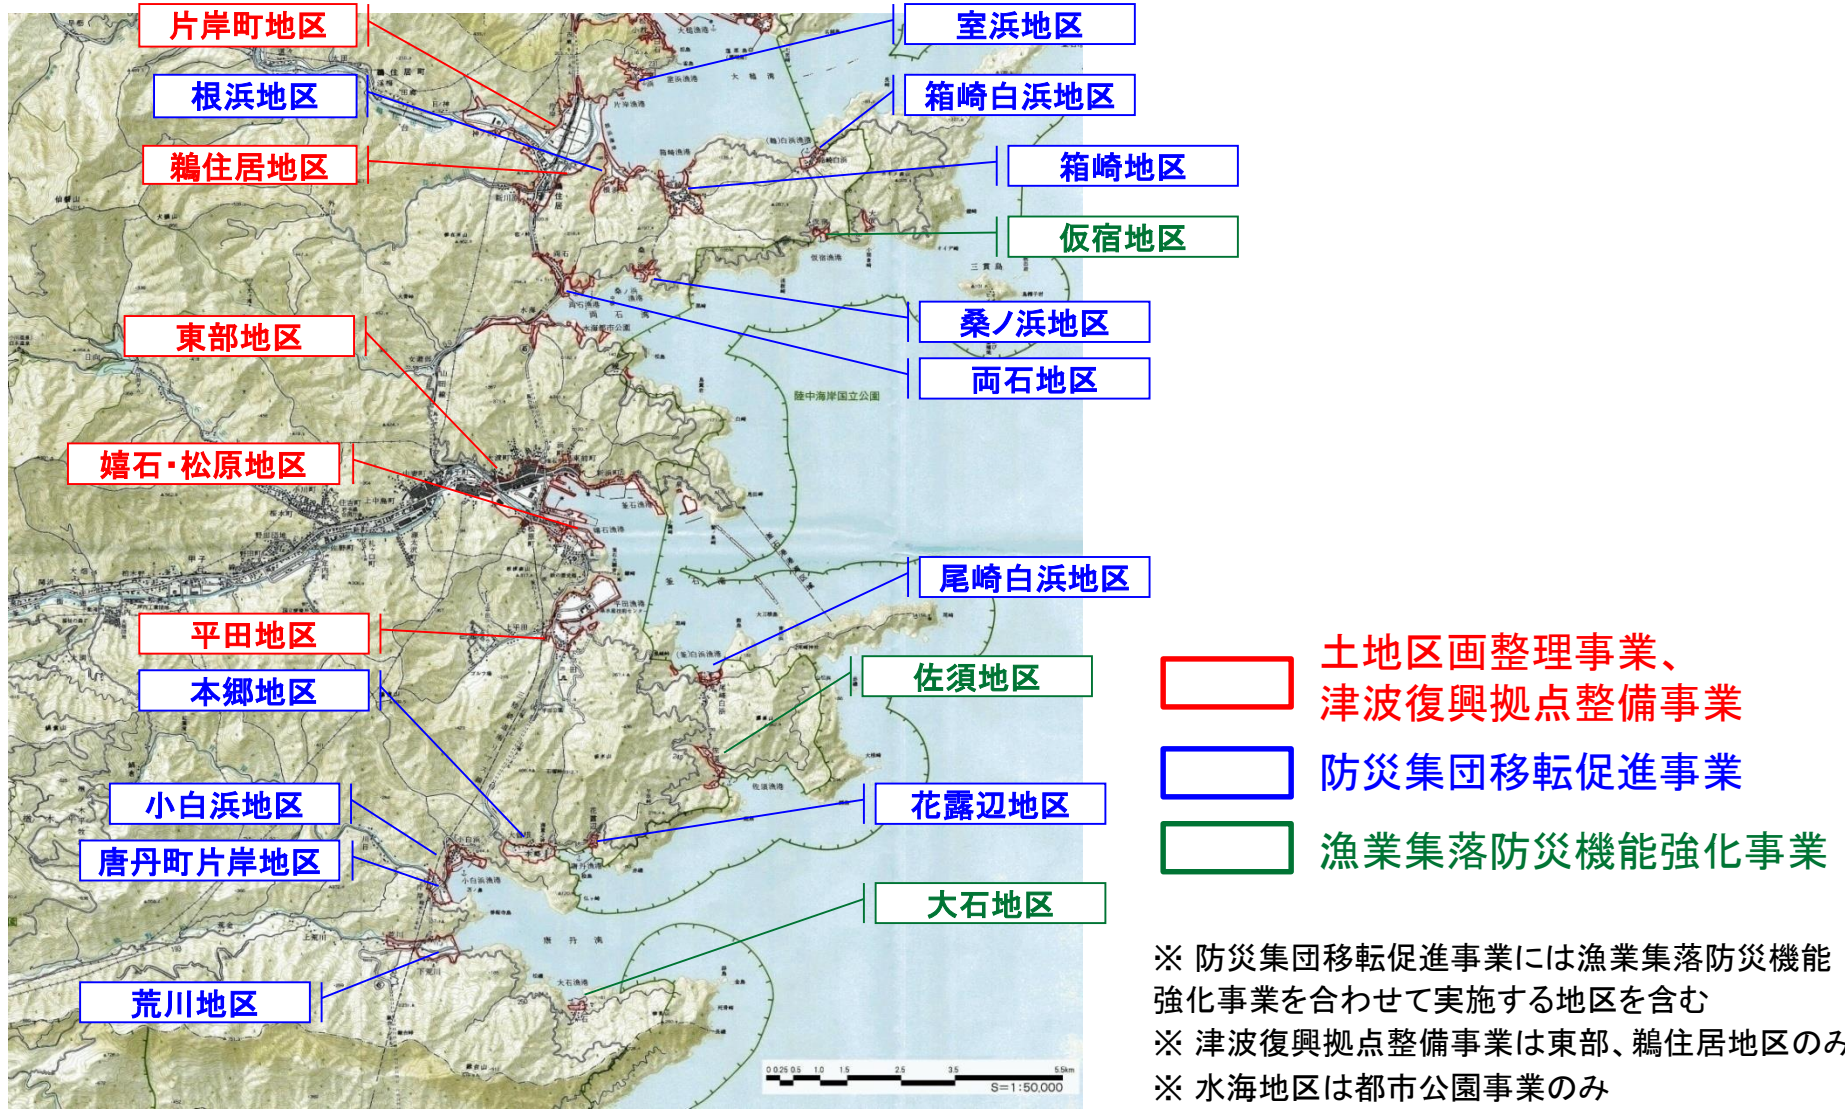

2-2 土地利用(2)


土地区画整理事業の進捗

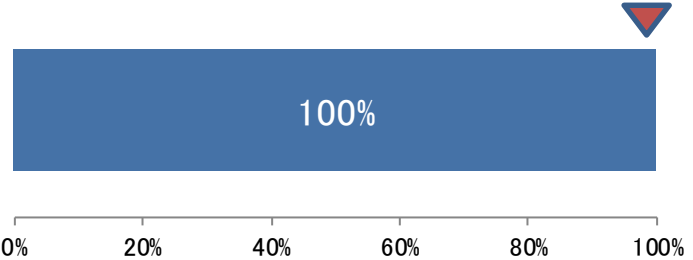

分子	仮換地指定が終了した地区	4
分母	土地区画整理事業を実施予定地区の数	4

「土地区画整理事業」とは？

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするために、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集約化を行う

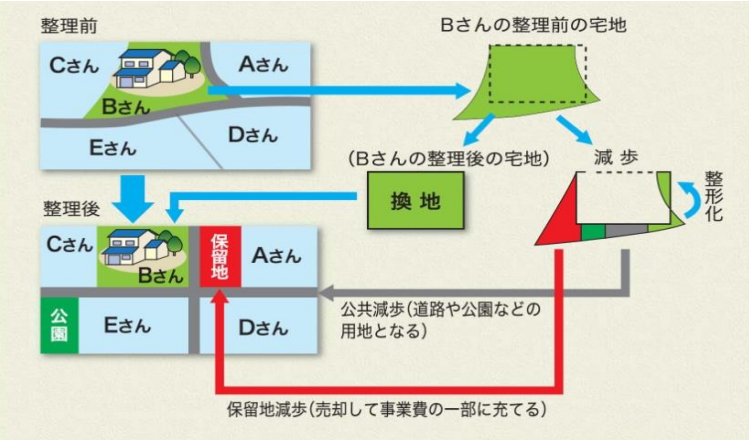


なお、釜石市の区画整理事業においては、保留地減歩は行いません。

スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年5月～ 平成25年3月
都市計画決定	平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
事業計画認可	平成25年3月
換地設計	平成25年3月～
審議会選挙等	平成25年4月～
仮換地指定	平成26年度下期
建物等の移転・工事	平成26年度下期～ 平成30年3月 平成29年度下期～ 平成30年3月
換地処分	

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


防災集団移転促進事業の進捗

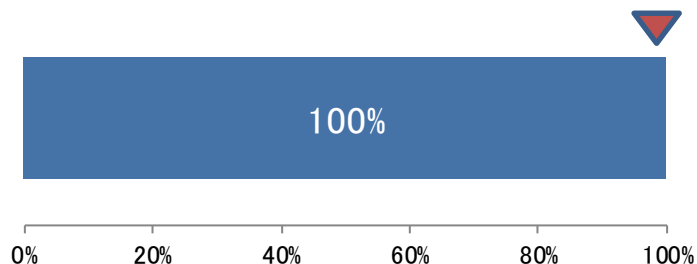

分子	工事を実施する業者が決定した地区数	11
分母	防災集団移転促進事業を実施予定地区の数	11

「防災集団移転促進事業」とは？

- ・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
- ・移転元の土地は住宅地としては利用不可

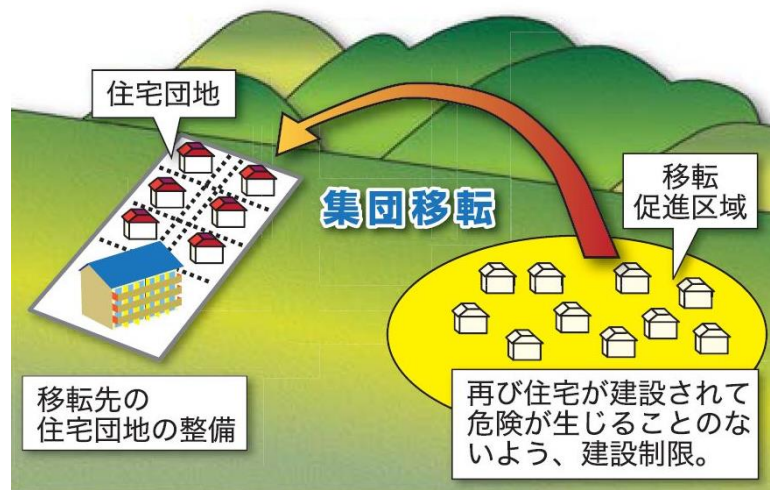


スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
防災集団移転促進事業大臣同意	平成24年6月 1地区 平成24年9月 7地区 平成24年10月 3地区
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年5月～

2-2 土地利用(4)


漁業集落防災機能強化事業の進捗

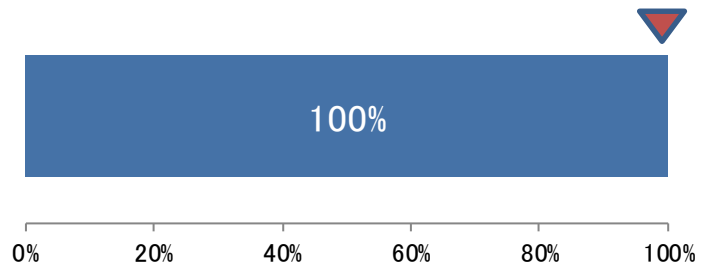

分子	工事を実施する業者が決定した地区数	13
分母	漁業集落防災機能強化事業を実施予定地区の数	13

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

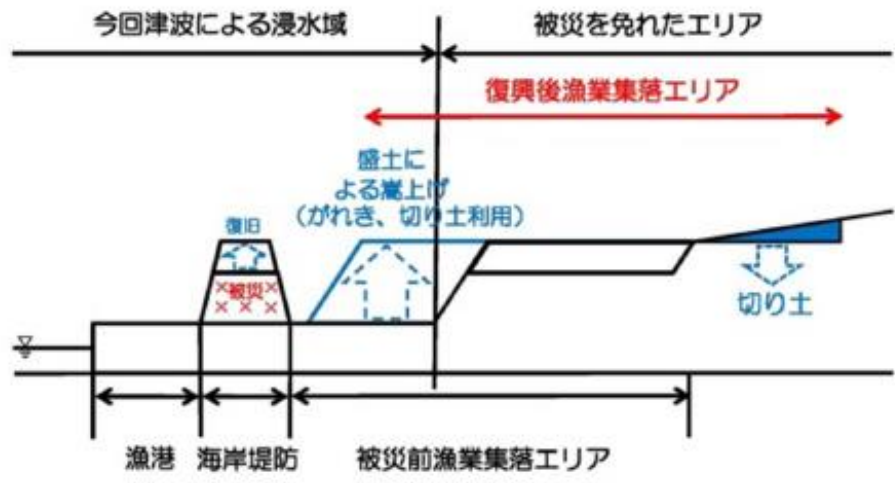


スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

用地買収の進捗

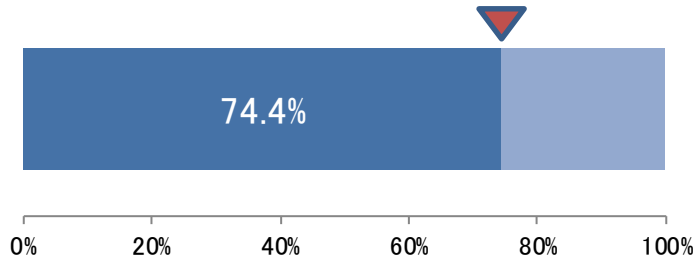


分子	買収面積	785,798 (+35,449)
分母	買収予定面積	1,011,532 (+3,419)

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位: m²

災害廃棄物処理の完了数

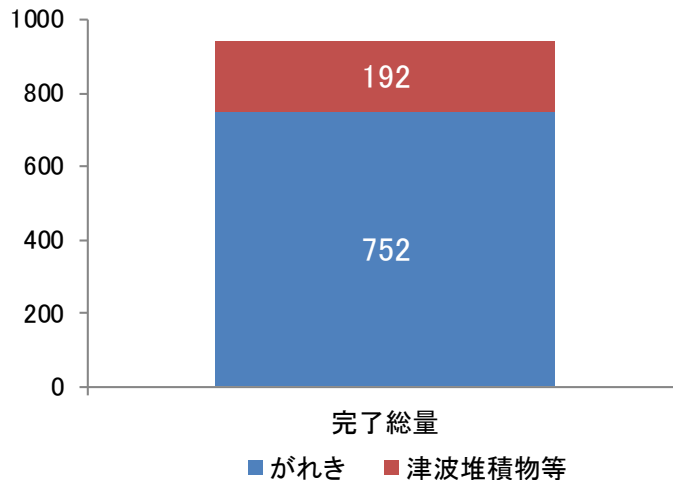

完了総量	944
仮置場への搬入(がれき)	752
仮置場への搬入(津波堆積物)	192
処理済み(がれき)	752
処理済み(津波堆積物)	192


単位: 千t

※ 建物・基礎撤去の総数

建物撤去 1,407件


基礎撤去 4,581件

道路災害復旧事業の進捗




分子	工事が完了した市道の箇所数	59
分母	被災した市道の箇所数	77

橋りょう復旧事業の進捗

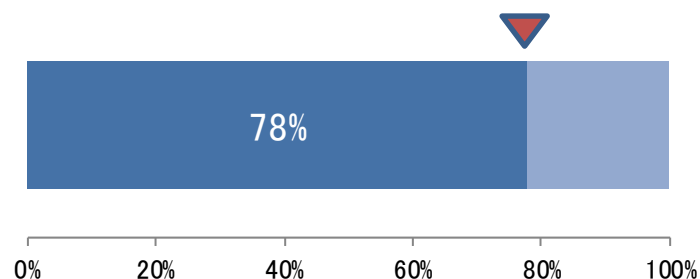

分子	工事が完了した橋りょうの箇所数	7
分母	被災した橋りょうの箇所数	9


河川改修事業の進捗

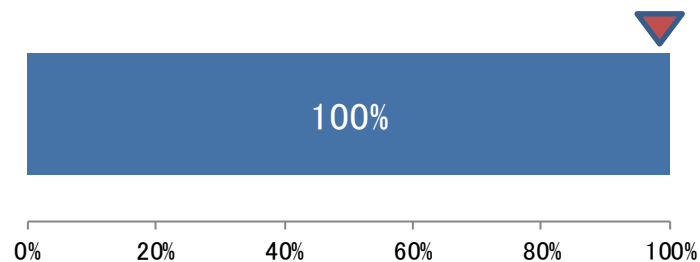

分子	工事を発注した箇所数	15
分母	整備予定の箇所数	15

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


下水道施設災害復旧事業の進捗

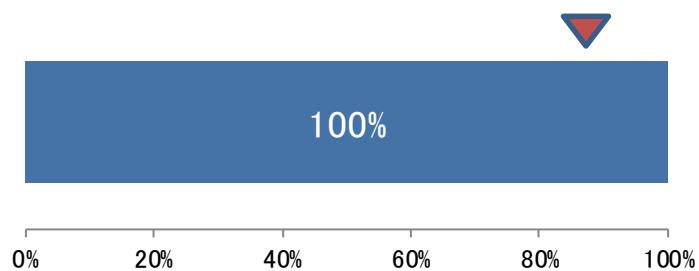

分子	復旧工事が完了した施設箇所 (管路施設)	8
分母	被災した下水道の施設箇所 (処理場・ポンプ施設、管路施設)	8

漁港災害復旧事業(市漁港)の進捗


単位:千円

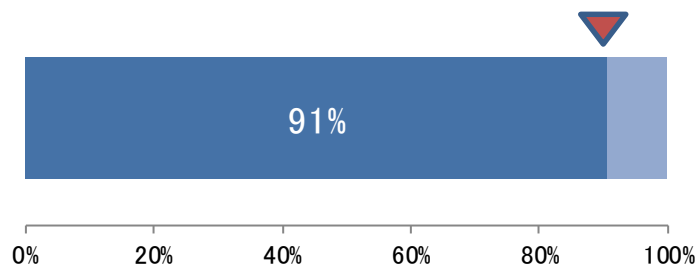

分子	工事発注済額	4,407,283
分母	工事予定総額	4,868,764

海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)の進捗


単位:千円

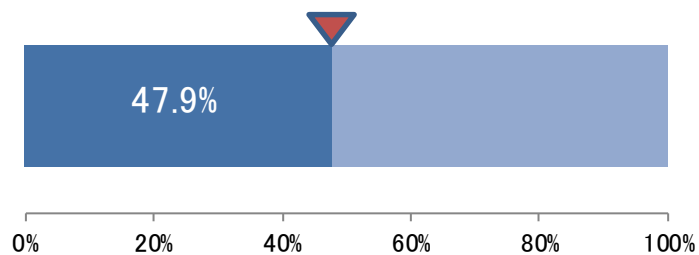

分子	工事発注済額	2,414,372
分母	工事予定総額	5,043,856


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

復興公営住宅事業の進捗

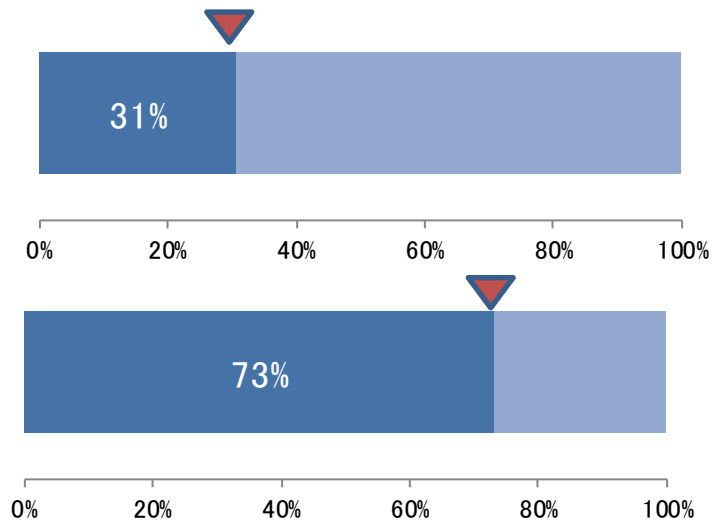

分子	建設済みの戸数	405 (+3)
分母	計画戸数(予定)	1,314
分子	工事発注済みの戸数	961
分母	計画戸数(予定)	1,314


住宅の自力再建の状況(全体)

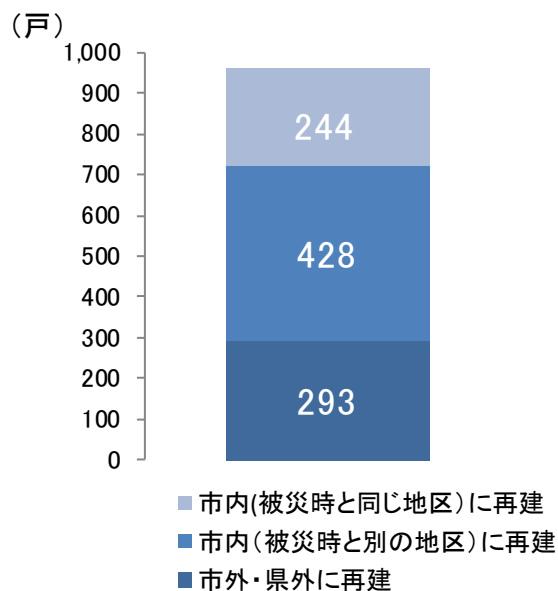

被災世帯数	4,012 (+1)
再建済み世帯数	885 (+15)
市内(被災時と同じ地区)に再建	224 (+4)
市内(被災時と別の地区)に再建	386 (+8)
市外・県外に再建	275 (+3)


※生活再建支援金の「加算支援金(建設・購入)」を申請した世帯数

住宅の自力再建の状況(地区別)

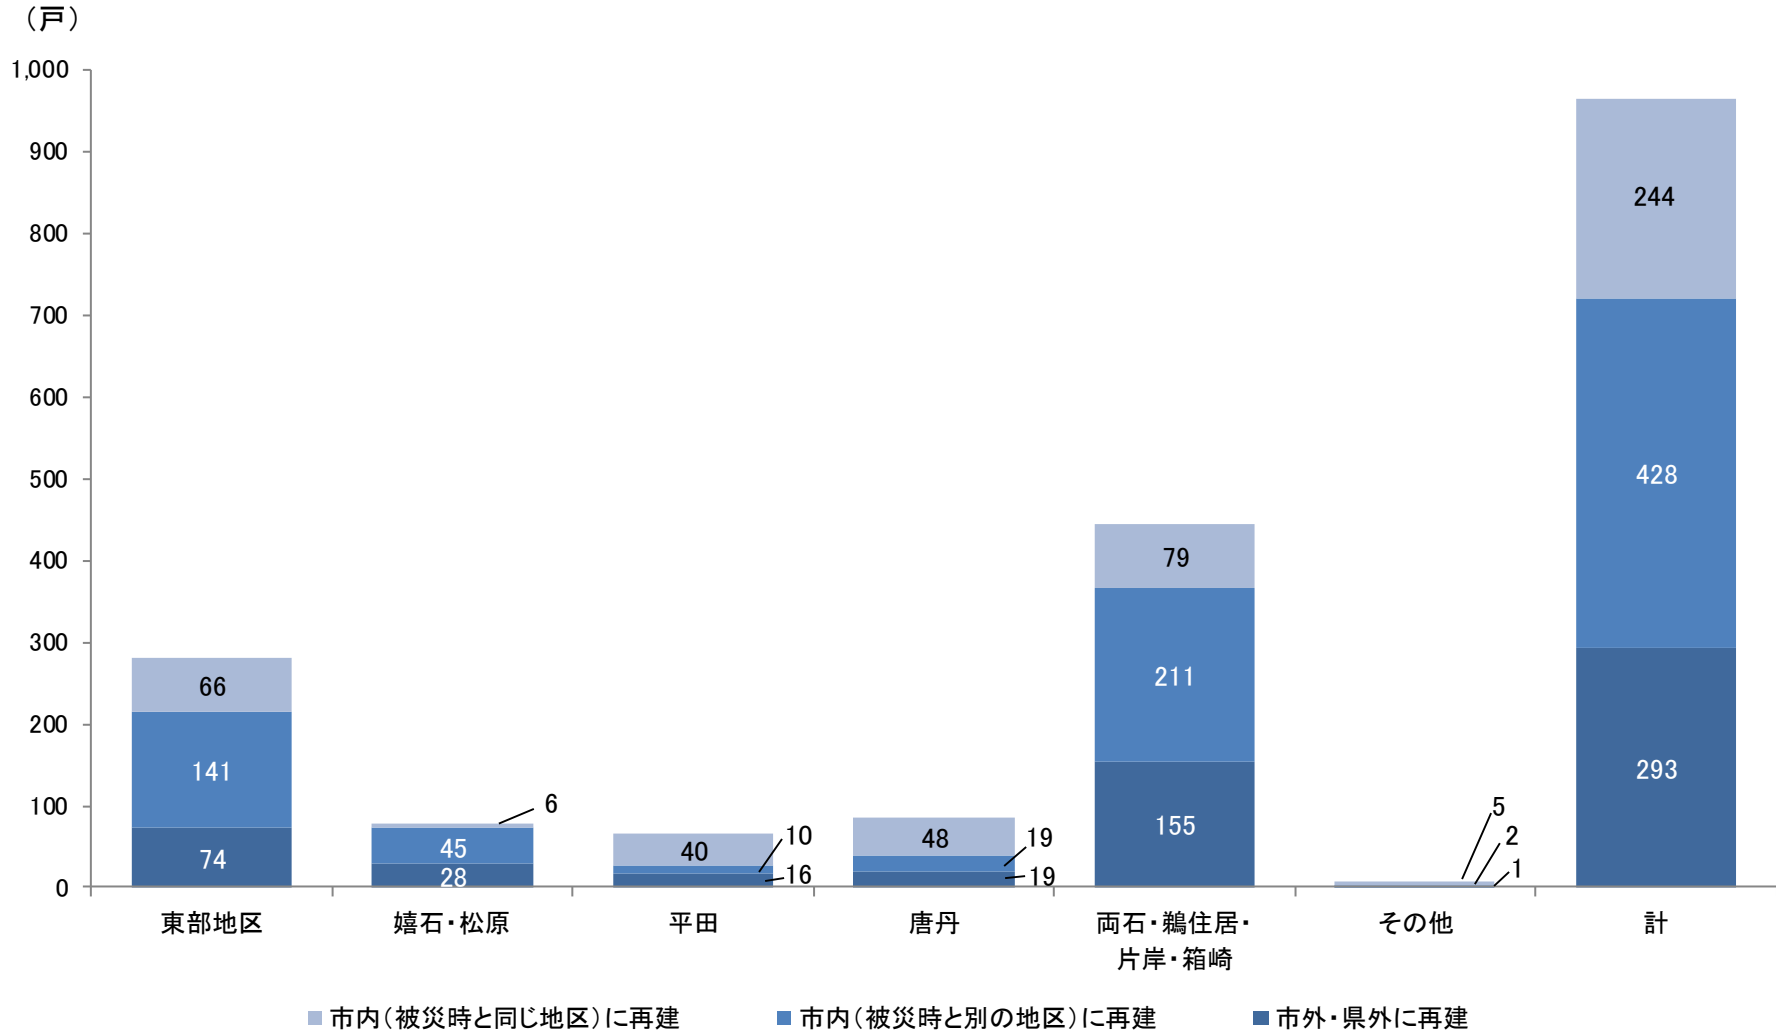


※生活再建支援金の「加算支援金(建設・購入)」を申請した世帯数

応急仮設住宅入居戸数の推移

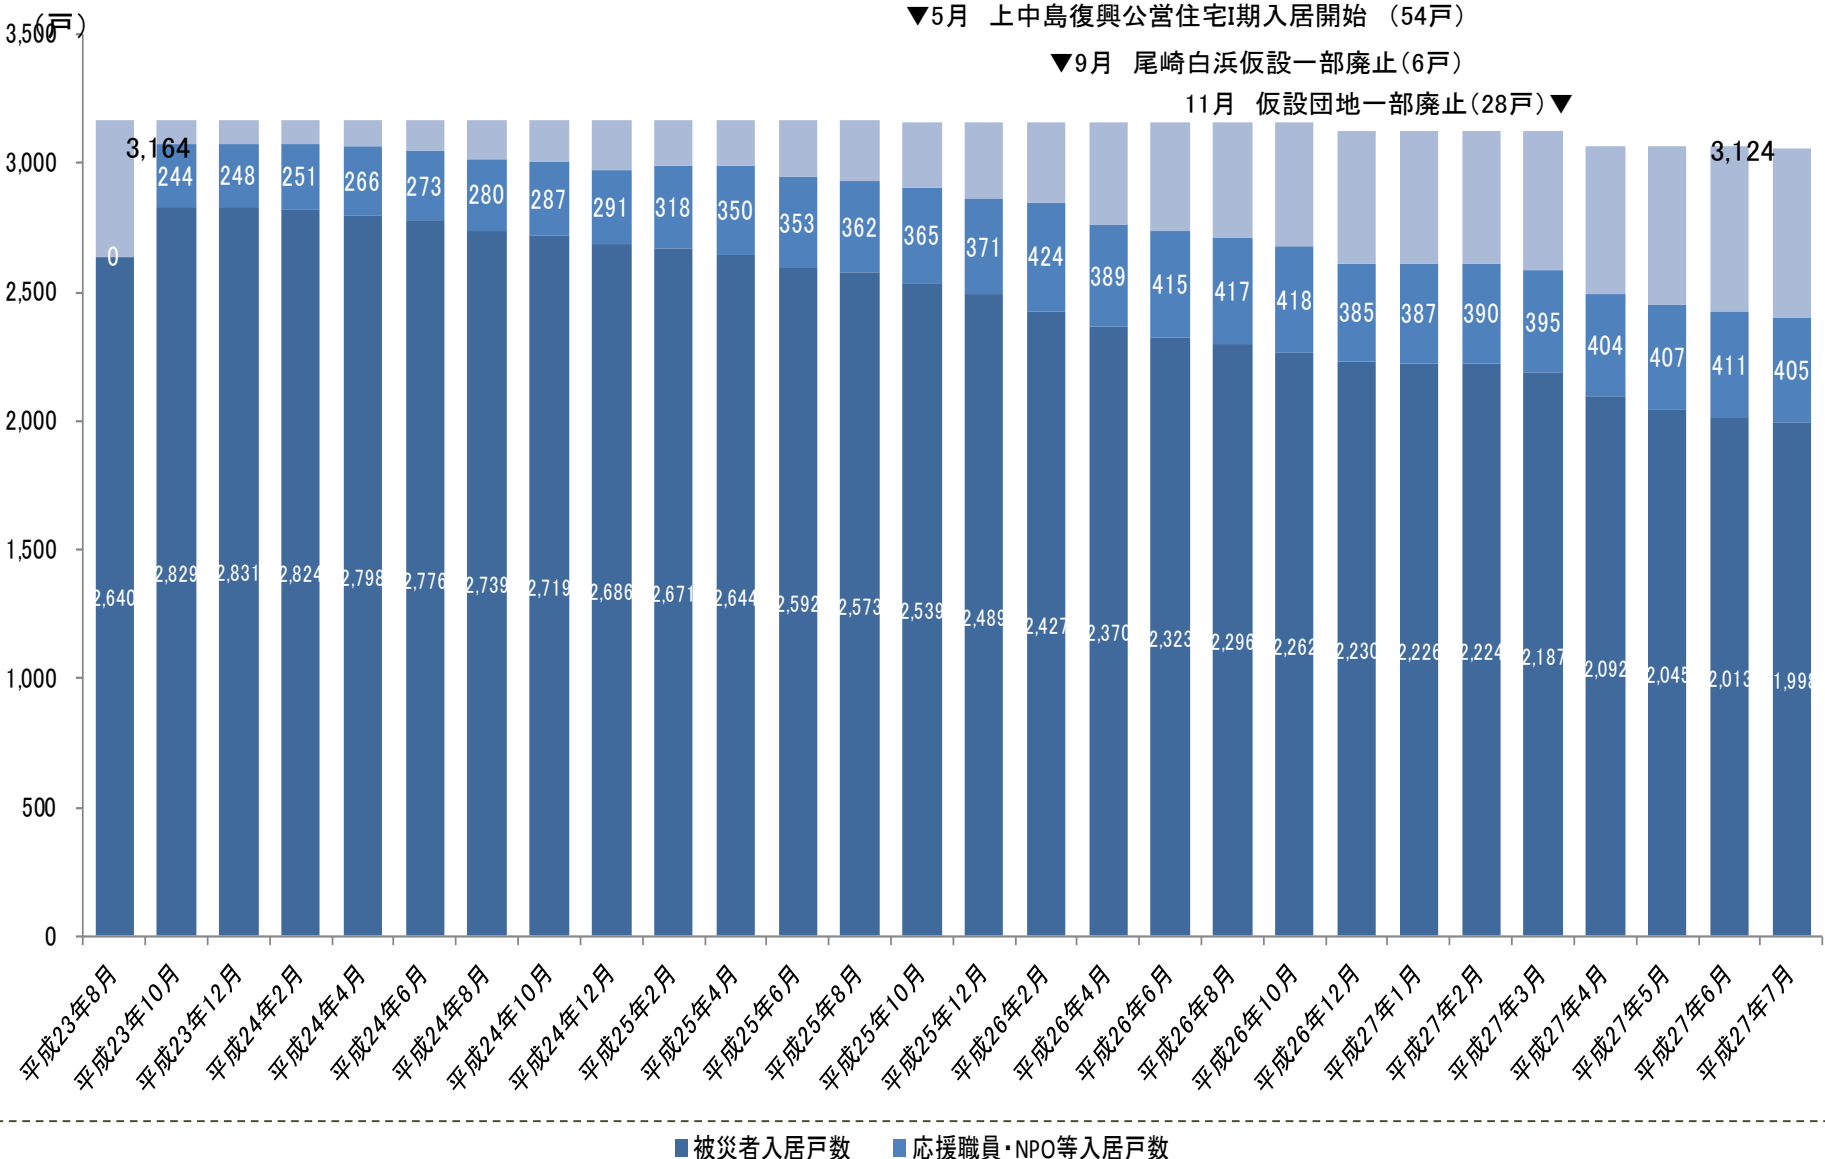


水揚げ高(魚市場)

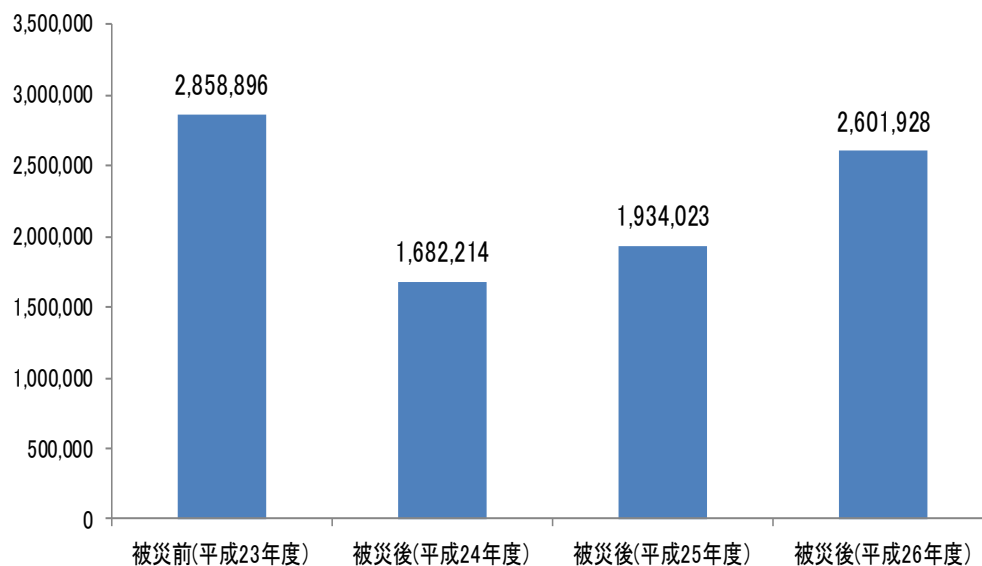

被災前(平成23年度)水揚げ高	2,858,896
被災後(平成24年度)水揚げ高	1,682,214
被災後(平成25年度)水揚げ高	1,934,023
被災後(平成26年度)水揚げ高	2,601,928


単位:千円

水産加工業企業数



震災前の企業数	14
再開した企業数(新規4を含む)	16


農地農業用施設災害復旧事業の進捗



分子	復旧農地面積	17
分母	津波冠水農地面積	53.0

単位：ha

釜石市への観光客数

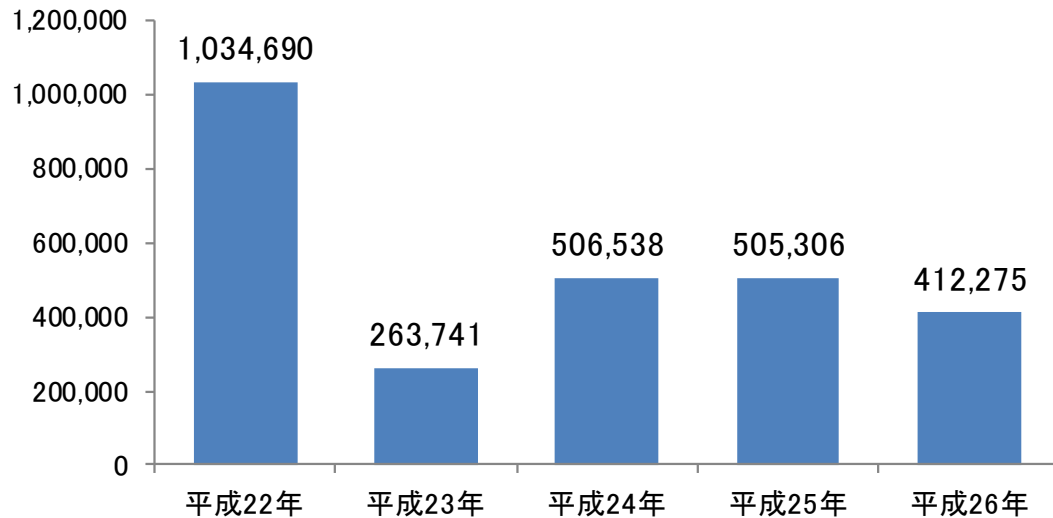


平成22年	1,034,690
平成23年	263,741
平成24年	506,538
平成25年	505,306
平成26年	412,275

※1月～12月で把握 (単位：人)

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別求職・求人状況

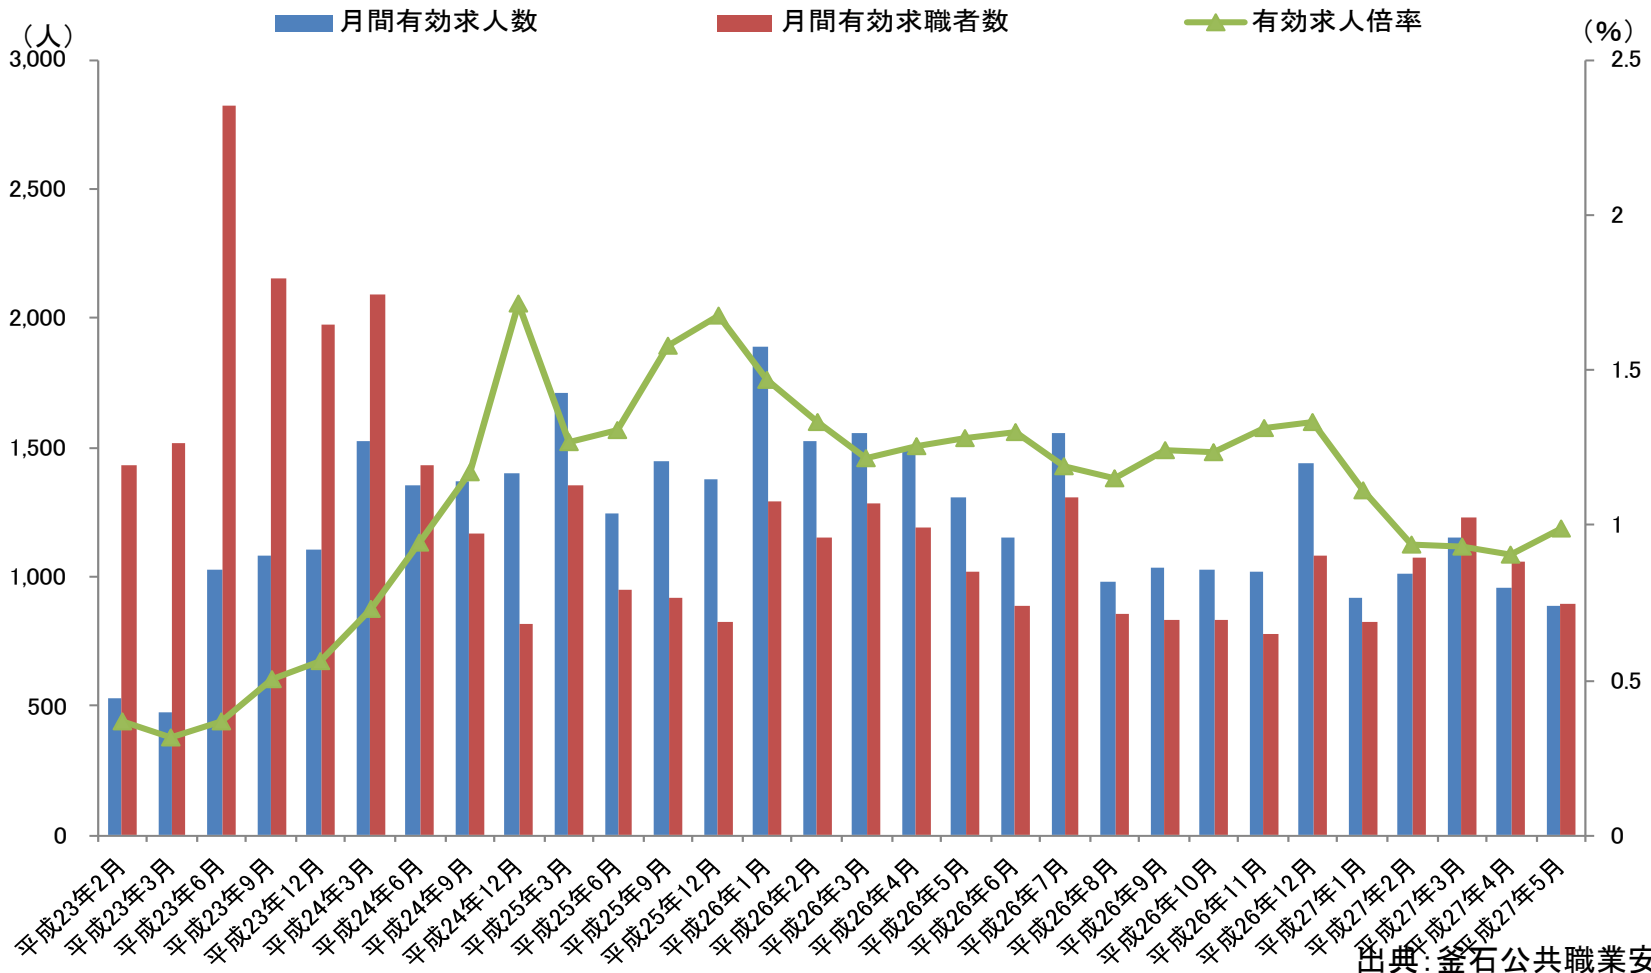

出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
 有効求職者数 : 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
 有効求人倍率 : 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標


釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の新規求人・求職状況

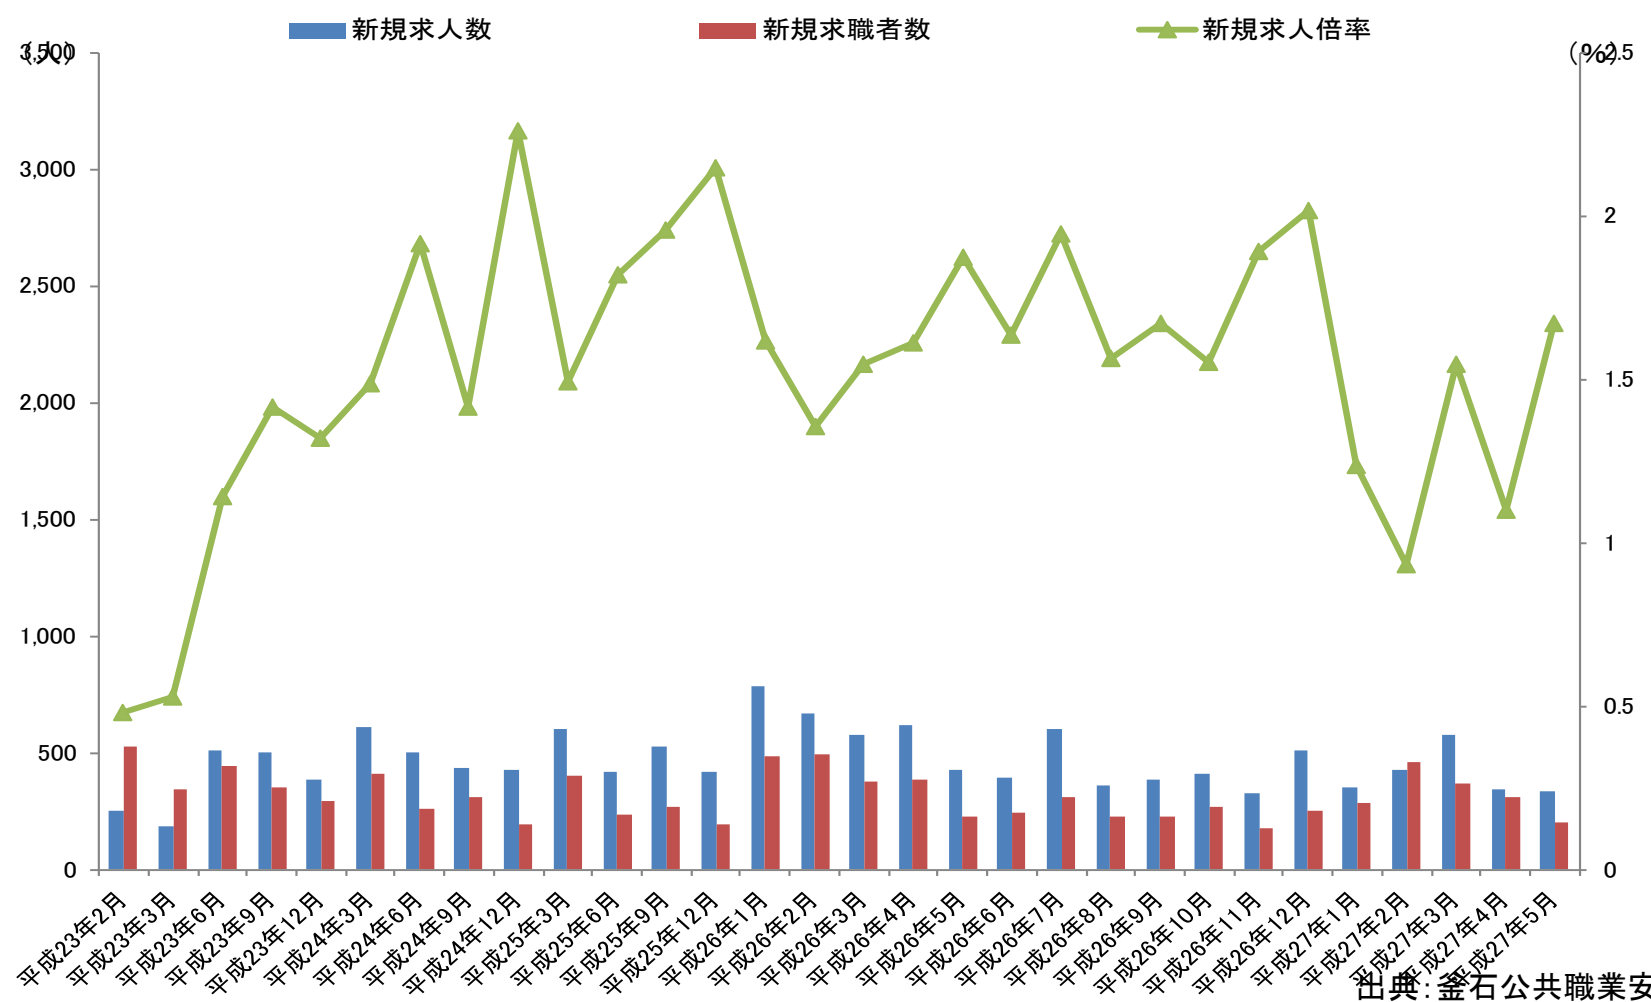

出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
 有効求職者数 : 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
 有効求人倍率 : 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

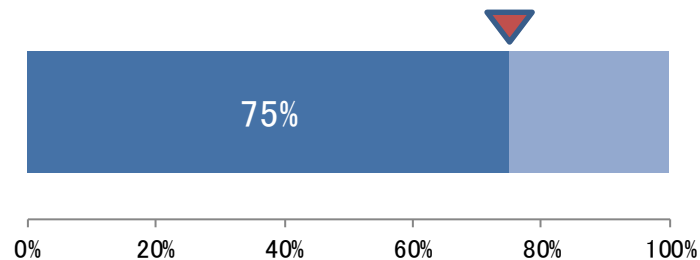

分子

復旧工事が完了した幼稚園・保育園
の数

3

(幼稚園:平田)(保育園:鶴住居)(こども園:かまいし)

分母

被災した幼稚園・保育園の数


4

(幼稚園:平田、鶴住居)(保育園:釜石、鶴住居)

※ 平田幼稚園は、平田地区区画整理事業により移転新築を施工中

※ 鶴住居幼稚園は、学校施設災害復旧事業として計画(H27年度仮設園舎で運営中)

小学校復旧工事の進捗

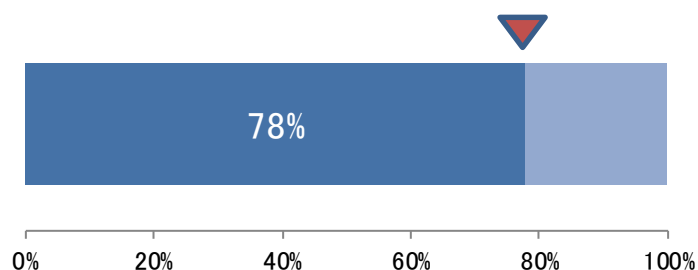

分子

復旧工事が完了した小学校の数

7

(釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林)

分母

被災した小学校の数


9

(釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林、鶴住居、
唐丹)

※ 鶴住居小学校は、釜石東中学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画(現在仮設校舎で運営中)

※ 唐丹小学校は、唐丹中学校と併設による学校施設災害復旧事業として施工中(現在仮設校舎で運営中)

児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

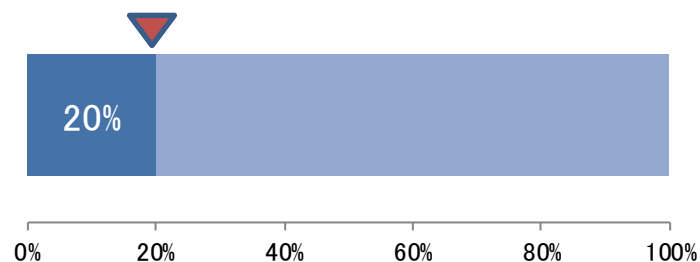

分子

復旧工事が完了した児童館・学童育成
クラブの数
(釜石)

1


分母

被災した児童館・学童育成クラブの数
(釜石、小佐野、鶴住居、唐丹、箱崎)

5

※小佐野、鶴住居、唐丹児童館・学童育成クラブは仮施設で運営中

中学校復旧工事の進捗

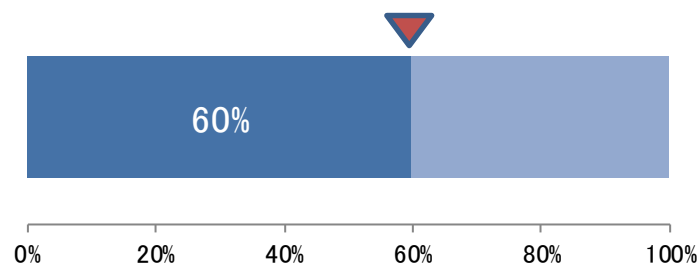

分子

復旧工事が完了した中学校の数
(釜石、大平、甲子)

3

分母

被災した中学校の数
(釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹)


5

※釜石東中学校は、鶴住居小学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画(現在仮設校舎で運営中)

※唐丹中学校は、唐丹小学校と併設による学校施設災害復旧事業として計画(現在仮設校舎で運営中)

2-7 その他(1)

ボランティア受け入れの人数(累計)

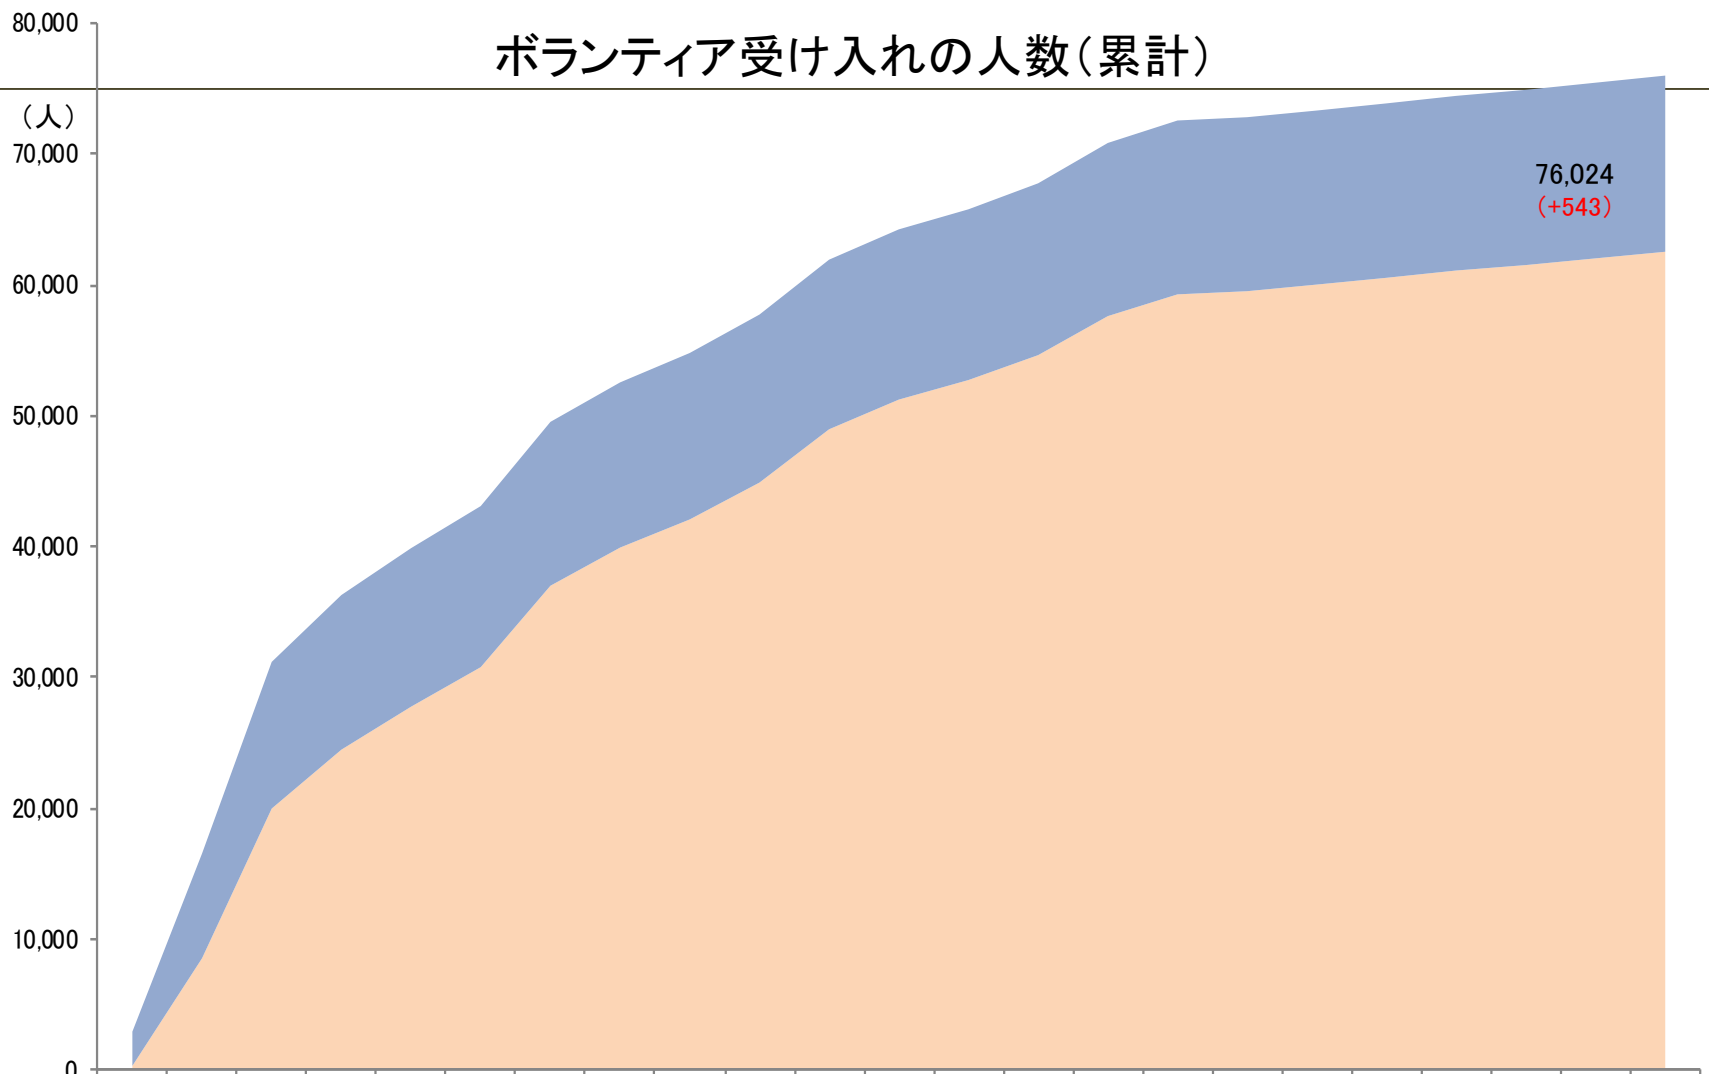


	平成23年3月	6月	9月	12月	平成24年3月	6月	9月	12月	平成25年3月	6月	9月	12月	平成26年3月	6月	9月	12月	平成27年1月	平成27年2月	平成27年3月	平成27年4月	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月
■個人	2,616	8,011	11,218	11,826	12,124	12,319	12,532	12,635	12,730	12,850	12,971	13,020	13,058	13,140	13,242	13,298	13,307	13,311	13,340	13,358	13,403	13,434	13,472
■団体	284	8,515	19,964	24,470	27,755	30,781	37,008	39,924	42,080	44,896	48,975	51,243	52,740	54,646	57,630	59,293	59,535	60,042	60,559	61,117	61,533	62,047	62,552

76,024
(+543)


※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

ボランティア受け入れの人数(月別)

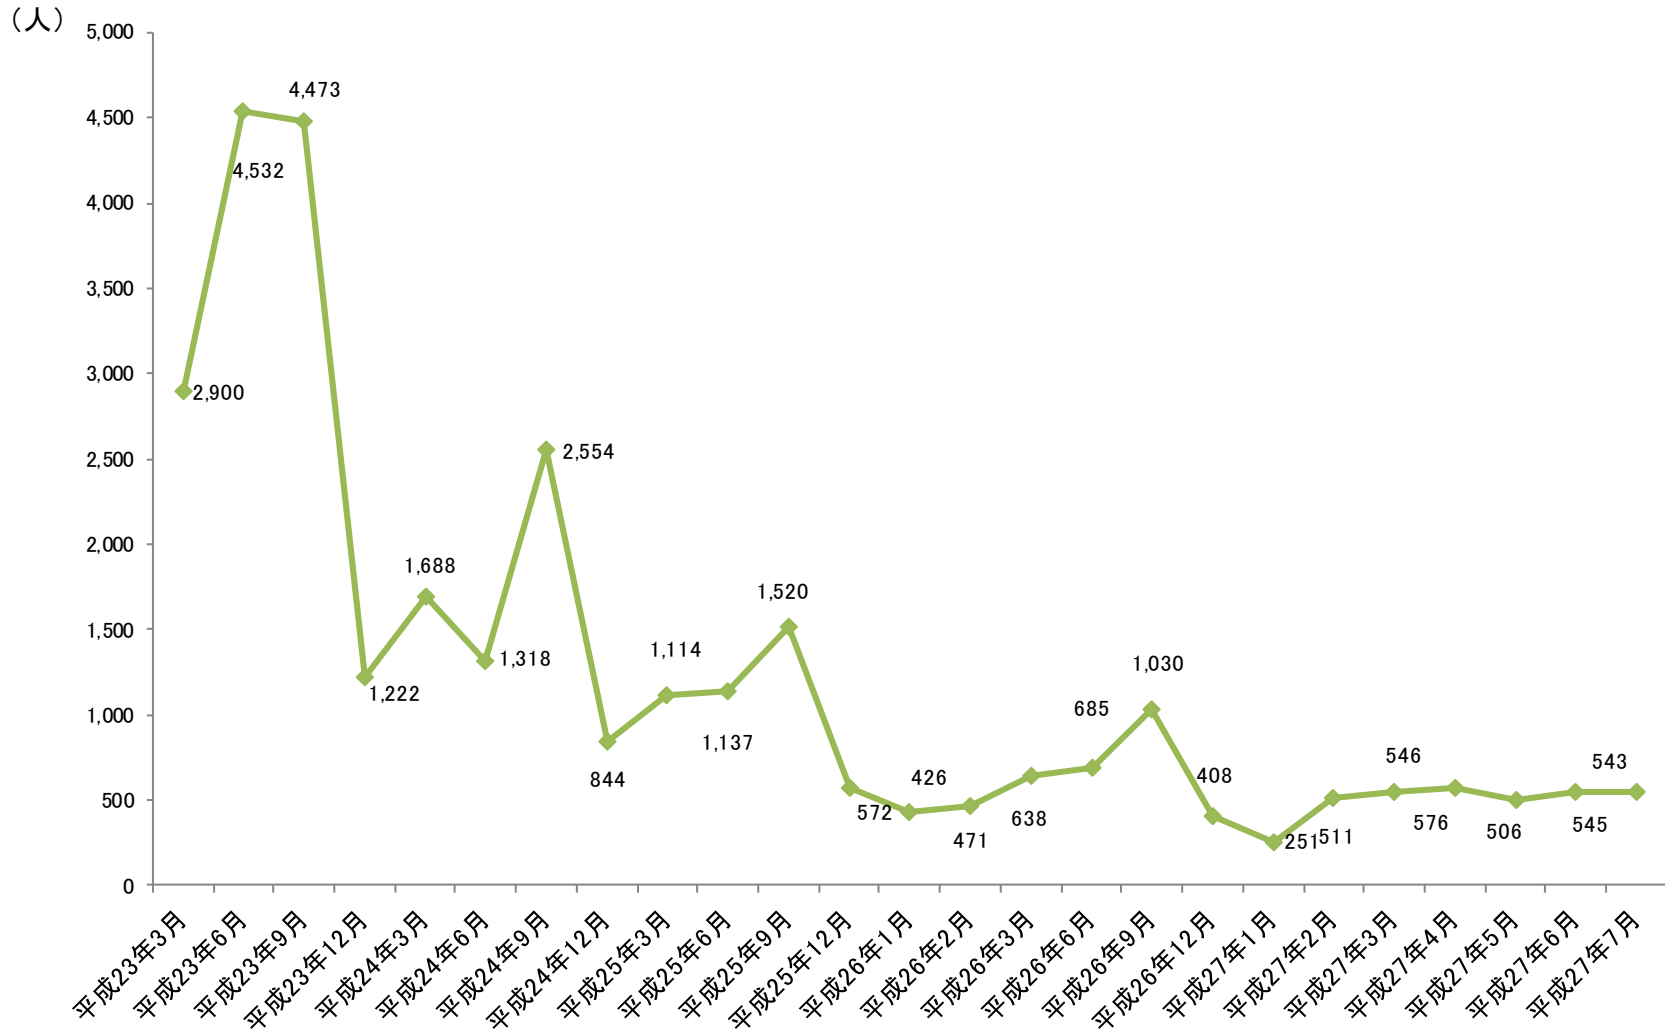


※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

人口(月別)

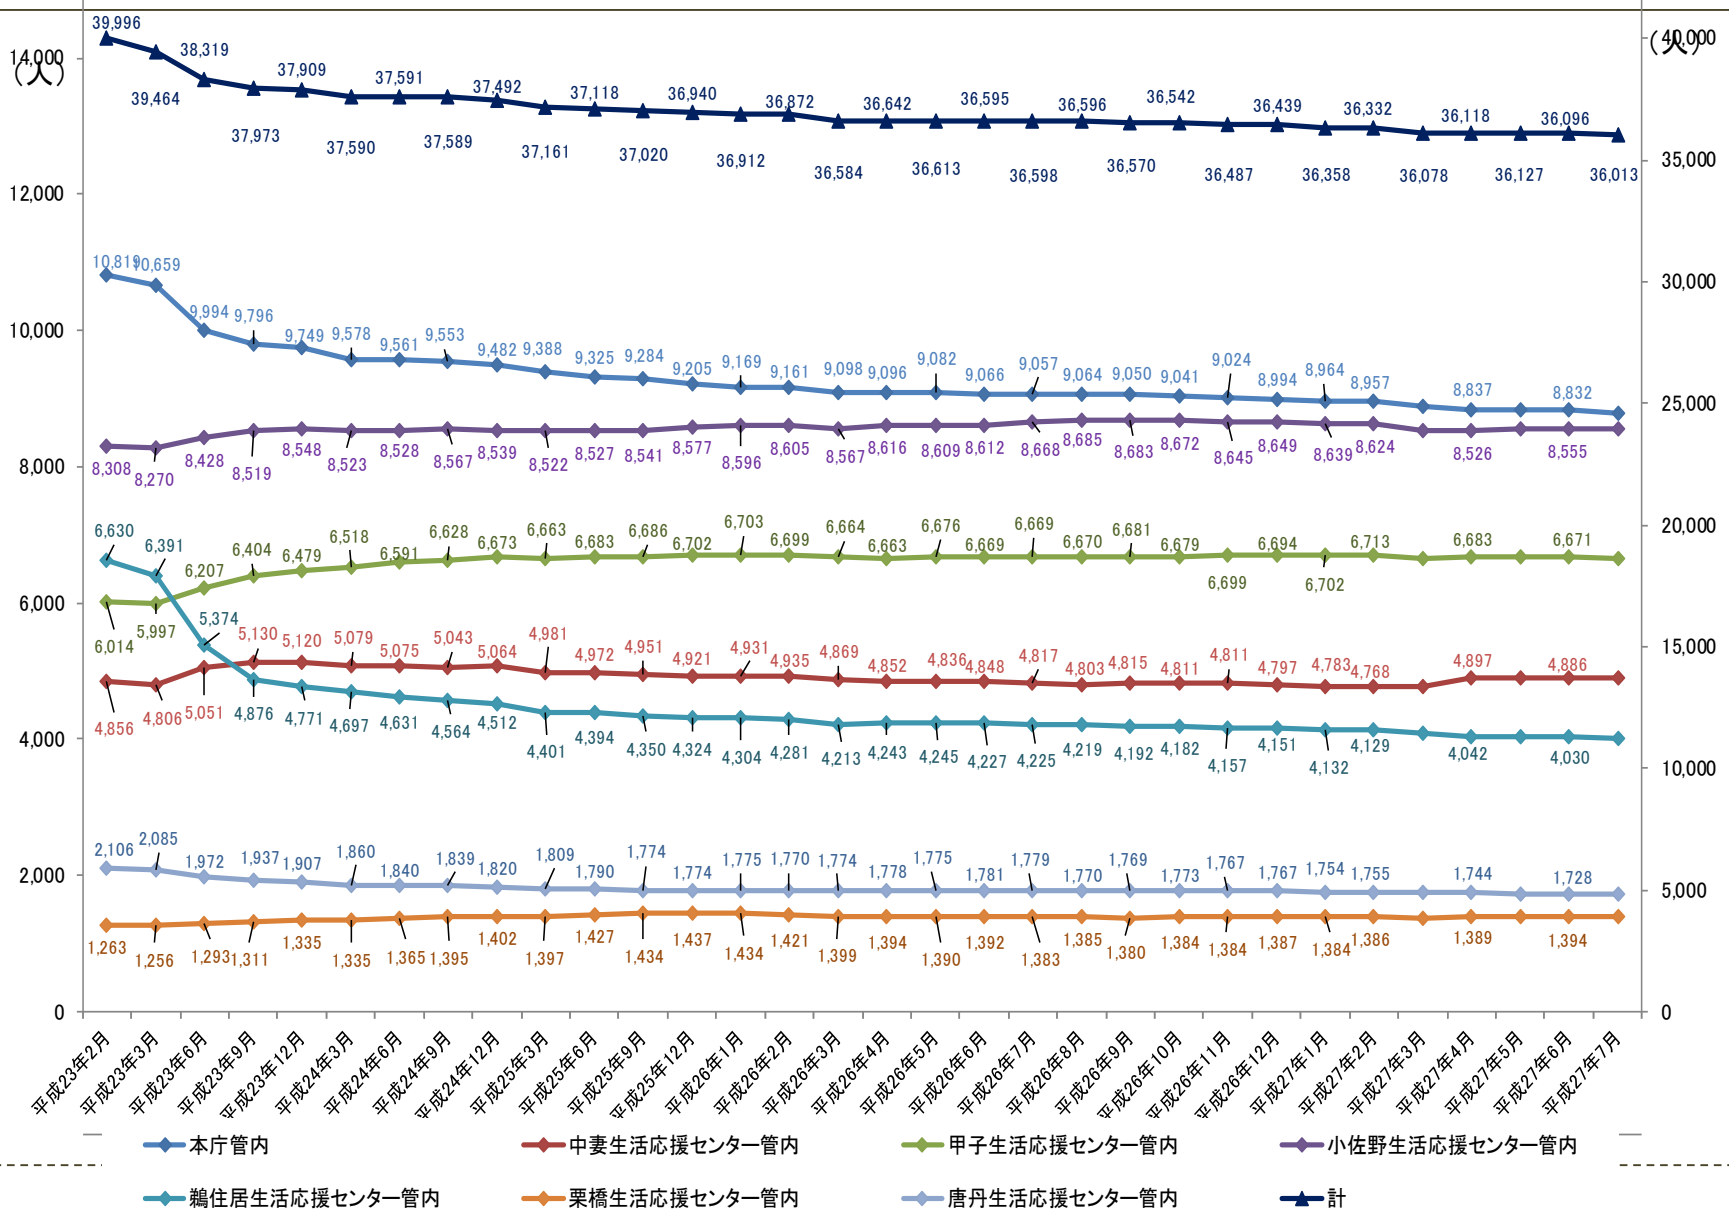


人口(社会動態)

(人)

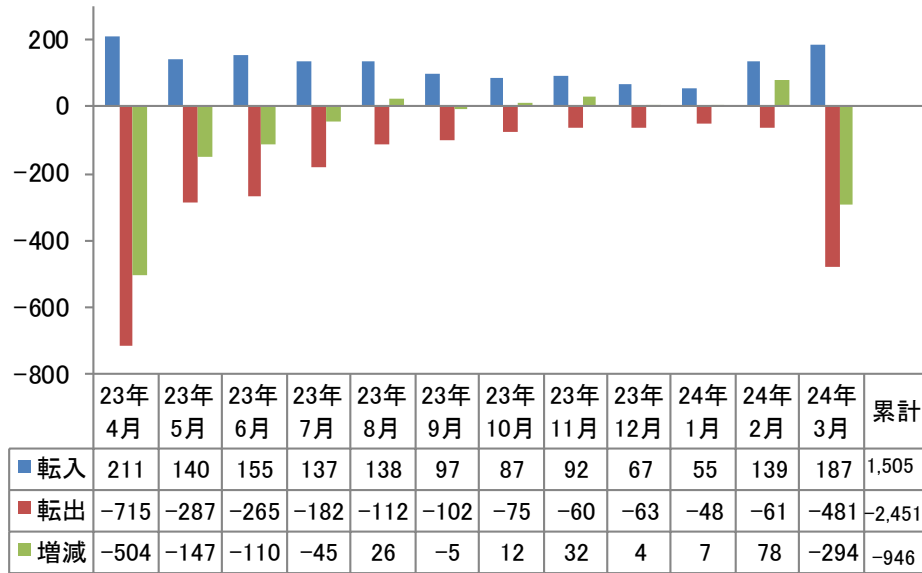

(人)


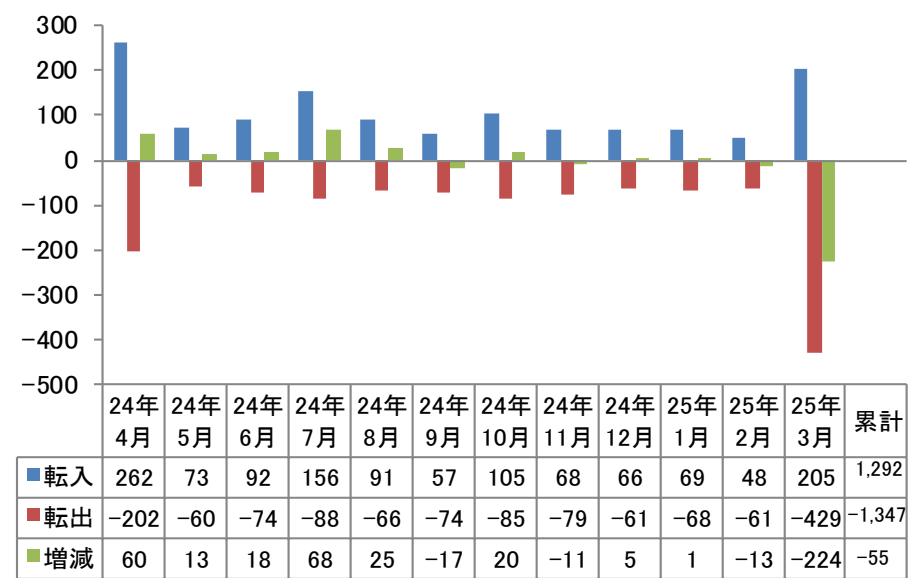


平成23年度	転入	1,505
	転出	2,451
	増減	-946

平成24年度	転入	1,292
	転出	1,347
	増減	-55

人口(社会動態)

(人)

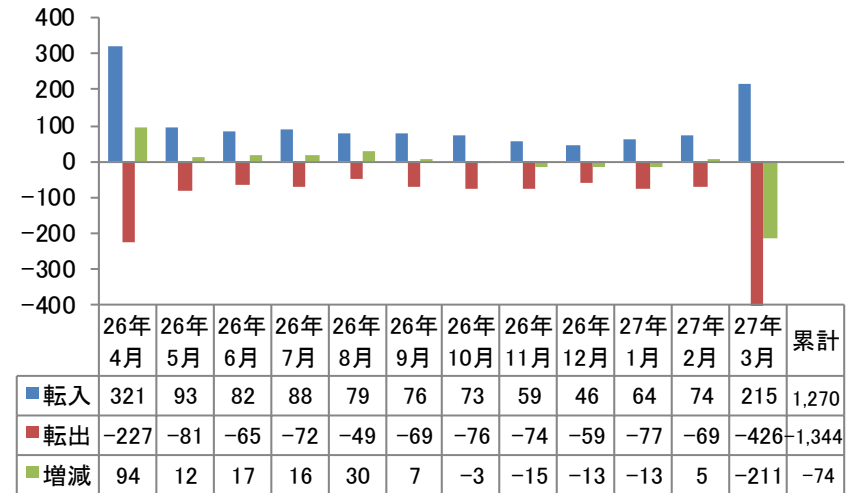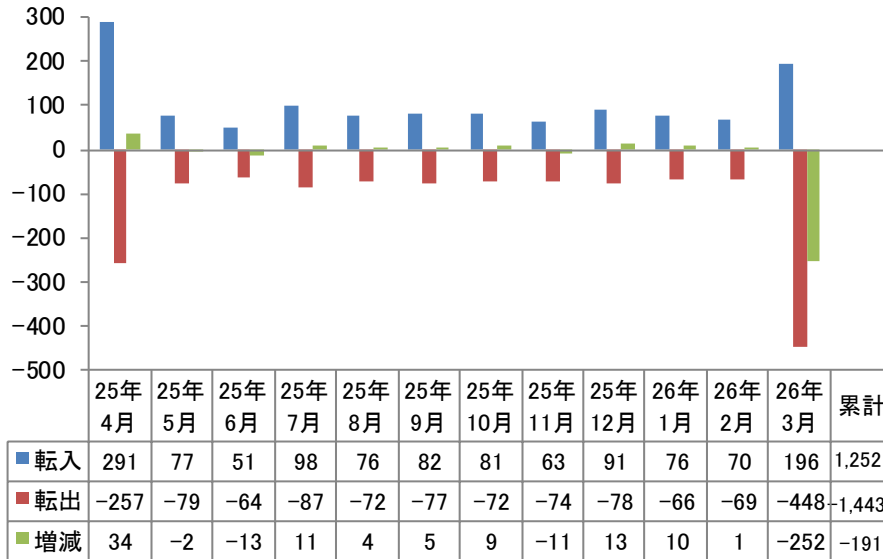


平成25年度	転入	1,252
	転出	1,443
	増減	-191

平成26年度	転入	1,270
	転出	1,344
	増減	-74

人口(社会動態)

(人)

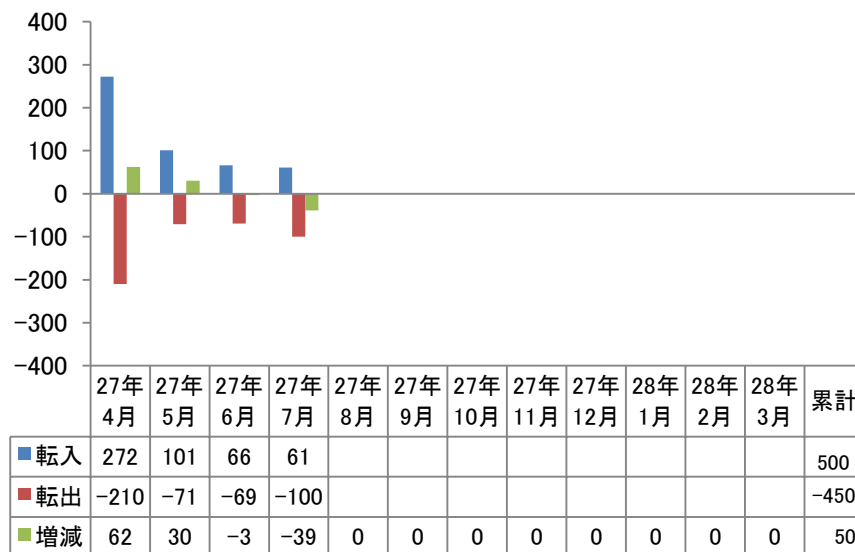

平成27年度	転入	500
	転出	-450
	増減	50

3 問い合わせ先

目的

進捗
状況

問い合
わせ

分類	項目	問い合わせ先	
全体		復興推進本部事務局	0193-22-2111(内線119)
事業費	復旧事業費	総務企画部財政課	0193-22-2111(内線125)
	復興事業費	復興推進本部事務局	0193-22-2111(内線119)
土地利用	土地区画整理事業	復興推進本部都市整備推進室	0193-22-2111(内線209)
	防災集団移転促進事業		0193-22-2111(内線210)
	漁業集落防災機能強化事業		
	用地買収		
	災害廃棄物の処理状況	市民生活部環境課	0193-22-2111(内線221)
インフラ	道路災害復旧事業	建設部建設課	0193-22-2111(内線404)
	橋りょう復旧事業		
	河川改修事業	建設部下水道課	0193-22-1061
	下水道施設災害復旧事業		
	漁港災害復旧事業(市漁港)		
	海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)	産業振興部水産課	0193-22-2111(内線306)
住まい	災害公営住宅整備事業	復興推進本部復興住宅整備室	0193-22-2111(内線433)
	住宅の自力再建(生活再建支援金)	保健福祉部地域福祉課	0193-22-0177
	応急仮設住宅入居戸数の推移	復興推進本部生活支援室	0193-22-8253/8254
産業・雇用	水揚げ高(魚市場)	産業振興部水産課	0193-22-2111(内線306)
	水産加工業企業数		
	農地農業用施設災害復旧事業	産業振興部農林課	0193-22-2111(内線304)
	観光客数	産業振興部観光交流課	0193-22-2111(内線333)
	釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の求人・求職状況	産業振興部商工労政課	0193-22-2111(内線321)
教育	幼稚園・保育園復旧工事	教育委員会総務課	0193-22-8832
	小学校復旧工事		
	児童館・学童育成クラブ復旧事業		
	中学校復旧工事		
その他	ボランティア受入数	社会福祉協議会	0193-24-2511
	人口(月別・社会動態)	市民生活部市民課	0193-22-2111(内線204)
