

かまいし復興レポートVol.40

釜石市

平成29年8月1日

目次

1 「かまいし復興レポート」について

2 復旧・復興の進捗状況

2-1 土地利用

2-2 住まい

2-3 インフラ

2-4 産業・雇用

2-5 教育

2-6 その他

2-7 完了項目

3 問い合わせ先

1 「かまいし復興レポート」について


□目的

- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

□公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回(Vol.40)の数値は平成29年7月31日時点
- 括弧内は前回数値(平成29年5月31日時点)からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする
-平成29年8月1日改定


各地区の主な事業種別

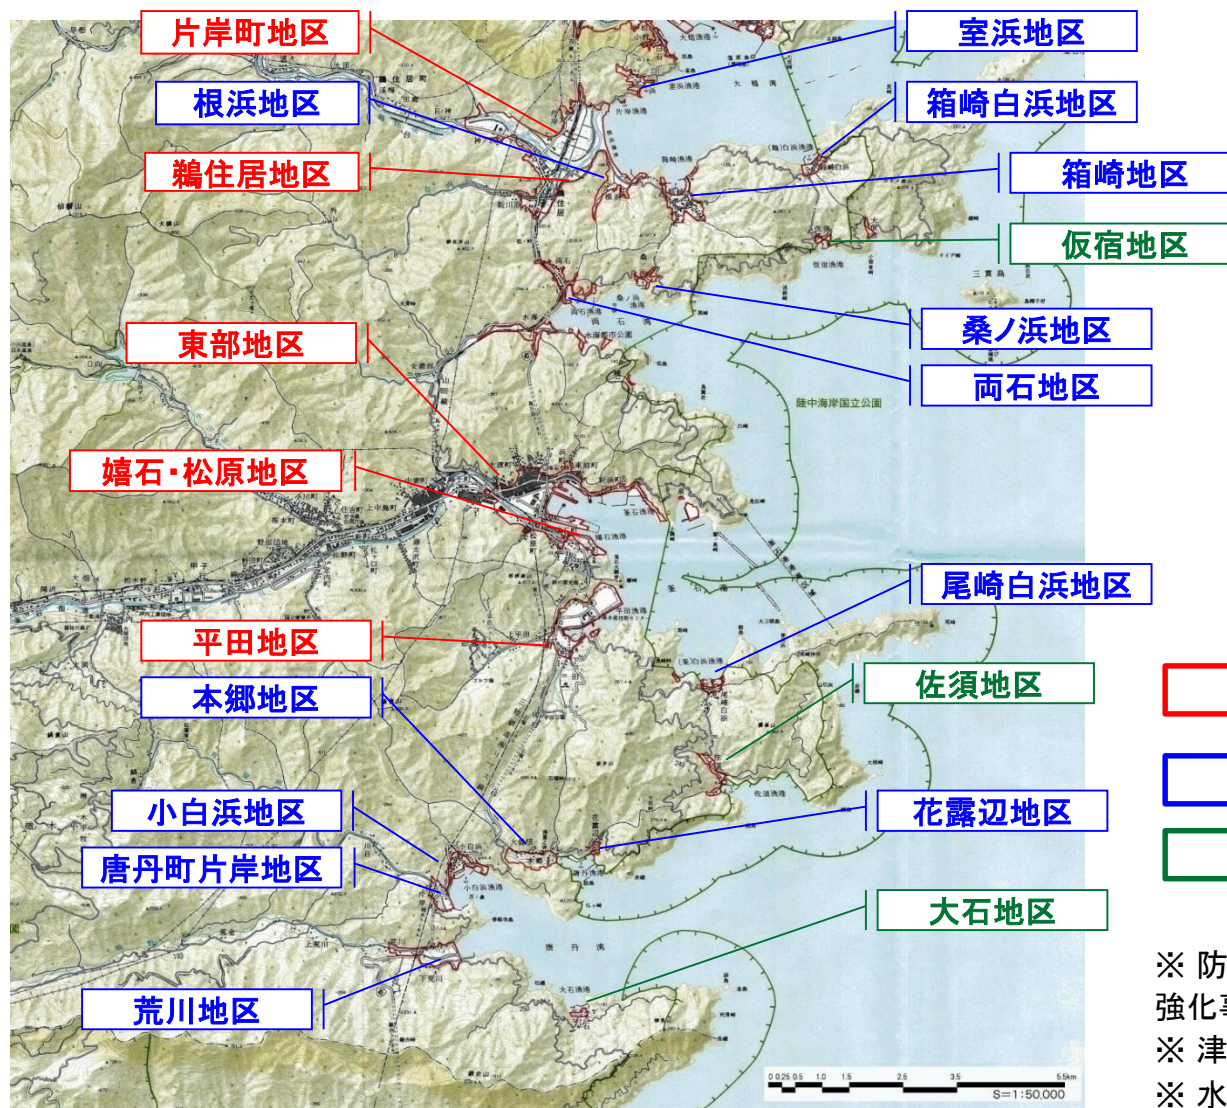

- 土地区画整理事業、
津波復興拠点整備事業
- 防災集団移転促進事業
- 漁業集落防災機能強化事業

※ 防災集団移転促進事業には漁業集落防災機能強化事業を合わせて実施する地区を含む
 ※ 津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居地区のみ
 ※ 水海地区は都市公園事業のみ


土地区画整理事業の進捗

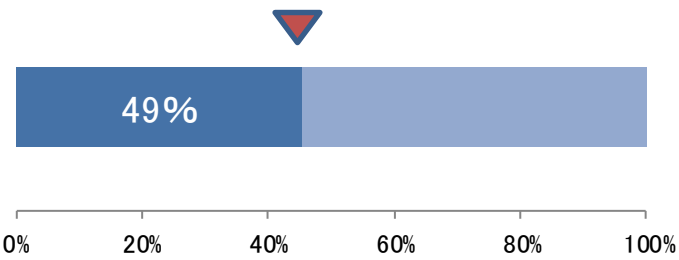

分子	整備完了区画数	522
分母	全体整備予定区画数	1,057

「土地区画整理事業」とは？

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするために、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集約化を行う

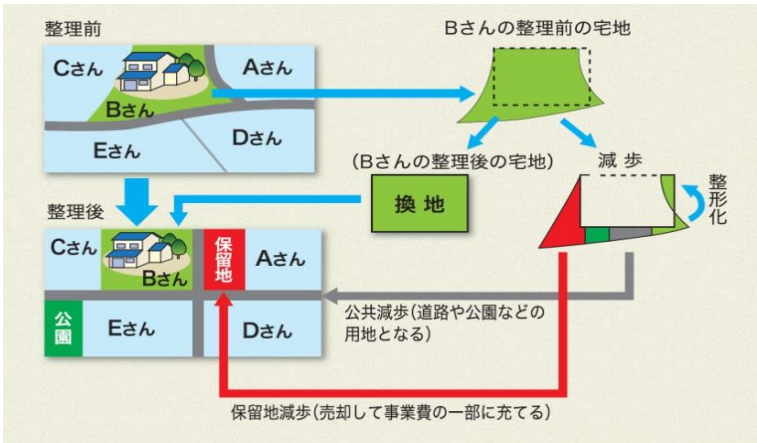


なお、釜石市の区画整理事業においては、保留地減歩は行いません。

スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年5月～ 平成25年3月
都市計画決定	平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
事業計画認可	平成25年3月
換地設計	平成25年3月～
審議会選挙等	平成25年4月～
仮換地指定	平成25年度下期
建物等の移転・工事	平成26年度下期～ 平成30年3月
換地処分	平成30年度

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


防災集団移転促進事業の進捗

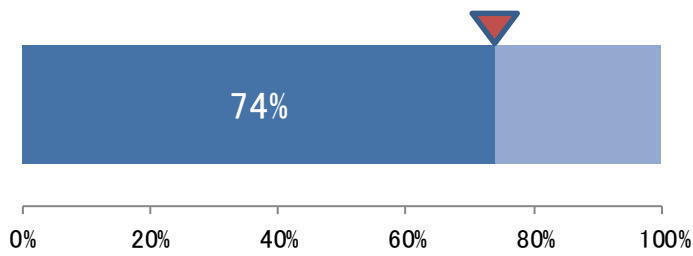

分子	整備完了区画数	102
分母	全体整備予定区画数	137

「防災集団移転促進事業」とは？

- ・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
- ・移転元の土地は住宅地としては利用不可

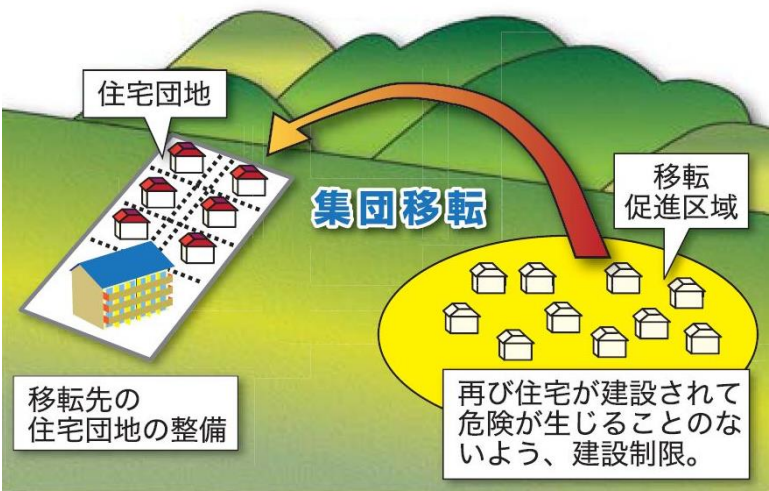


スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
防災集団移転促進事業大臣同意	平成24年6月 1地区 平成24年9月 7地区 平成24年10月 3地区
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年5月～


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

漁業集落防災機能強化事業の進捗

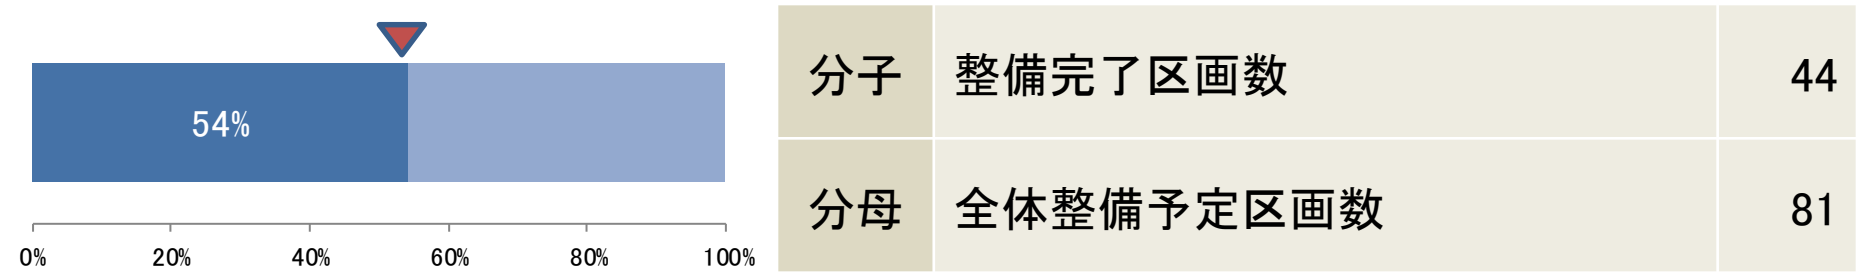

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

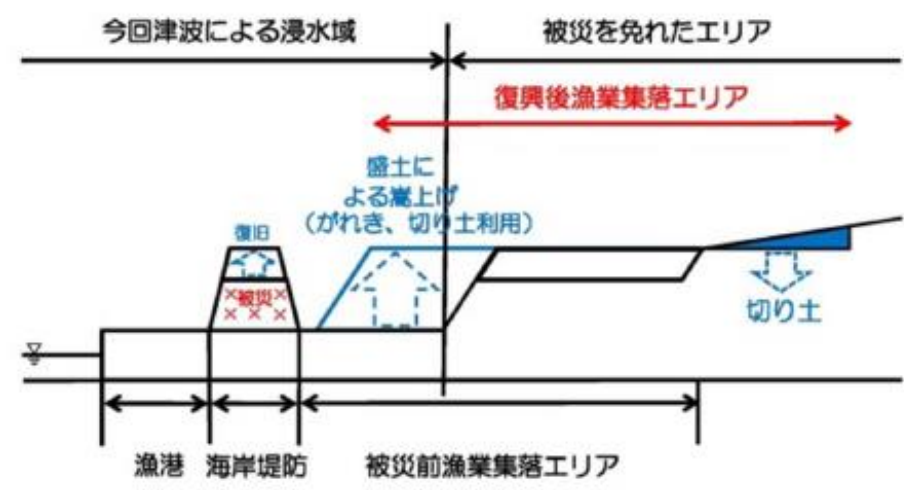

スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


2-1 土地利用(5)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

用地買収の進捗



分子 買収面積

932,696
(0)

分母 買収予定面積

1,037,240
(0)

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位: m²


2-2 住まい(1)

目的

進捗
状況

問い合
わせ

復興公営住宅事業の進捗

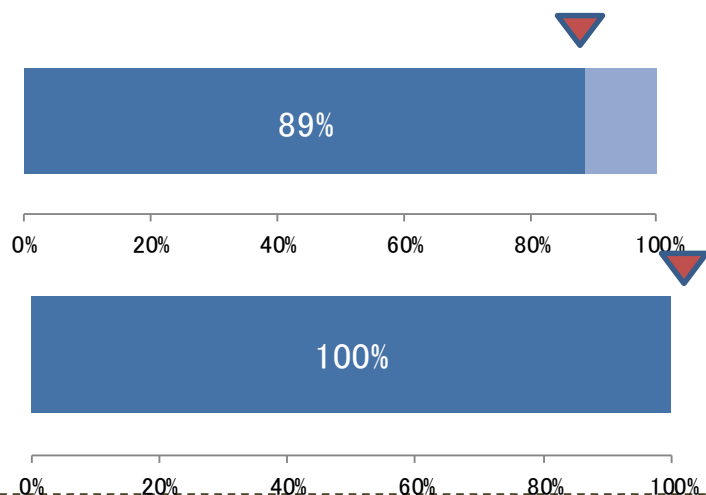

分子 建設済みの戸数

1,165
(+106)

分母 計画戸数(予定)

1,316
(0)


分子 工事発注済みの戸数

1,316
(+31)

分母 計画戸数(予定)

1,316
(0)


住宅の自力再建の状況(全体)

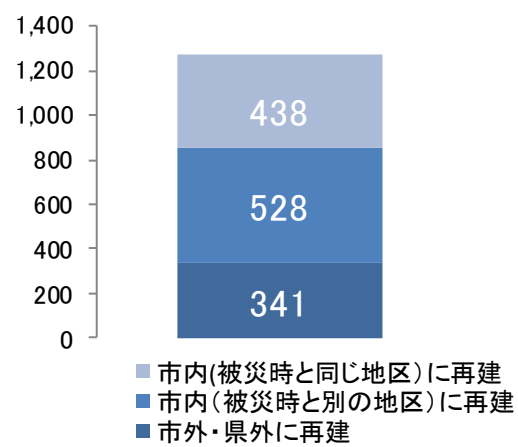


再建済み世帯数	1,307(+34)
市内(被災時と同じ地区)に再建	438(+21)
市内(被災時と別の地区)に再建	528(+8)
市外・県外に再建	341(+5)

※生活再建支援金の「加算支援金(建設・購入)」を申請した世帯数

住宅の自力再建の状況(地区別)

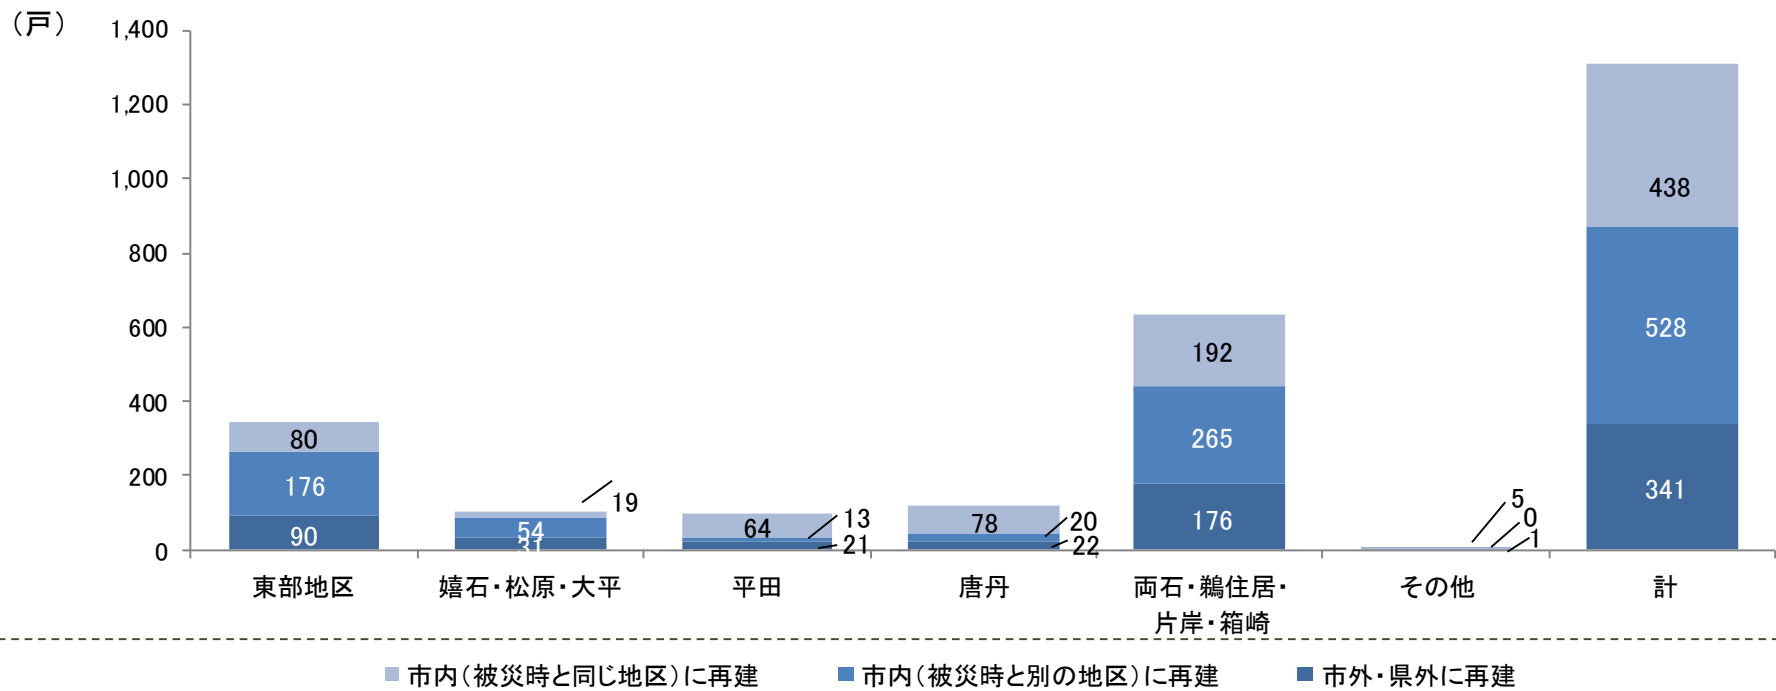

応急仮設住宅入居戸数の推移

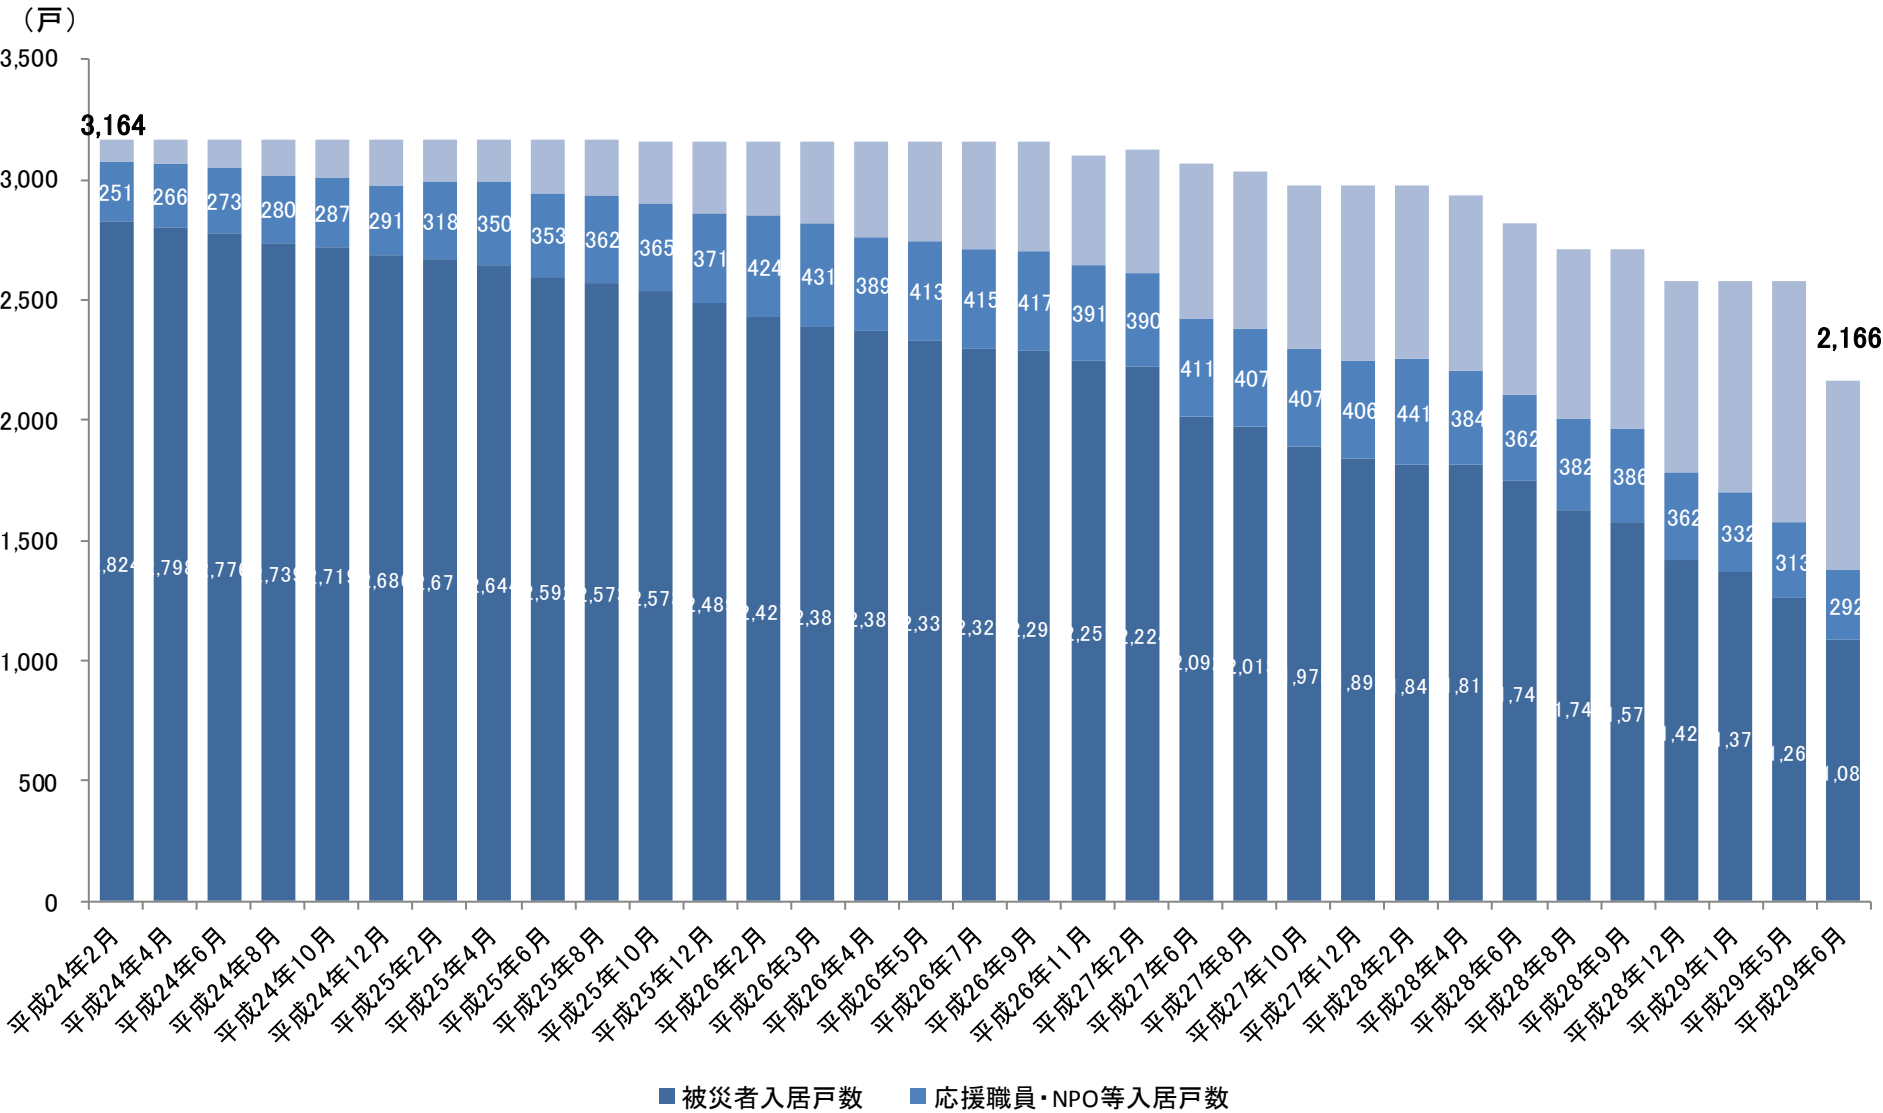


応急仮設住宅等の推移

- ・平成26年11月 鵜住居地区仮設団地一部廃止(28戸)
- ・平成27年4月 小佐野地区仮設団地一部廃止(54戸)
- ・平成27年7月 鵜住居地区仮設団地一部廃止(14戸)
- ・平成27年8月 鵜住居地区仮設団地一部廃止(24戸)
- ・平成27年9月 平田・唐丹地区仮設団地一部廃止(57戸)
- ・平成28年3月 鵜住居地区仮設団地一部廃止(41戸)
- ・平成28年5月 中妻地区仮設団地一部廃止(118戸)
- ・平成28年6月 甲子地区仮設B一部廃止(53戸)
- ・平成28年6月 唐丹町川目地区仮設D一部廃止(6戸)
- ・平成28年9月 大只越町仮設一部廃止(12戸)
- ・平成28年10月 甲子町第10仮設一部廃止(41戸)
- ・平成28年10月 鵜住居第3仮設廃止(12戸)
- ・平成28年12月 栗林第2仮設AB 廃止(66戸)
- ・平成29年2月 箱崎町第3仮設団地 一部廃止(1棟6戸)
- ・平成29年8月 甲子町A仮設 一部廃止(28戸)
- ・平成29年8月 甲子町第4仮設 一部廃止(66戸)
- ・平成29年8月 甲子町第6仮設 一部廃止(138戸)
- ・平成29年8月 甲子町第9仮設 一部廃止(120戸)
- ・平成29年8月 鵜住居町第7仮設 一部廃止(16戸)
- ・平成29年8月 平田第5仮設 一部廃止(42戸)

漁港災害復旧事業(市漁港)の進捗


単位:箇所

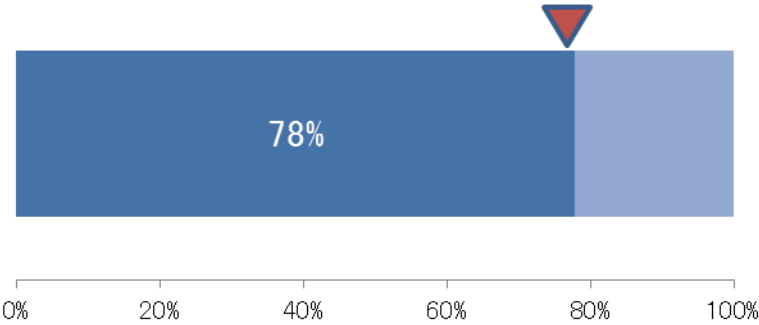

分子	復旧完了漁港数	7
分母	復旧予定漁港数	9

海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)の進捗


単位:箇所

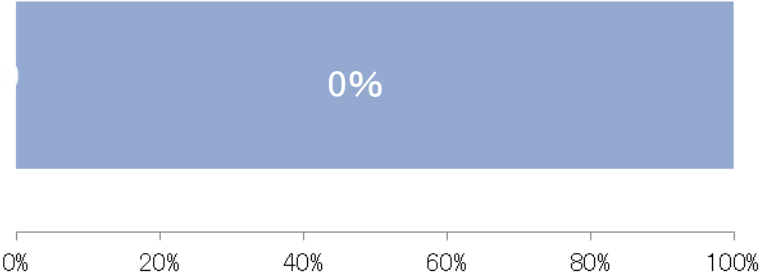

分子	復旧完了防潮堤数	0
分母	復旧予定防潮堤数	7


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

水揚げ高(魚市場)

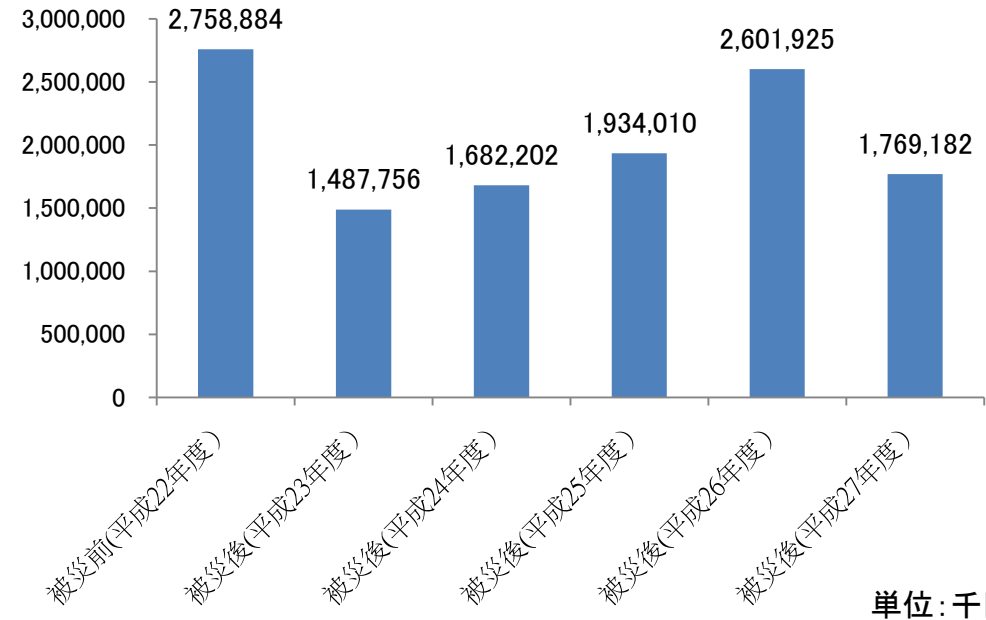

被災前(平成22年度)水揚げ高	2,758,884
被災後(平成23年度)水揚げ高	1,487,756
被災後(平成24年度)水揚げ高	1,682,202
被災後(平成25年度)水揚げ高	1,934,010
被災後(平成26年度)水揚げ高	2,601,925
被災後(平成27年度)水揚げ高	1,769,182


水産加工業企業数

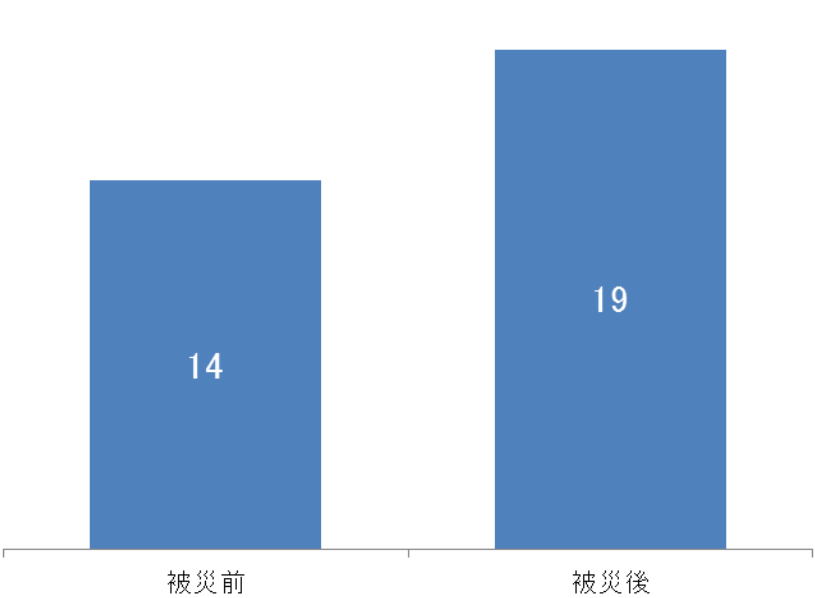


震災前の企業数	14
再開した企業数(新規4を含む)	19

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

農地農業用施設災害復旧事業の進捗

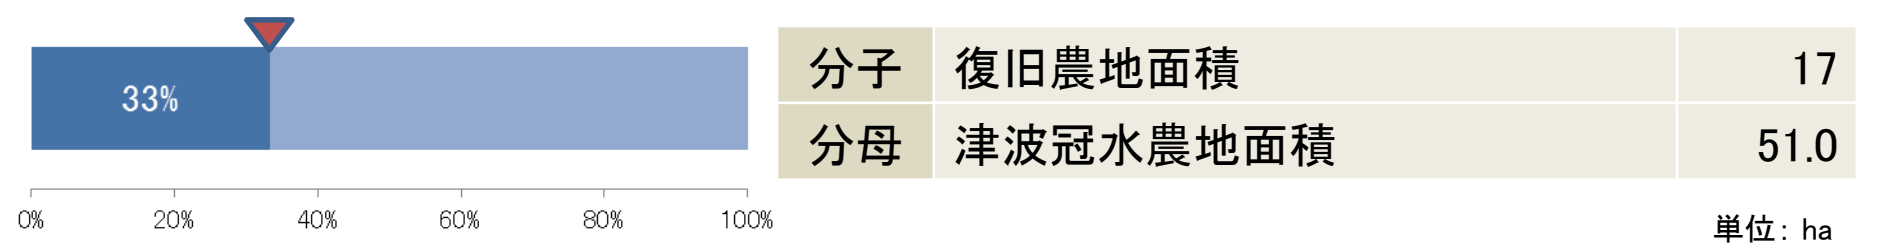


釜石市への観光客数

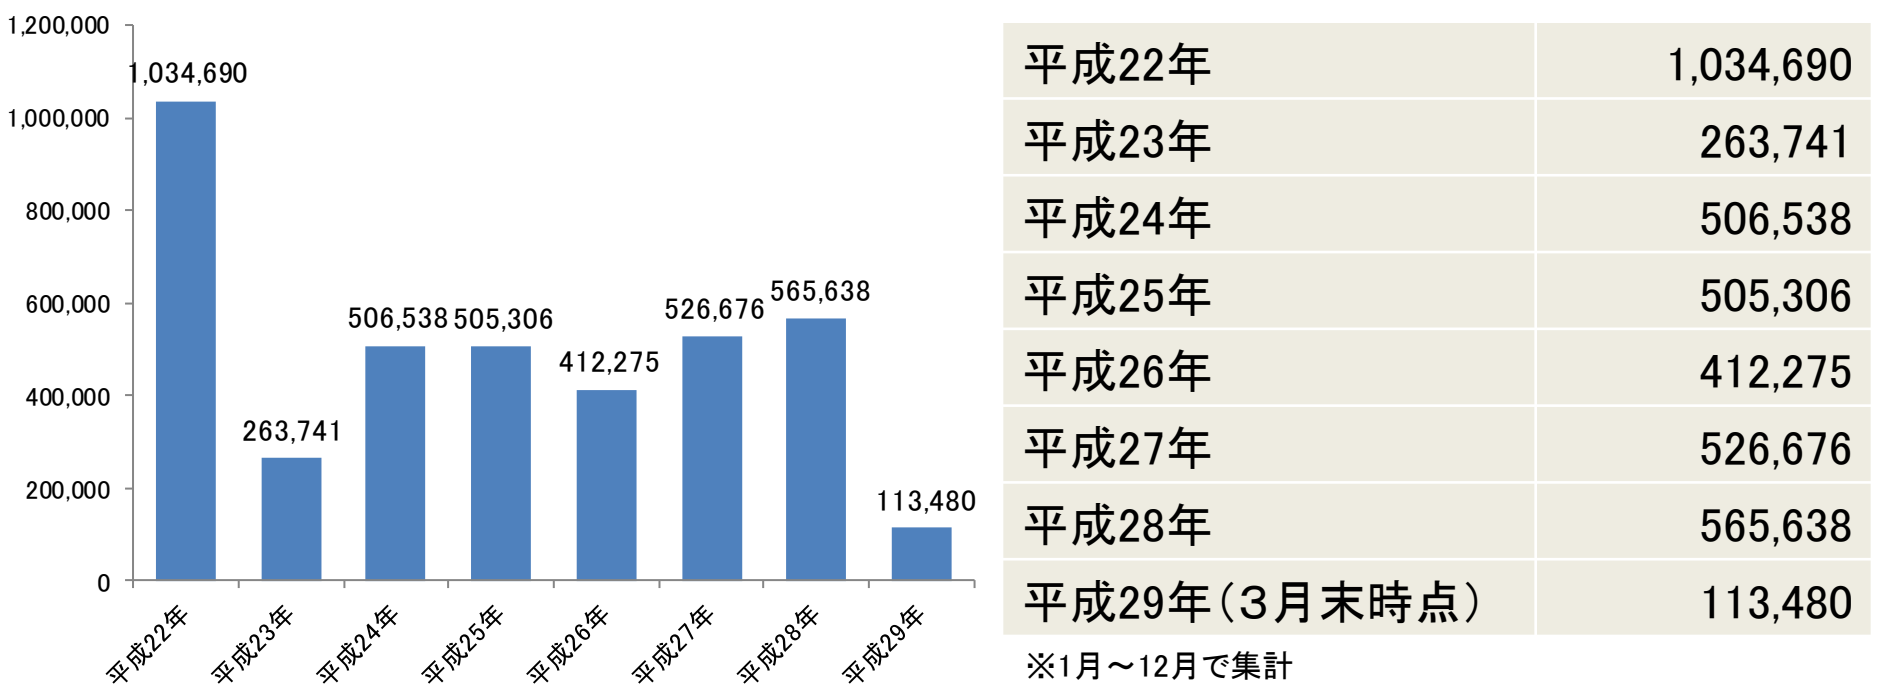


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

釜石港港湾取扱貨物量

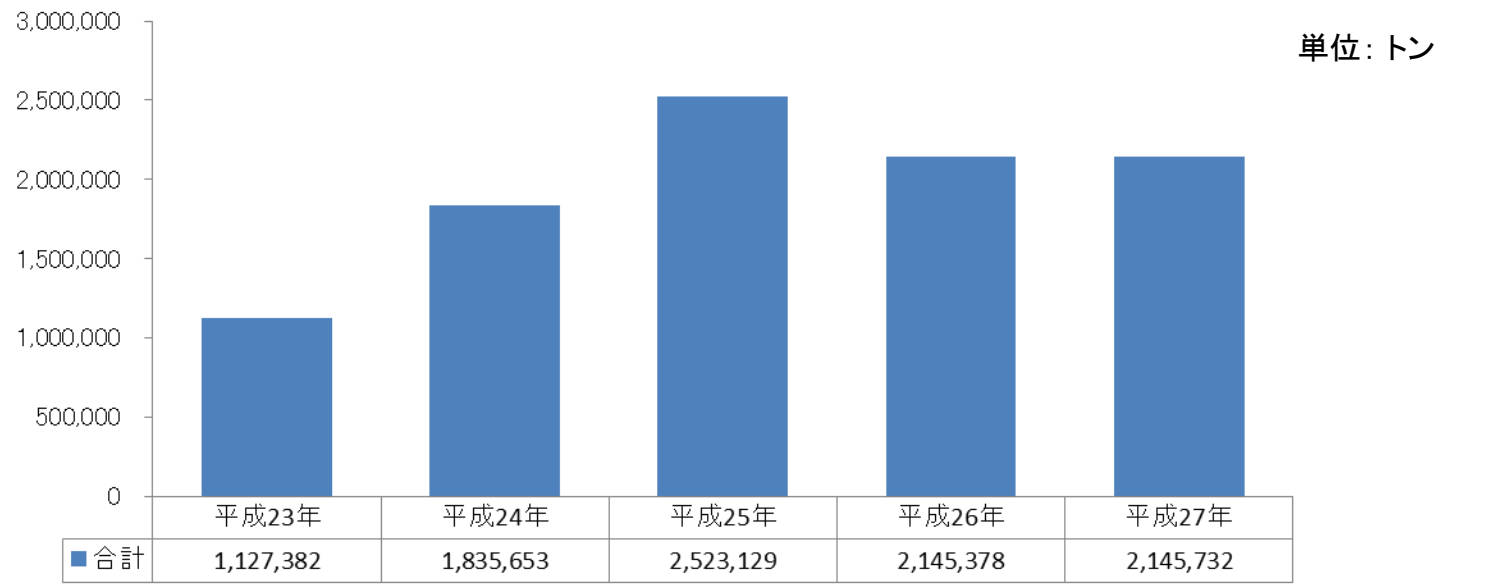


製造品出荷額等

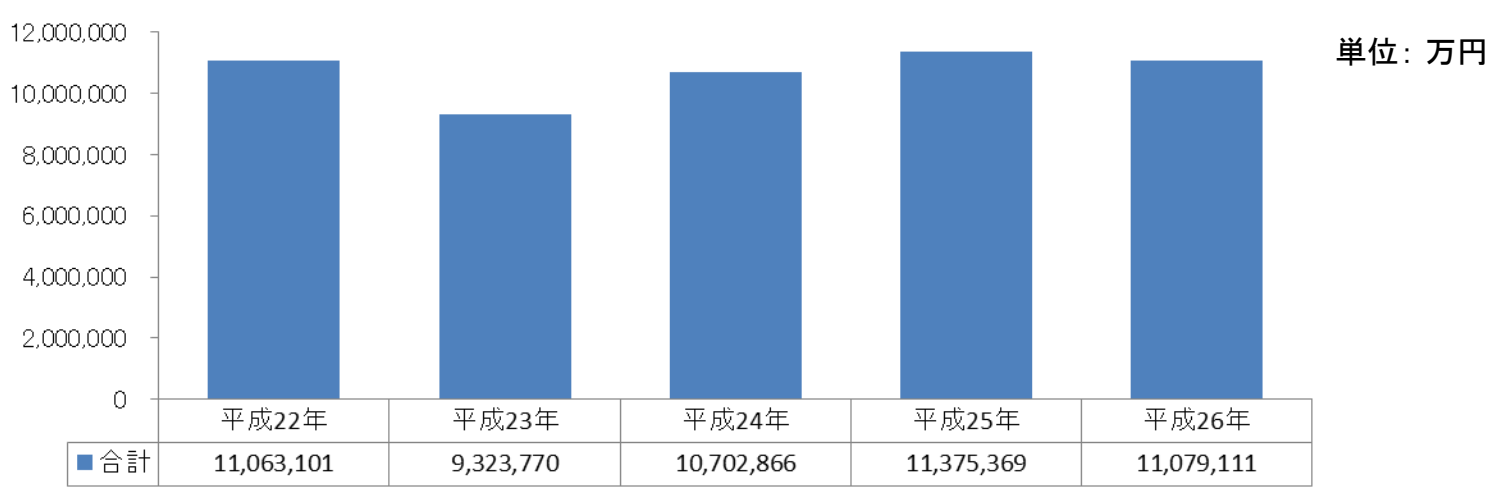

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別有効求人倍率

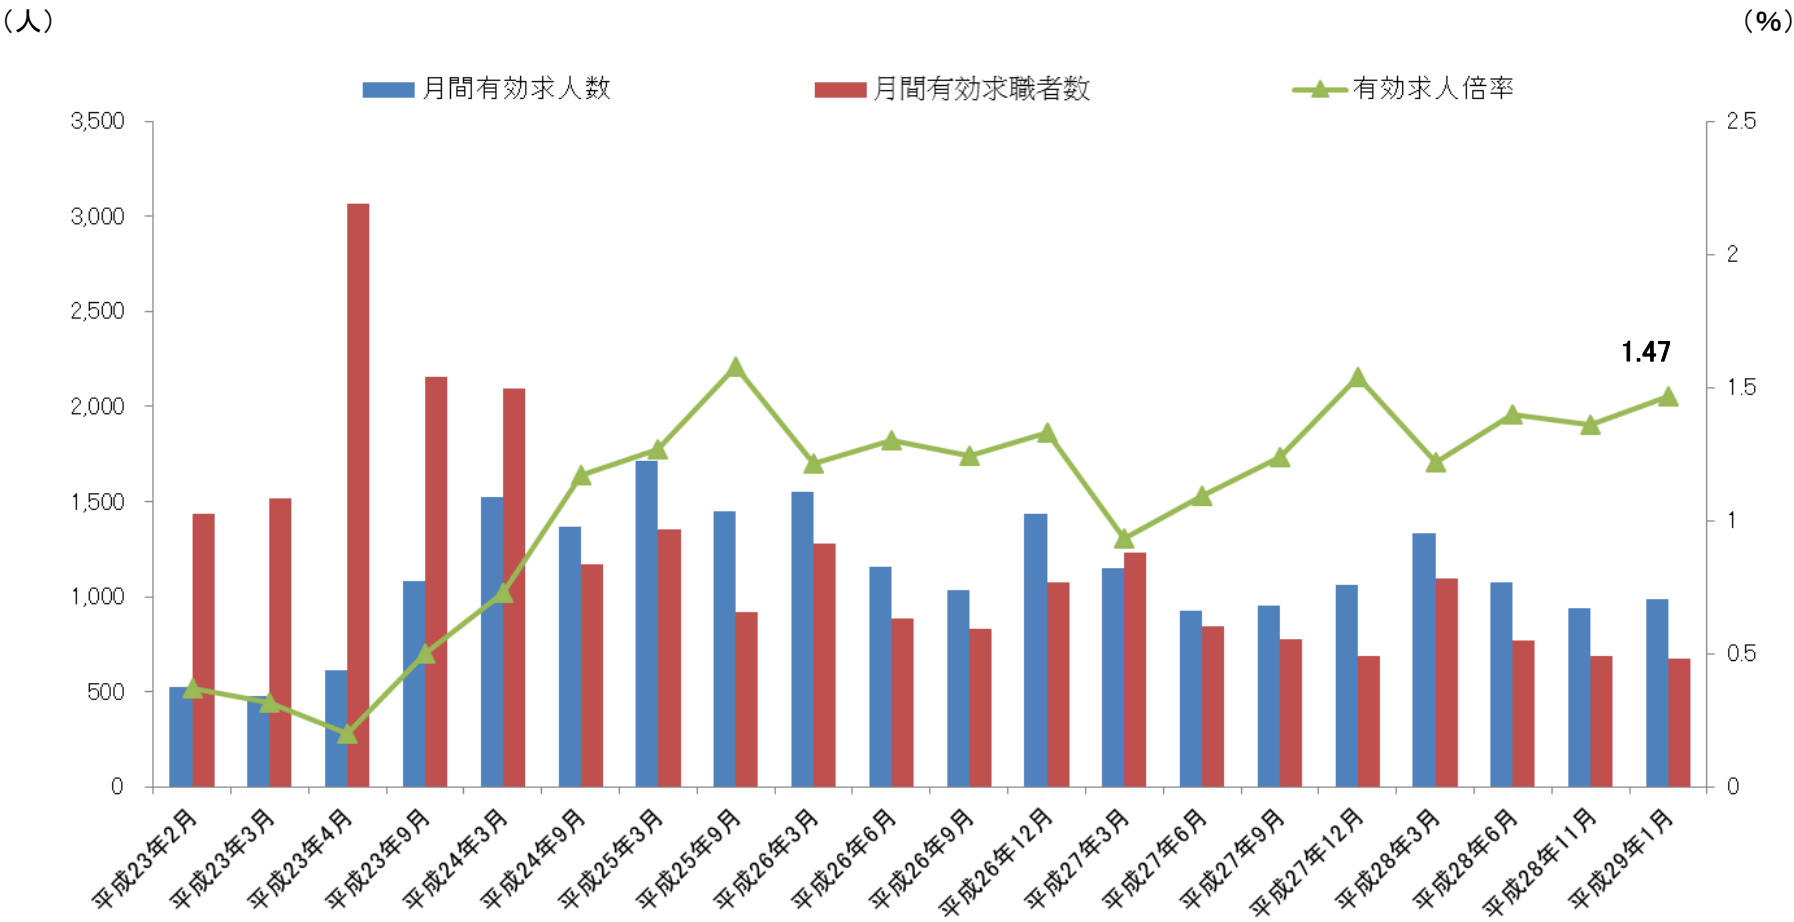


出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
有効求職者数 : 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
有効求人倍率 : 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

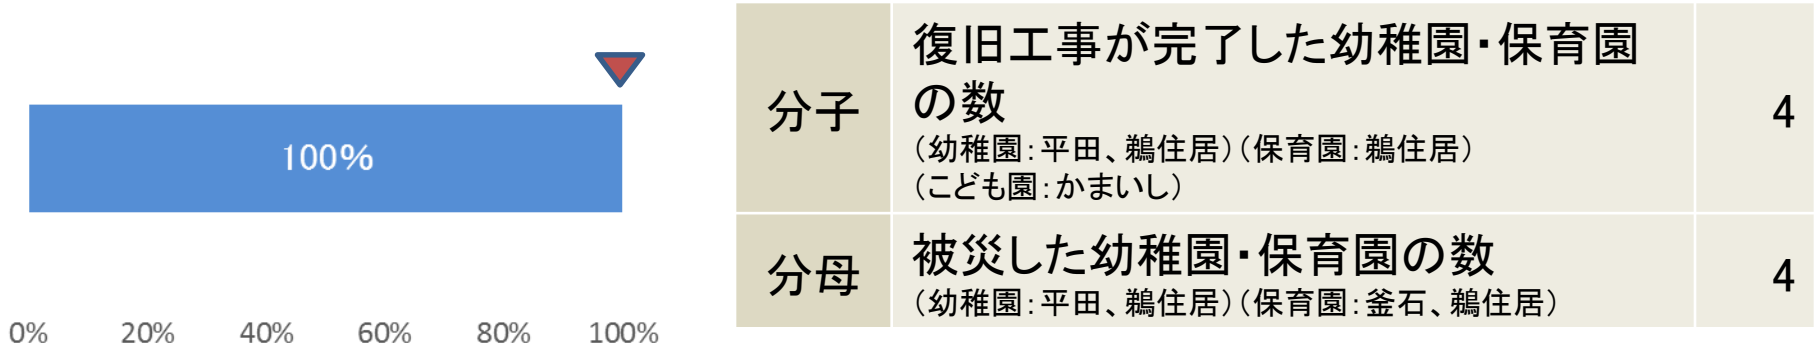


小学校復旧工事の進捗

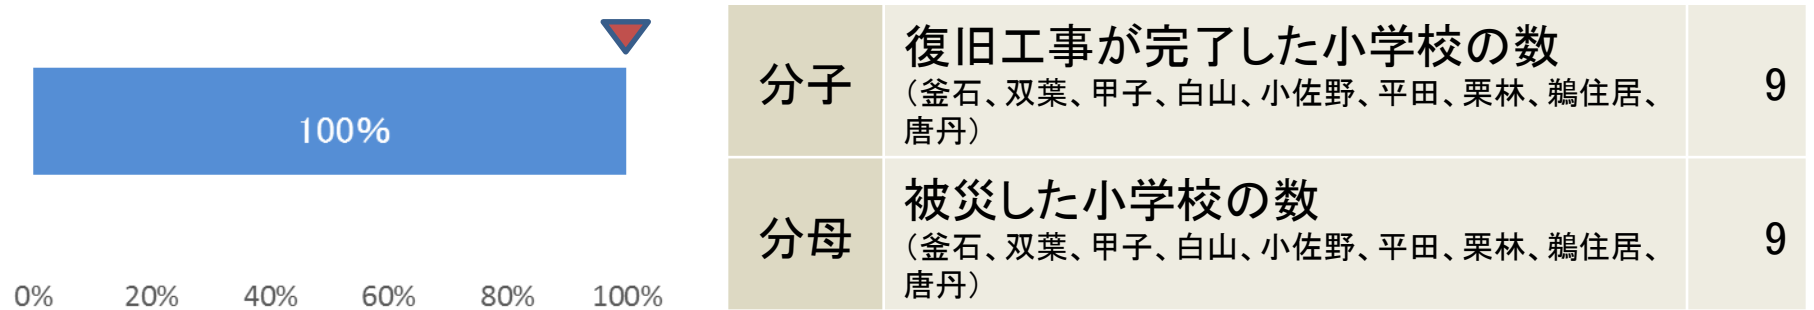

※ 唐丹小学校は、一部において残工事有。


児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

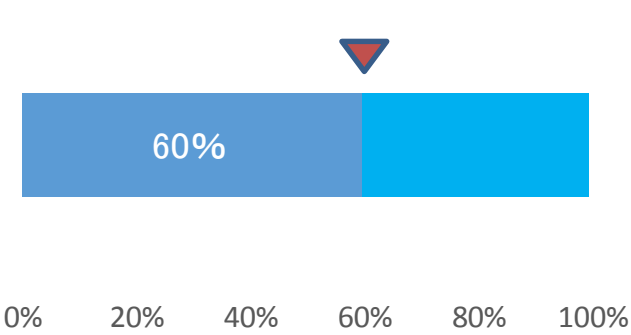

分子	復旧工事が完了した児童館・学童育成クラブの数 (児童館: 鶴住居)(学童育成クラブ: 釜石、小佐野)	3
分母	被災した児童館・学童育成クラブの数 (釜石、小佐野、鶴住居、唐丹、箱崎)	5

※唐丹児童館・学童育成クラブは仮施設設で運営中


中学校復旧工事の進捗

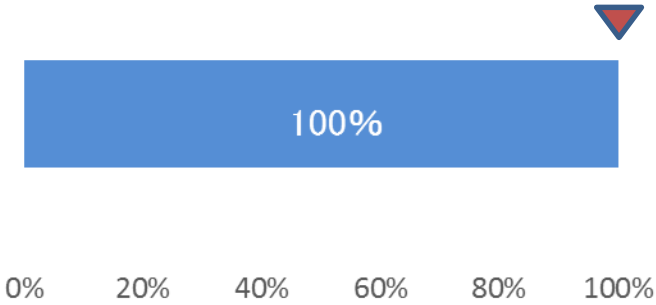

分子	復旧工事が完了した中学校の数 (釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹)	5
分母	被災した中学校の数 (釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹)	5


※ 唐丹中学校は、一部において残工事有。

ボランティア受け入れの人数

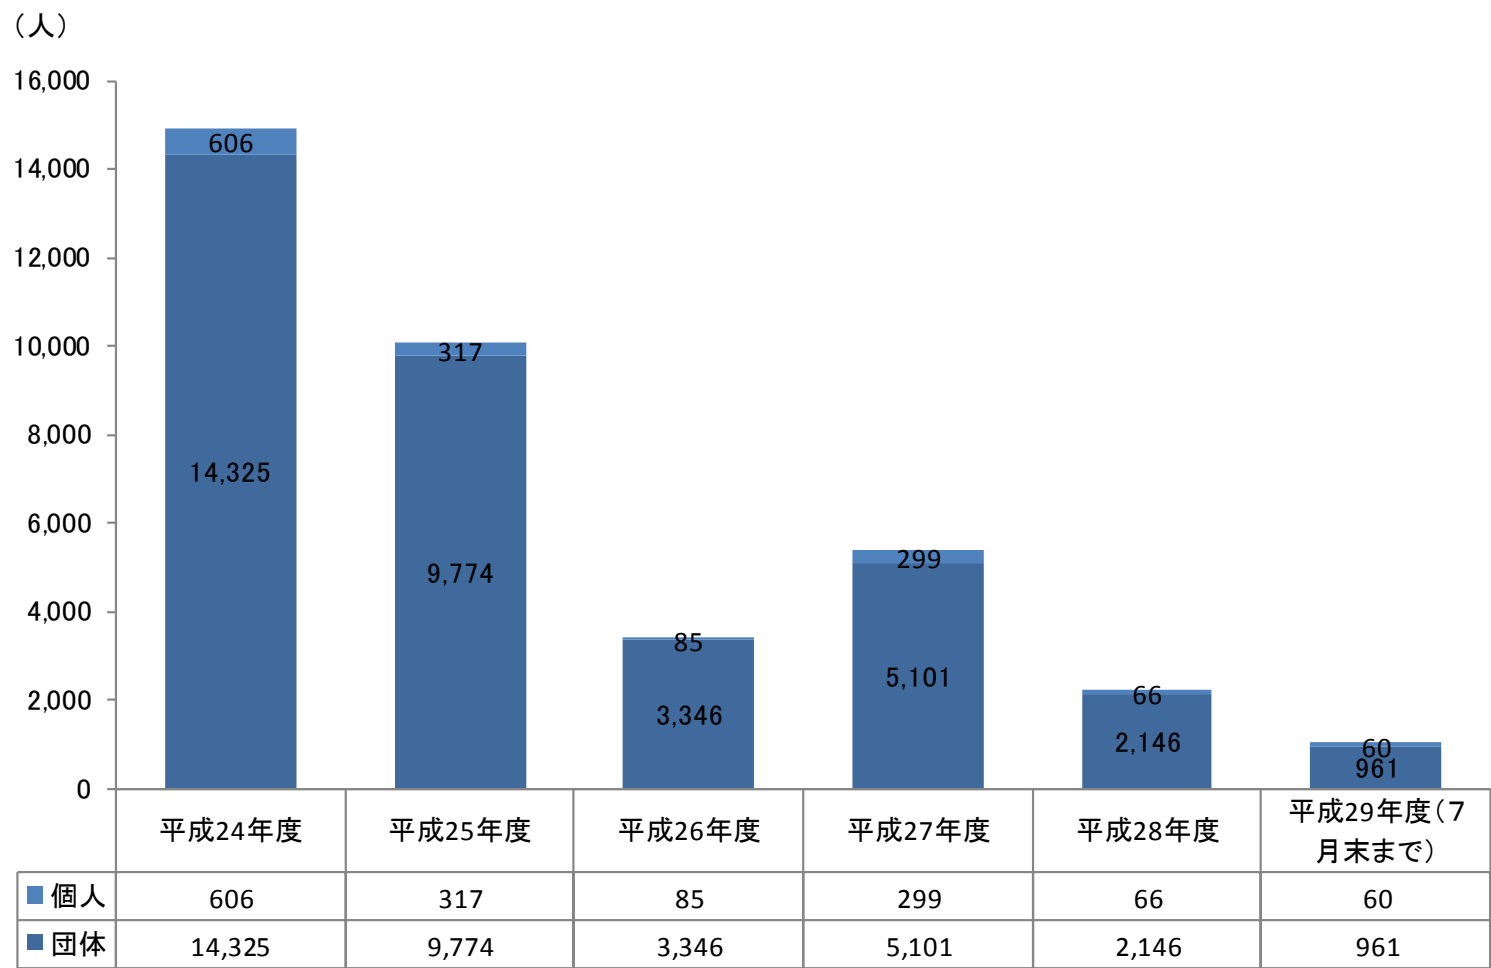


※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

人口(月別)

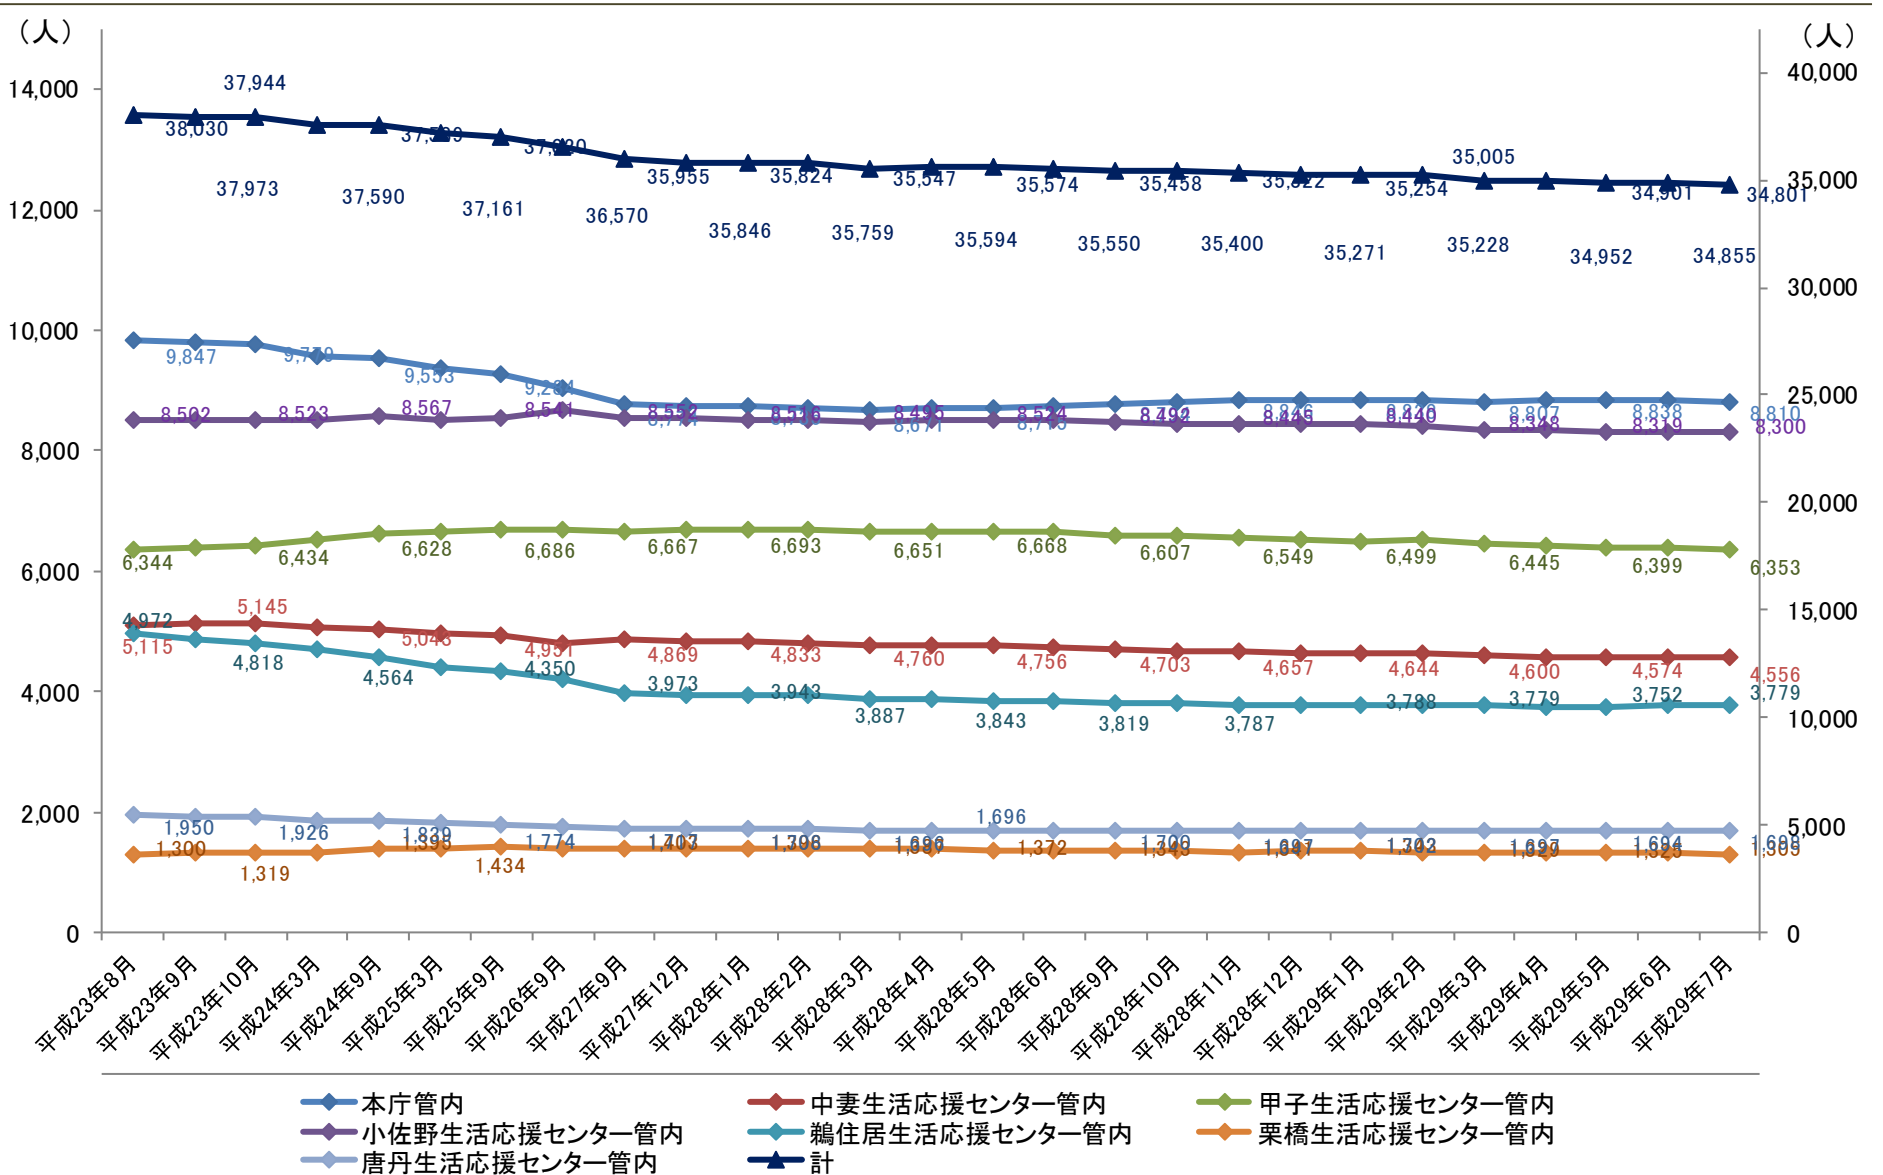


人口(社会動態)

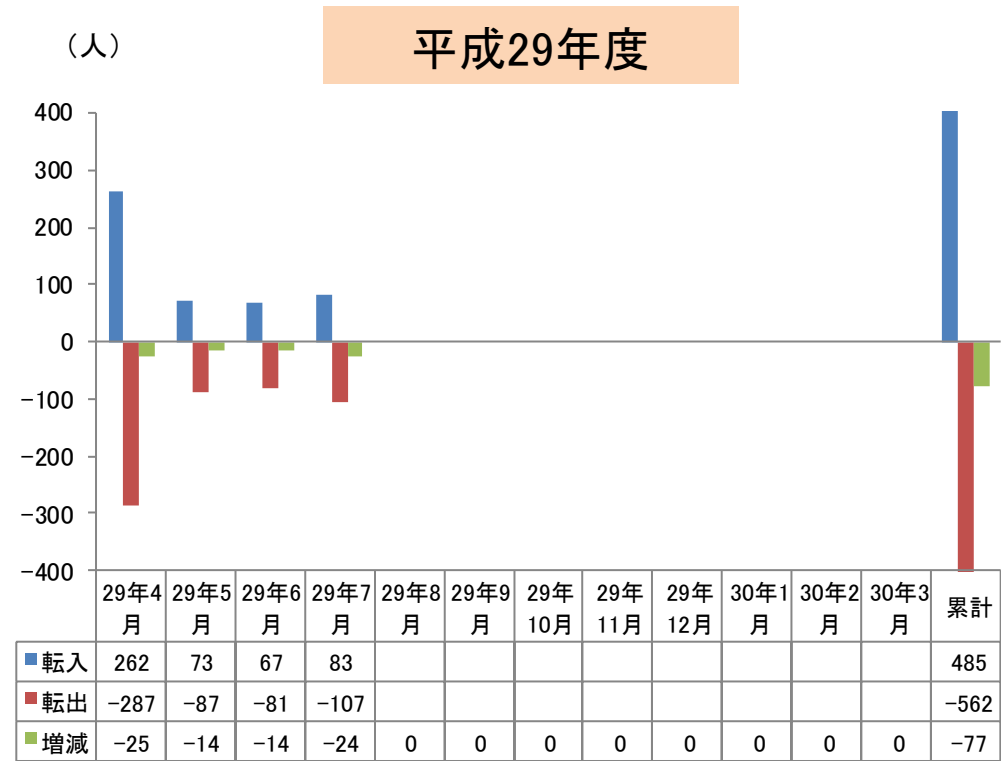

	転入	転出	増減
平成24年度	1,292	-1,347	-55
平成25年度	1,252	-1,443	-191
平成26年度	1,270	-1,344	-74
平成27年度	1,205	-1,311	-106
平成28年度	1,155	-1,274	-119
平成29年度(7月末まで)	485	-562	-77
計	6,659	-7,281	-622

被災地派遣職員の数

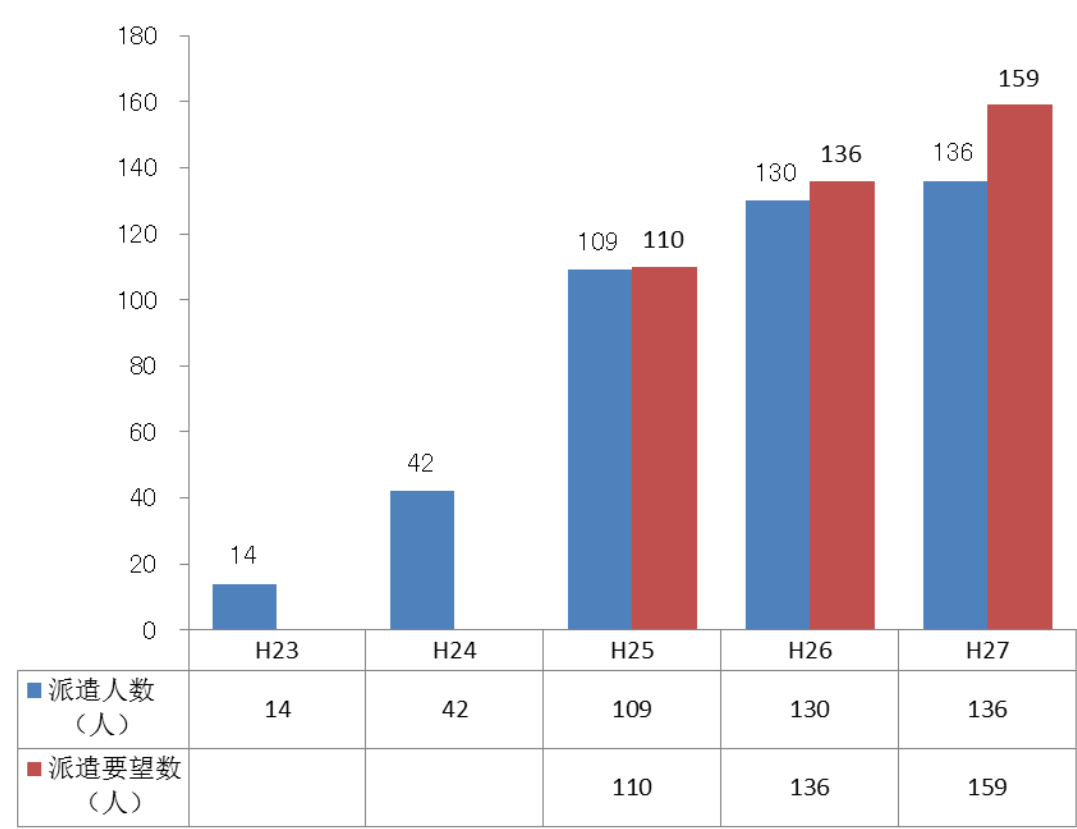

充足率	
平成23年度	—
平成24年度	—
平成25年度	99%
平成26年度	96%
平成27年度	86%

項目	指標	数値	単位
土地利用			
災害廃棄物処理の完了数	完了総量	946	千t
インフラ			
道路災害復旧事業の進捗	工事が完了した市道の箇所数	65	箇所
橋りょう復旧事業の進捗	工事が完了した橋りょうの箇所数	9	箇所
河川改修事業の進捗	工事が完了した箇所数	15	箇所
下水道施設災害復旧事業の進捗	復旧工事が完了した施設箇所(管路施設)	8	箇所

分類	項目	問い合わせ先	
2-1 土地利用	全体	復興推進本部事務局	0193-27-8479
	土地区画整理事業	復興推進本部都市整備推進室	0193-27-8437
	防災集団移転促進事業		
	漁業集落防災機能強化事業 用地買収		
2-2 住まい	復興公営住宅整備事業	復興推進本部復興住宅整備室	0193-27-7379
	住宅の自力再建(生活再建支援金)	保健福祉部地域福祉課	0193-22-0177
	応急仮設住宅入居戸数	復興推進本部生活支援室	0193-22-8253/8254
2-3 インフラ	漁港災害復旧事業(市漁港)	産業振興部水産課	0193-27-8427
	海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)		
2-4 産業・雇用	水揚げ高(魚市場)	産業振興部水産課	
	水産加工業企業数		
	農地農業用施設災害復旧事業	産業振興部農林課	0193-27-8426
	観光客数	産業振興部観光交流課	0193-27-8421
	釜石港港湾取扱貨物量	産業振興部港湾振興課	0193-27-8425
	製造品出荷額等	総務企画部総合政策課	0193-27-8413
	月別有効求人倍率	産業振興部商工労政課	0193-27-8421
	幼稚園・保育園復旧工事	教育委員会総務課 保健福祉部子ども課	0193-22-8832 0193-22-5121
	小学校復旧工事		
	児童館・学童育成クラブ復旧事業		
2-6 その他	中学校復旧工事	社会福祉協議会 市民生活部市民課 総務企画部総務課	0193-24-2511 0193-27-8450 0193-27-8411
	ボランティア受入数		
	人口(月別・社会動態)		
	被災地派遣職員の数		
2-7 完了項目	道路災害復旧事業	建設部建設課	0193-27-8430
	橋りょう復旧事業		
	河川改修事業		
	下水道施設災害復旧事業	建設部下水道課	0193-22-1061
