

# かまいし復興レポートVol.54

---

釜石市

令和2年4月1日

# 目次

---

## 1 「かまいし復興レポート」について

## 2 復旧・復興の進捗状況

### 2-1 土地利用

### 2-2 住まい

### 2-3 インフラ

### 2-4 産業・雇用

### 2-5 教育

### 2-6 その他

### 2-7 完了項目

## 3 問い合わせ先

# 1 「かまいし復興レポート」について


## □目的

- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

## □公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回(Vol.54)の数値は令和2年3月31日時点
- 括弧内は前回数値(令和元年12月31日時点)からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする
  - 令和2年4月1日改定

## 各地区の主な事業種別

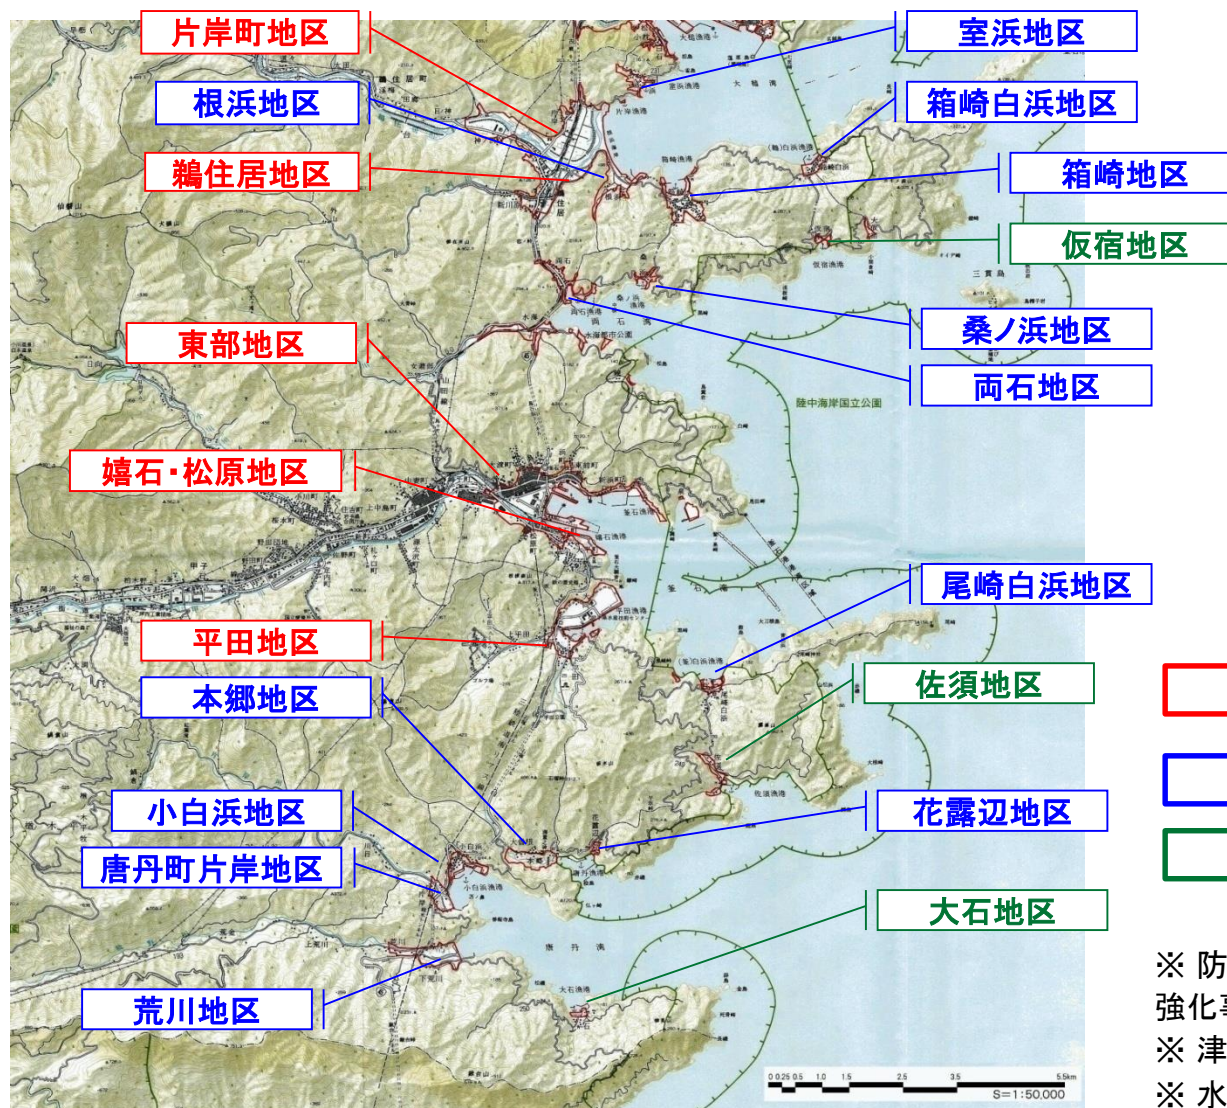

- 土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業
- 防災集団移転促進事業
- 漁業集落防災機能強化事業


※ 防災集団移転促進事業には漁業集落防災機能強化事業を合わせて実施する地区を含む

※ 津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居地区のみ

※ 水海地区は都市公園事業のみ




防災集団移転促進事業の進捗

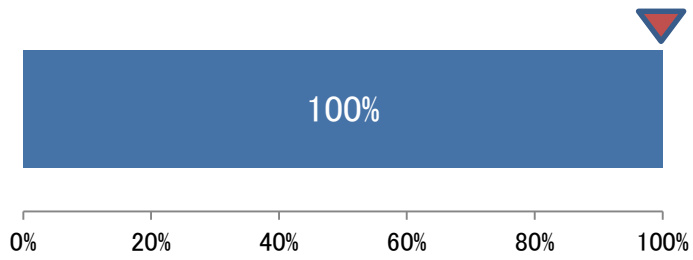

|    |           |     |
|----|-----------|-----|
| 分子 | 整備完了区画数   | 123 |
| 分母 | 全体整備予定区画数 | 123 |

「防災集団移転促進事業」とは？

- ・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
- ・移転元の土地は住宅地としては利用不可

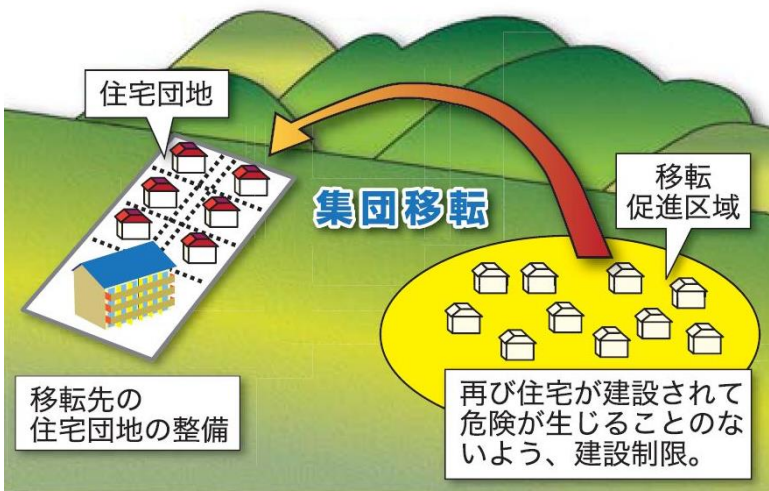

スケジュール(予定)

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 計画策定・合意形成      | 平成23年10月～                                  |
| 調査・測量・設計       | 平成24年4月～<br>平成25年3月                        |
| 防災集団移転促進事業大臣同意 | 平成24年6月 1地区<br>平成24年9月 7地区<br>平成24年10月 3地区 |
| 用地境界確認         | 平成24年10月～<br>平成24年11月                      |
| 地権者連絡会         | 平成24年11月～                                  |
| 不動産鑑定・用地買収     | 平成24年11月～                                  |
| 造成工事・道路工事等     | 平成25年5月～                                   |

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う




漁業集落防災機能強化事業の進捗



「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

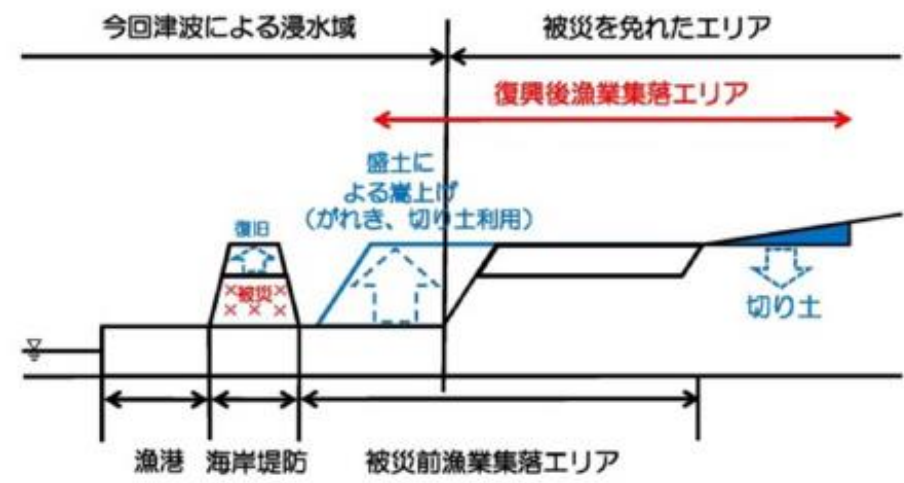

スケジュール

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 計画策定・合意形成  | 平成23年10月～             |
| 調査・測量・設計   | 平成24年4月～<br>平成25年3月   |
| 用地境界確認     | 平成24年10月～<br>平成24年11月 |
| 地権者連絡会     | 平成24年11月～             |
| 不動産鑑定・用地買収 | 平成24年11月～             |
| 造成工事・道路工事等 | 平成25年度～               |

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


## 2-1 土地利用(5)

目的

進捗  
状況

問い合  
わせ

### 用地買収の進捗



分子 買収面積

1,106,027  
(+3,428)

分母 買収予定面積

1,111,710  
(-7,891)

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位: m<sup>2</sup>


## 2-2 住まい(1)

目的

進捗  
状況

問い合  
わせ

### 復興公営住宅事業の進捗

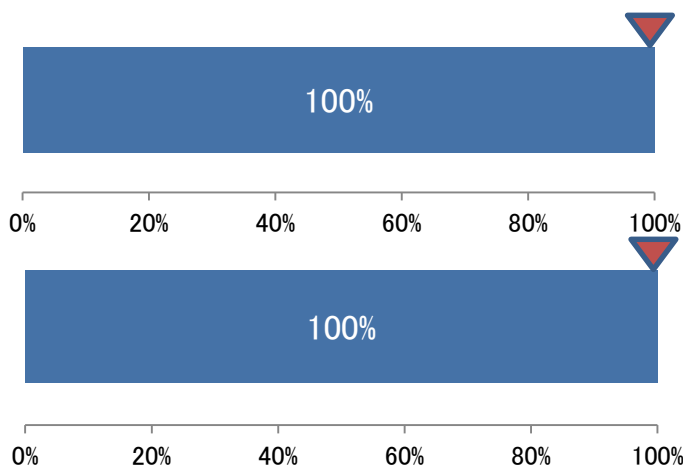

分子 建設済みの戸数

1,316  
(0)

分母 計画戸数(予定)

1,316  
(0)

分子 工事発注済みの戸数


1,316  
(0)

分母 計画戸数(予定)


1,316  
(0)




住宅の自力再建の状況(全体)

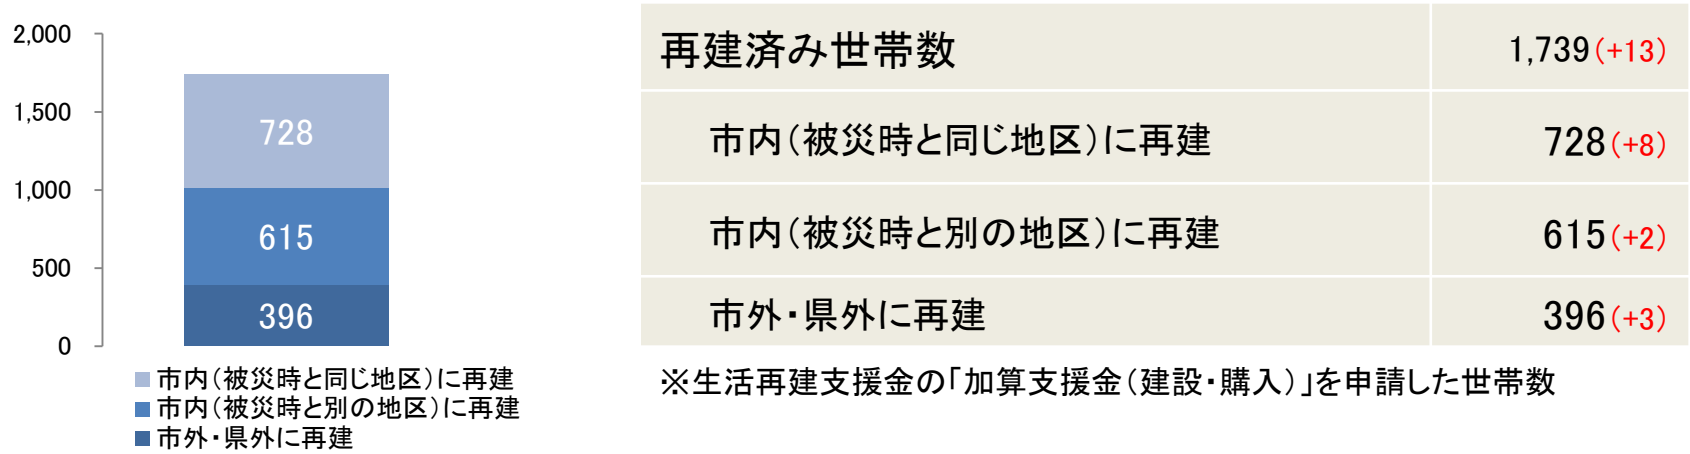

住宅の自力再建の状況(地区別)

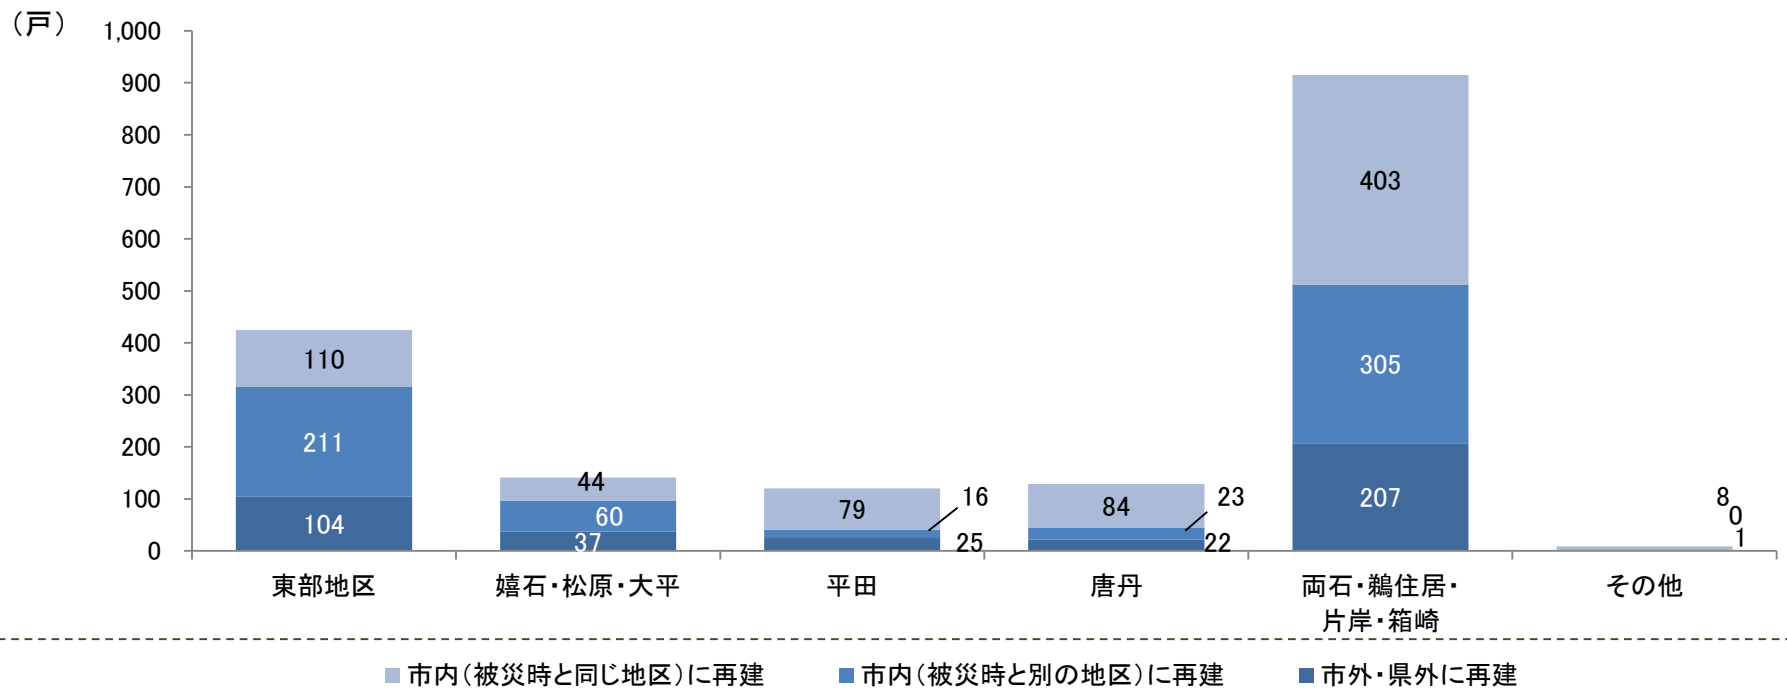

応急仮設住宅入居戸数の推移

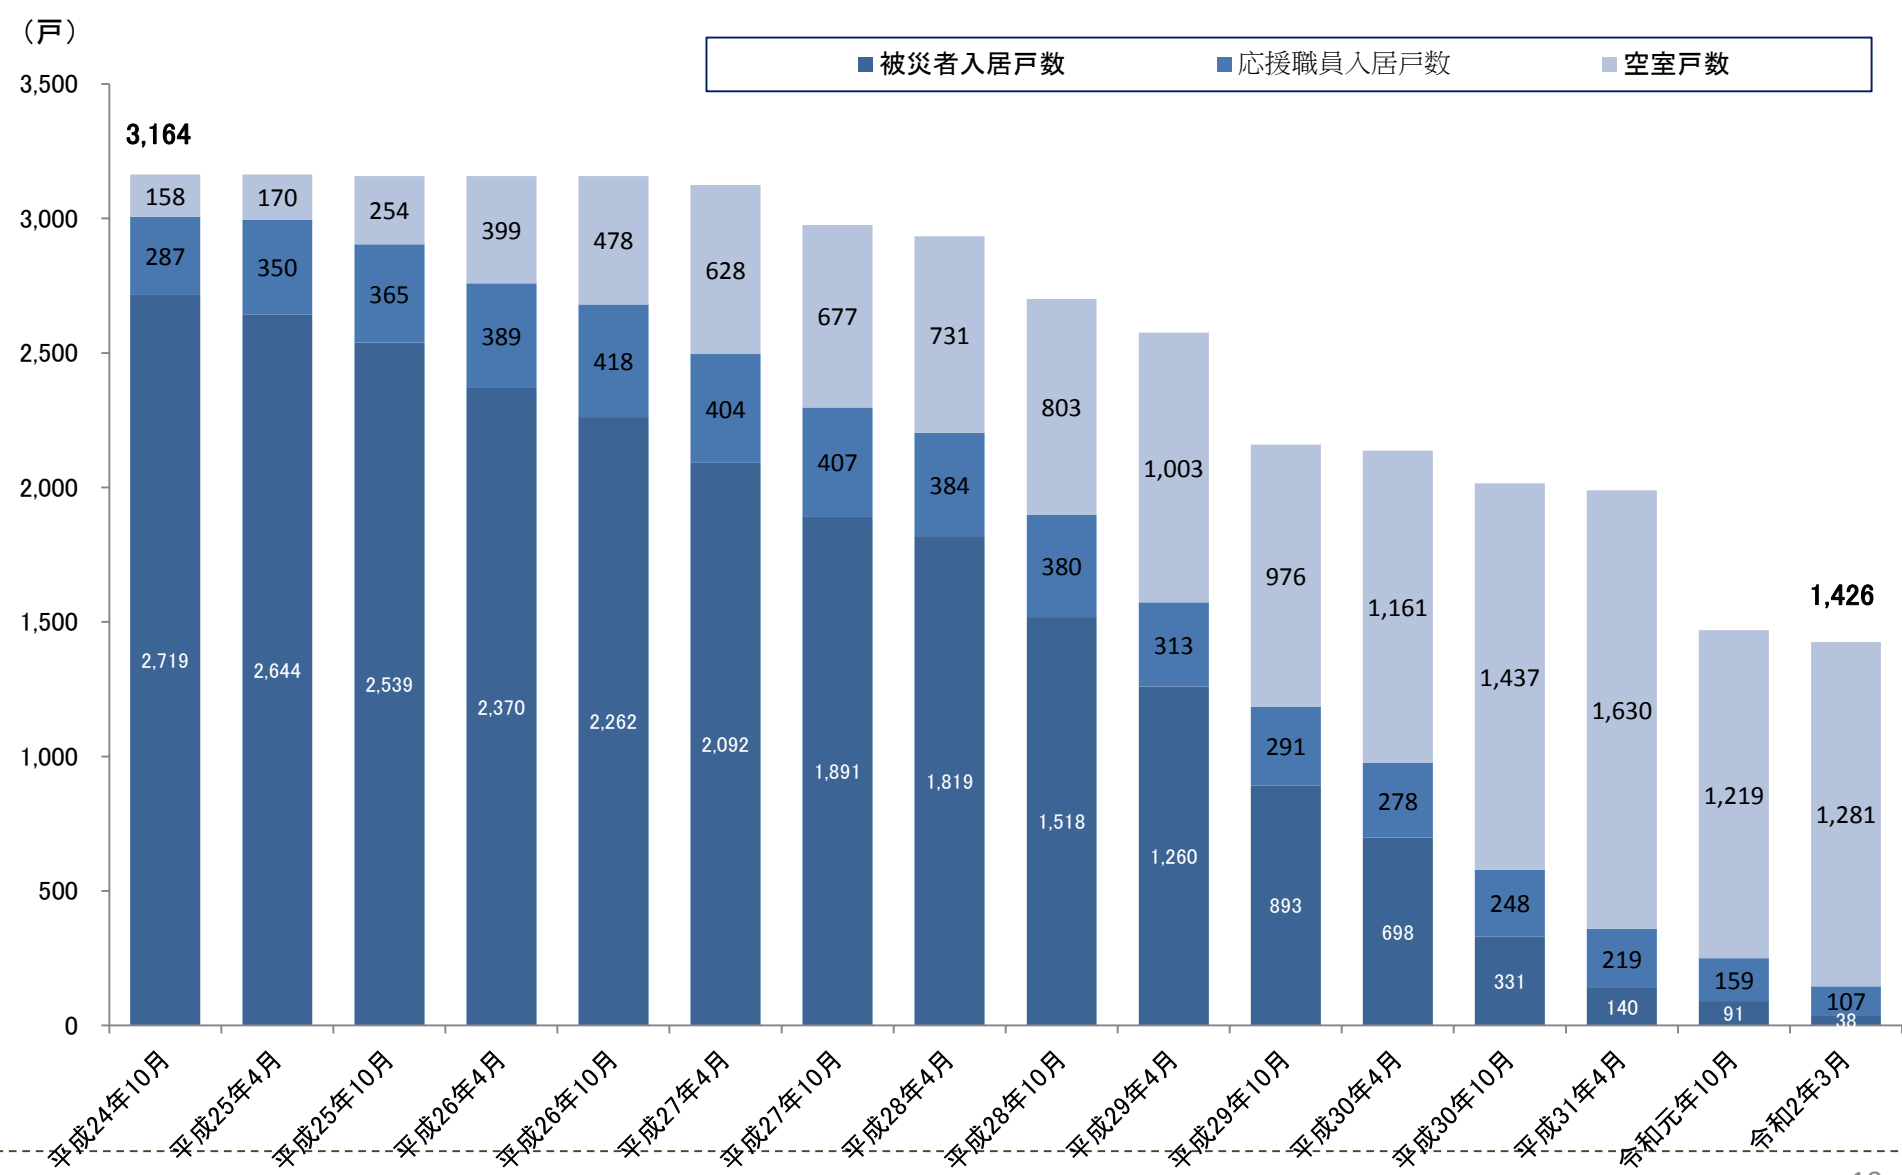

応急仮設住宅の解体状況


| 解体完了時期    | 団地名称       | 棟数  | 戸数   |
|-----------|------------|-----|------|
| H25. 9月末  | 平田第3（一部）   | 2棟  | 6戸   |
| H26. 10月末 | 唐丹町大石      | 1棟  | 6戸   |
| H26. 11月末 | 鵜住居町第5（一部） | 6棟  | 28戸  |
| H27. 3月末  | 桜木町（一部）    | 9棟  | 54戸  |
| H27. 7月末  | 箱崎町第3（一部）  | 2棟  | 14戸  |
| H27. 8月末  | 鵜住居第4      | 6棟  | 24戸  |
| H27. 9月末  | 唐丹町上荒川     | 2棟  | 6戸   |
|           | 平田第3（一部）   | 1棟  | 2戸   |
|           | 唐丹町小白浜     | 9棟  | 49戸  |
| H28. 3月末  | 鵜住居町第5     | 8棟  | 41戸  |
| H28. 12月末 | 中妻町        | 18棟 | 118戸 |
| H28. 8月末  | 甲子町B       | 10棟 | 53戸  |
|           | 唐丹町川目D（一部） | 1棟  | 6戸   |
|           | 甲子町C       | 8棟  | 36戸  |
|           | 甲子町D       | 2棟  | 8戸   |
| H28. 11月末 | 大只越町       | 2棟  | 12戸  |
| H28. 12月末 | 甲子町第10     | 5棟  | 41戸  |
|           | 鵜住居町第3     | 2棟  | 12戸  |
| H29. 3月末  | 栗林町第2A・2B  | 15棟 | 66戸  |
|           | 箱崎町第3（一部）  | 1棟  | 6戸   |
| H29. 8月末  | 甲子町A       | 5棟  | 28戸  |
|           | 甲子町第9      | 13棟 | 120戸 |
|           | 甲子町第6      | 14棟 | 138戸 |
|           | 甲子町第4      | 11棟 | 66戸  |
|           | 鵜住居町第7     | 4棟  | 16戸  |
| H29. 9月末  | 平田第5       | 8棟  | 42戸  |
| H30. 3月末  | 平田第4       | 5棟  | 13戸  |
|           | 箱崎町D       | 1棟  | 6戸   |
|           | 平田第3（一部）   | 1棟  | 4戸   |

| 解体完了時期    | 団地名称       | 棟数  | 戸数  |
|-----------|------------|-----|-----|
| H30. 10月末 | 唐丹町大曾根     | 4棟  | 29戸 |
|           | 唐丹町川目C     | 4棟  | 25戸 |
|           | 唐丹町川目D（一部） | 1棟  | 6戸  |
| H30. 11月末 | 大平町第2      | 3棟  | 19戸 |
|           | 甲子町第8      | 2棟  | 12戸 |
| H30. 12月末 | 平田（一部）     | 7棟  | 27戸 |
| H31. 1月末  | 甲子町第7      | 7棟  | 36戸 |
| R1. 8月末   | 平田第2（一部）   | 7棟  | 34戸 |
| R1. 9月末   | 鵜住居第6      | 2棟  | 12戸 |
|           | 鵜住居第2B     | 1棟  | 6戸  |
|           | 鵜住居町第2C    | 2棟  | 12戸 |
|           | 大平町        | 5棟  | 17戸 |
|           | 甲子町第3      | 9棟  | 56戸 |
|           | 唐丹町上荒川     | 3棟  | 12戸 |
|           | 平田第3       | 2棟  | 5戸  |
|           | 定内町        | 8棟  | 42戸 |
|           | 唐丹町川目A     | 2棟  | 10戸 |
| R1. 11月末  | 鵜住居町第9     | 1棟  | 6戸  |
|           | 天神町        | 9棟  | 52戸 |
| R1. 12月末  | 鵜住居町C      | 6棟  | 36戸 |
|           | 鵜住居町D      | 8棟  | 47戸 |
| R2. 3月末   | 箱崎町B       | 7棟  | 39戸 |
|           | 栗林町第3      | 5棟  | 32戸 |
|           | 小佐野町       | 15棟 | 59戸 |
|           | 箱崎町A       | 2棟  | 12戸 |
|           | 箱崎町C       | 7棟  | 31戸 |
|           | 鵜住居第2E     | 8棟  | 43戸 |

309棟 1,738戸

漁港災害復旧事業(市漁港)の進捗


単位:箇所

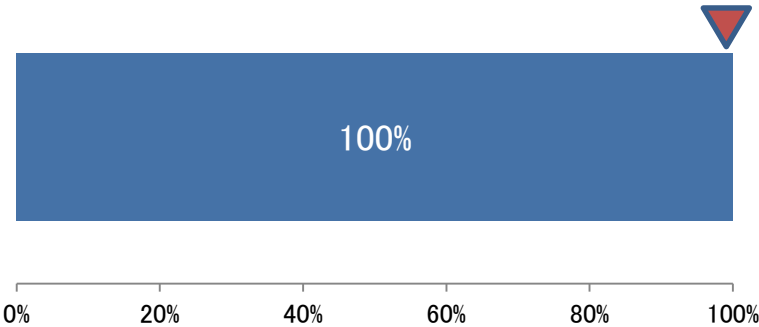

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 分子 | 復旧完了漁港数 | 9 |
| 分母 | 復旧予定漁港数 | 9 |

海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)の進捗

単位:箇所

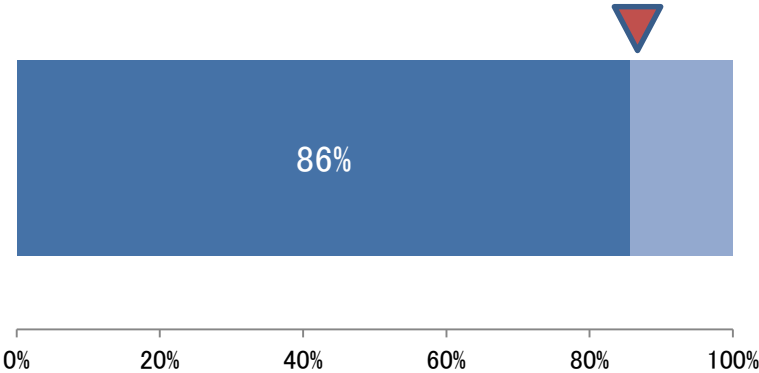


|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 分子 | 復旧完了防潮堤数<br>(津波防御機能が発現している防潮堤数) | 6 |
| 分母 | 復旧予定防潮堤数                        | 7 |

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

水揚げ高(魚市場)


単位:千円

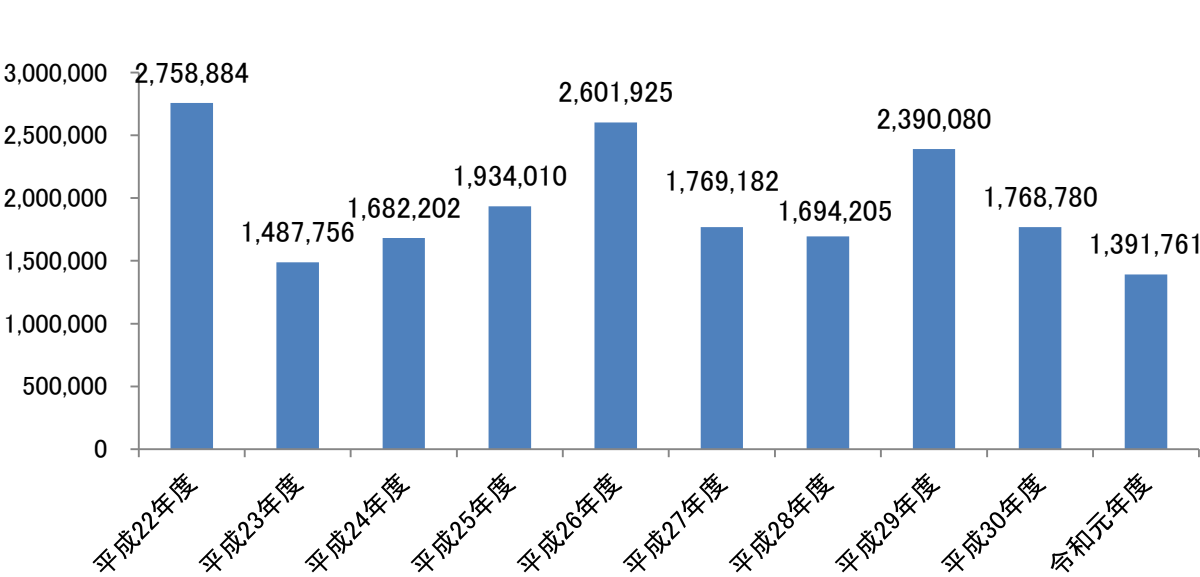

|        |           |
|--------|-----------|
| 平成22年度 | 2,758,884 |
| 平成23年度 | 1,487,756 |
| 平成24年度 | 1,682,202 |
| 平成25年度 | 1,934,010 |
| 平成26年度 | 2,601,925 |
| 平成27年度 | 1,769,182 |
| 平成28年度 | 1,694,205 |
| 平成29年度 | 2,390,080 |
| 平成30年度 | 1,768,780 |
| 令和元年度  | 1,391,761 |

水産加工業企業数

単位:社

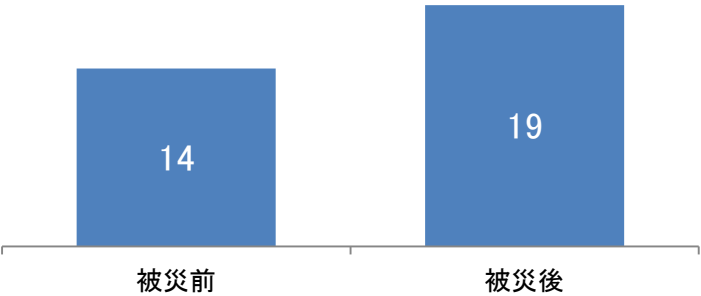

震災前の企業数

14


再開した企業数  
(新規4を含む)

19

農地農業用施設災害復旧事業の進捗




釜石市への観光客数

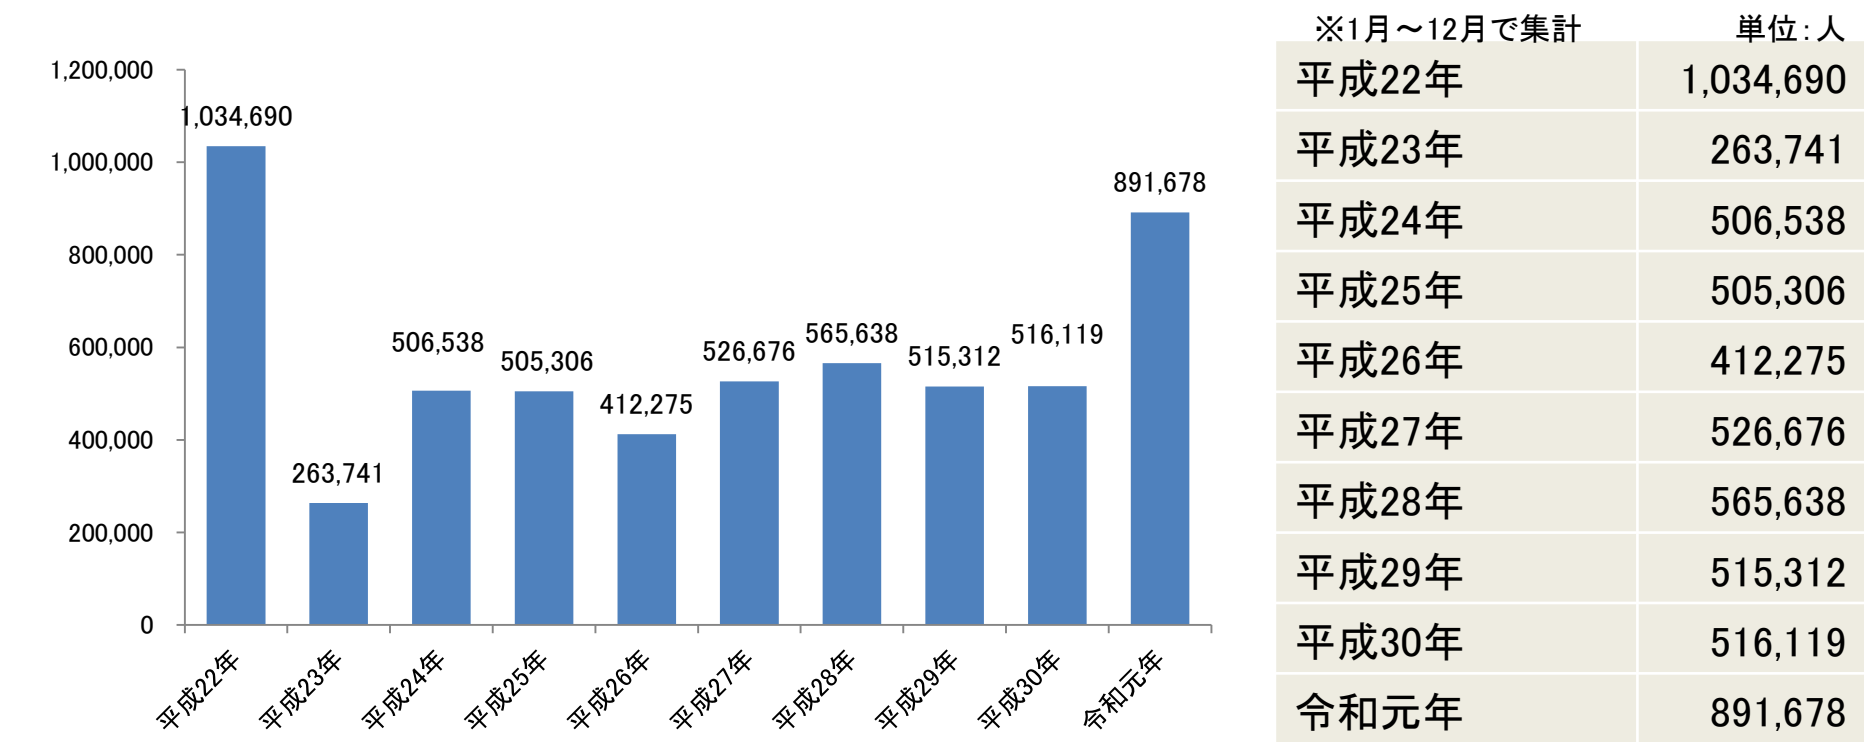


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う



釜石港港湾取扱貨物量

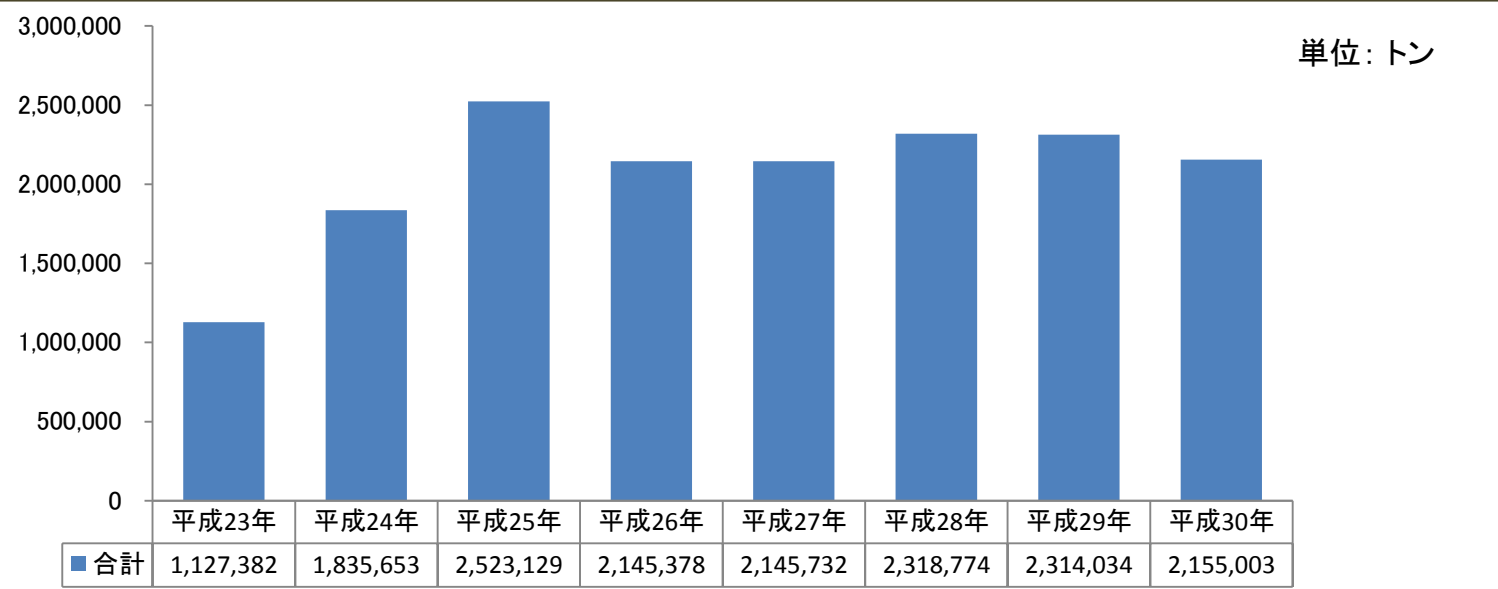


製造品出荷額等

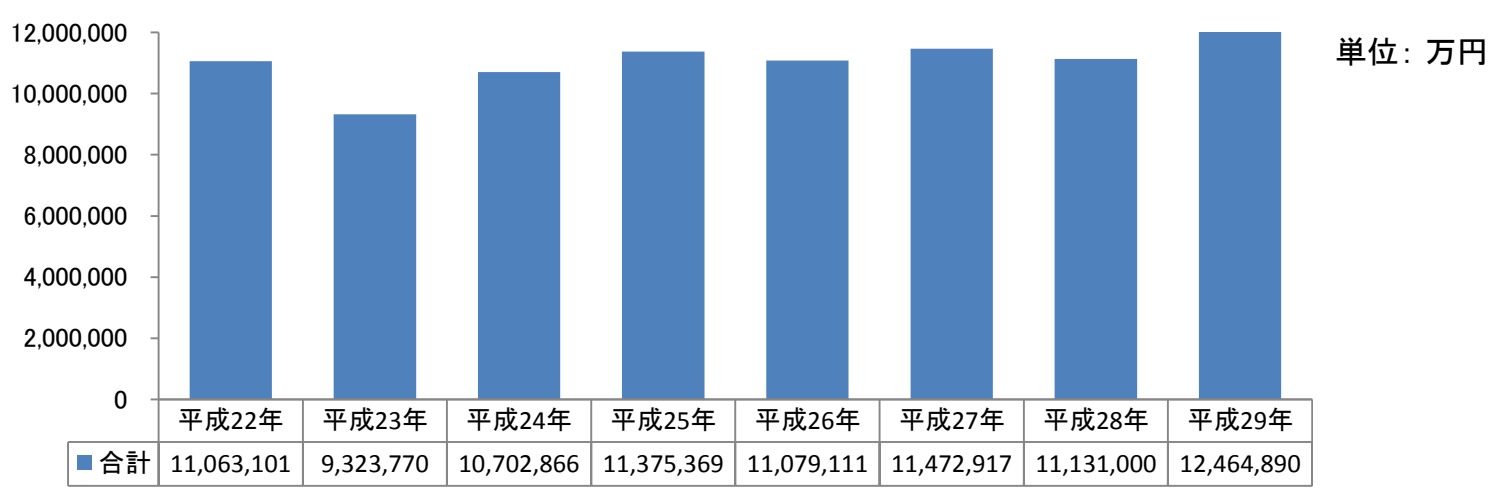

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別有効求人倍率

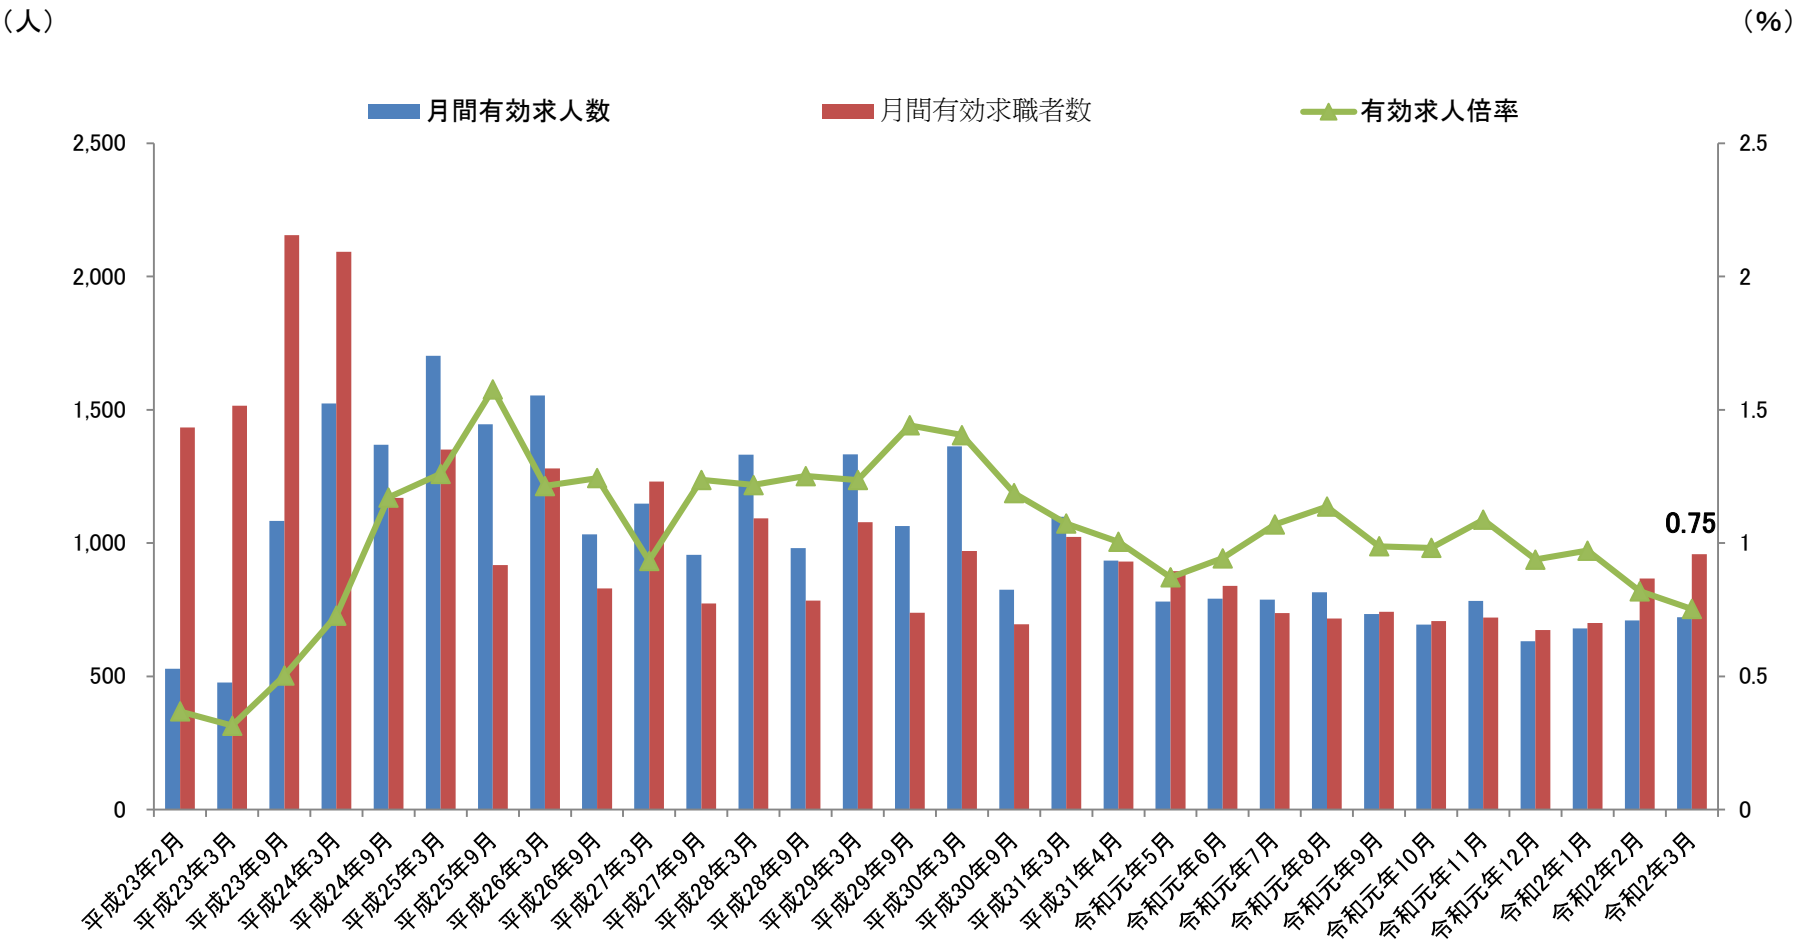


出典: 釜石公共職業安定所

※有効求人数 : 前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数  
有効求職者数 : 前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数  
有効求人倍率 : 求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

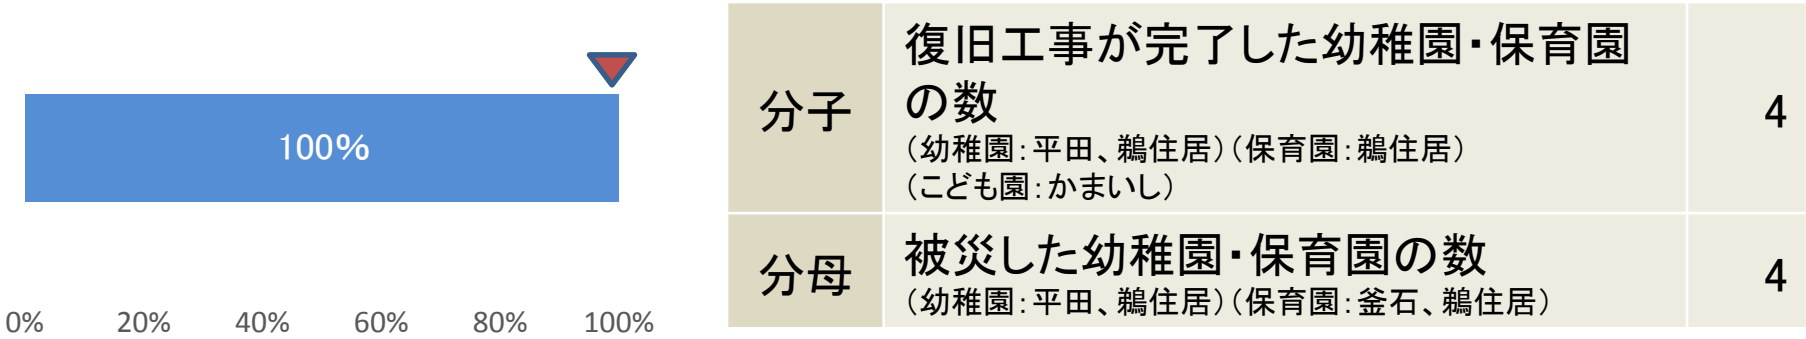


小学校復旧工事の進捗

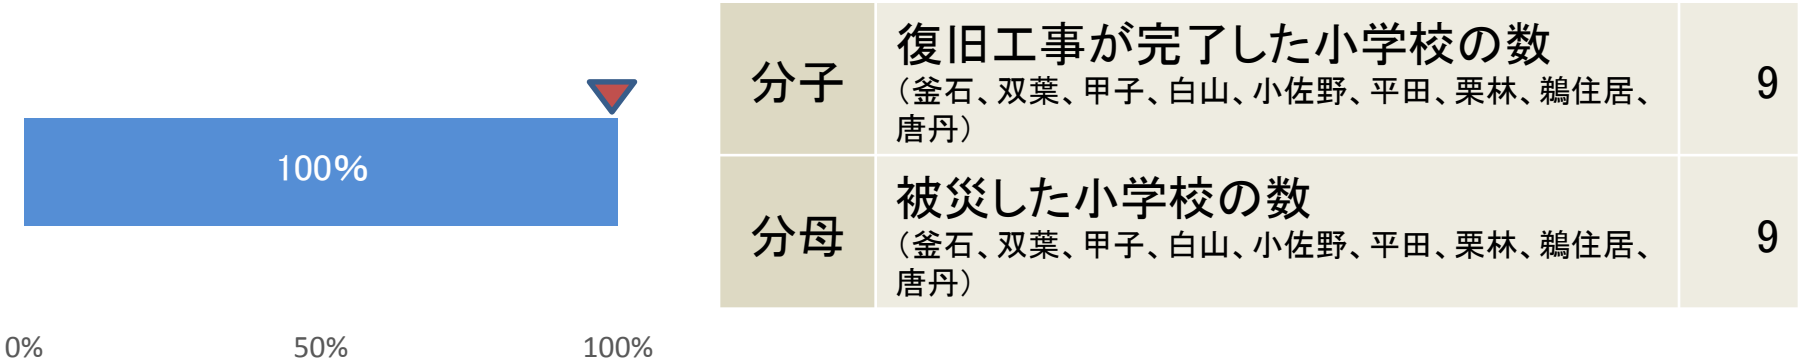


※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う


児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

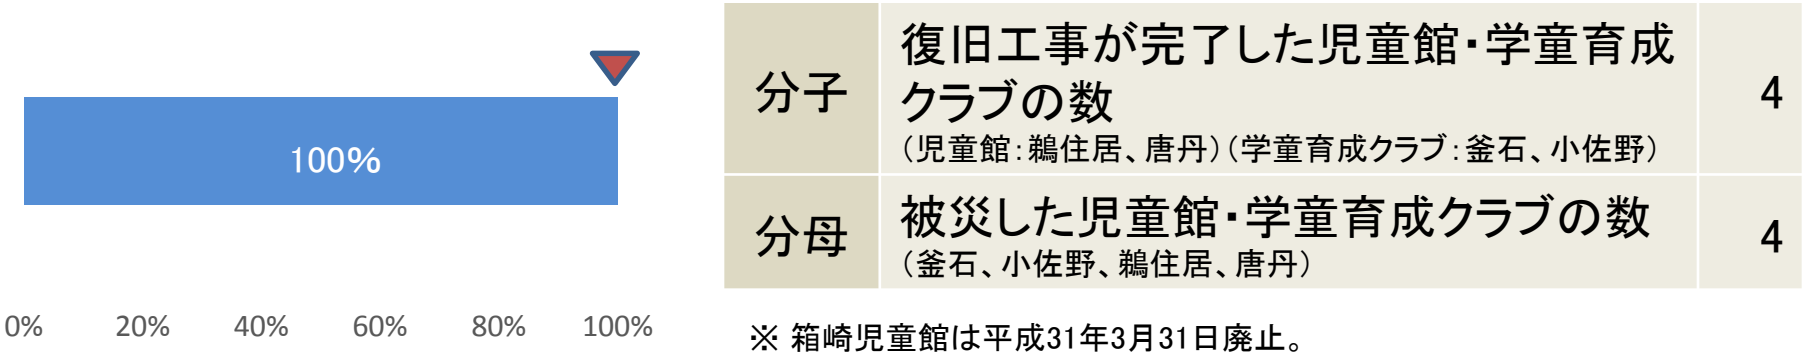

中学校復旧工事の進捗

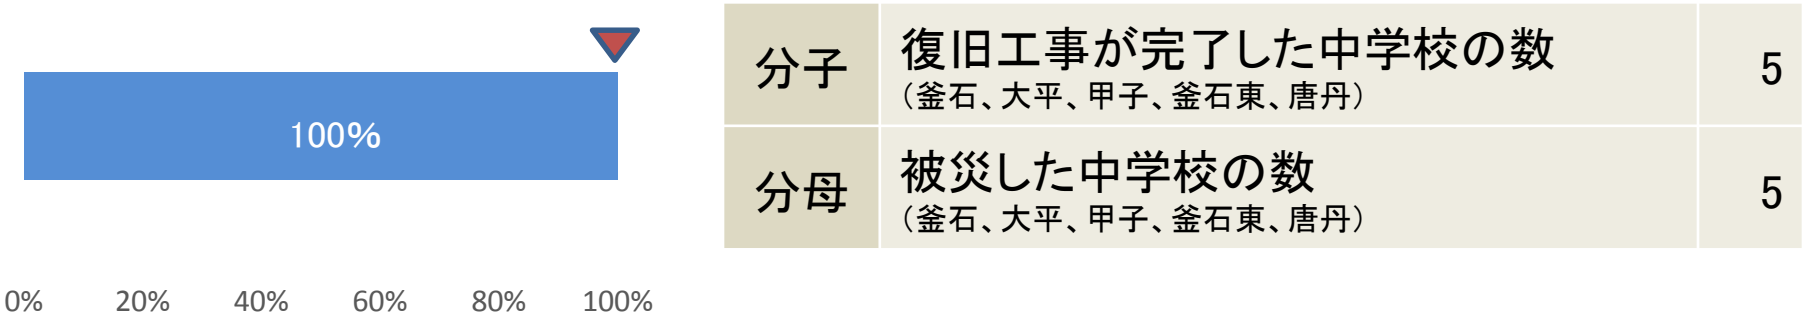


ボランティア受け入れの人数

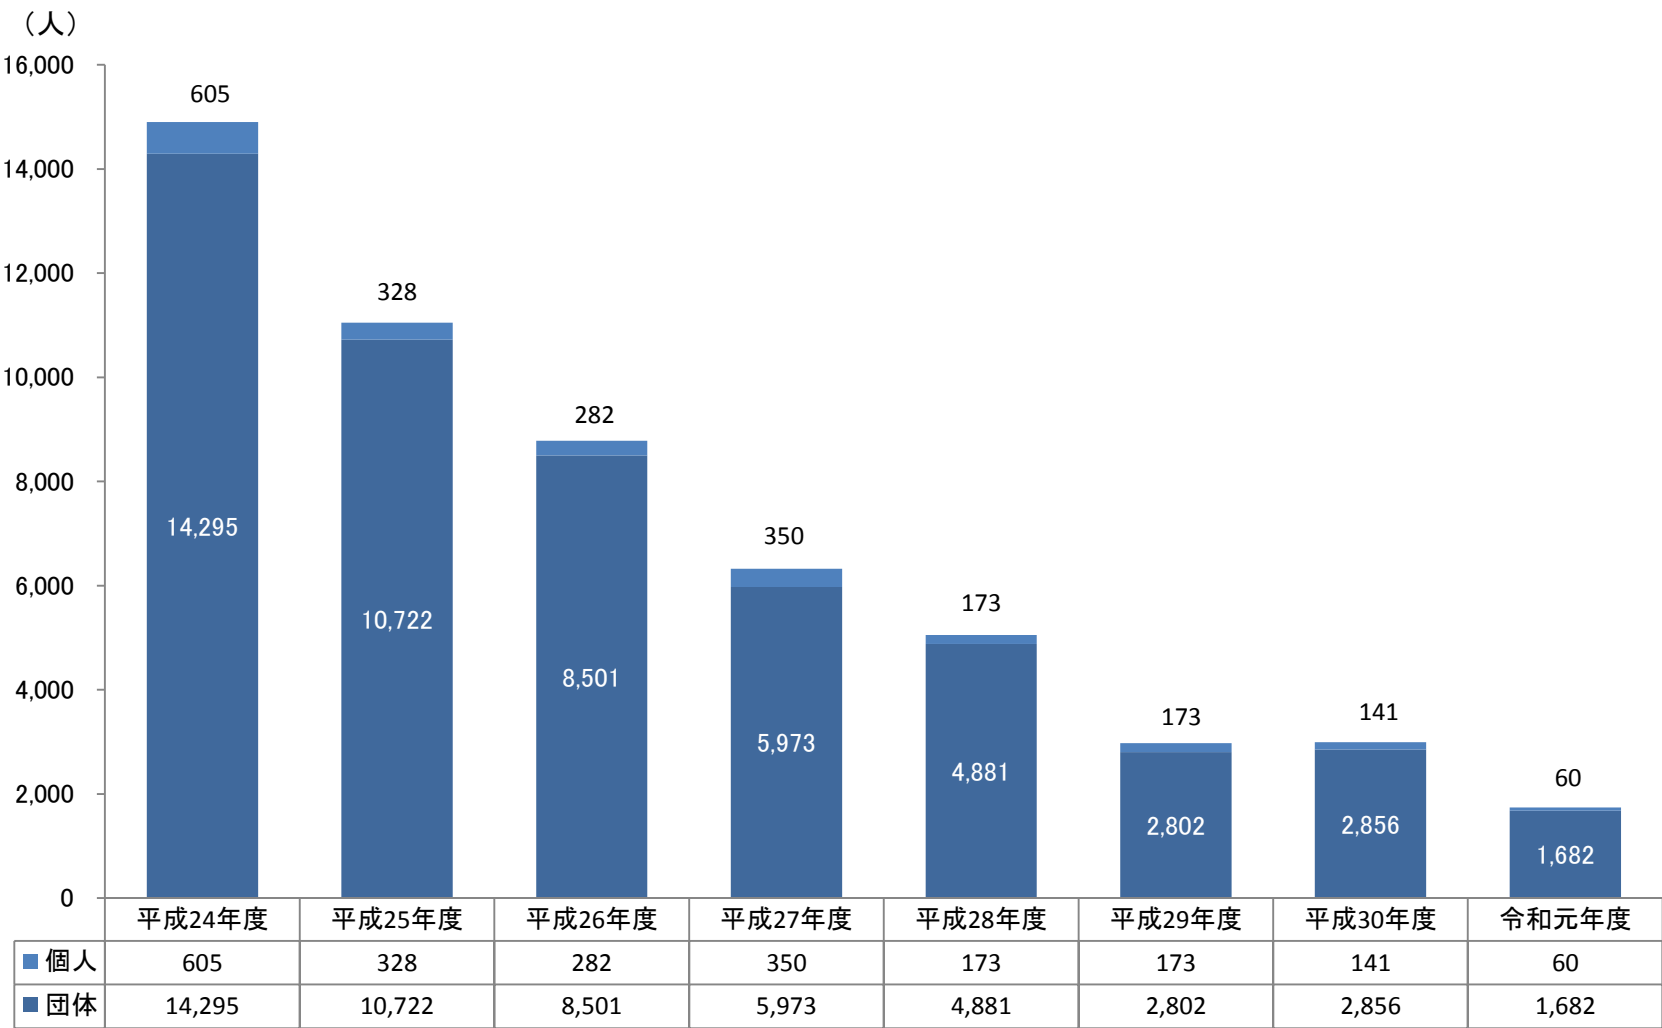


※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

人口(月別)

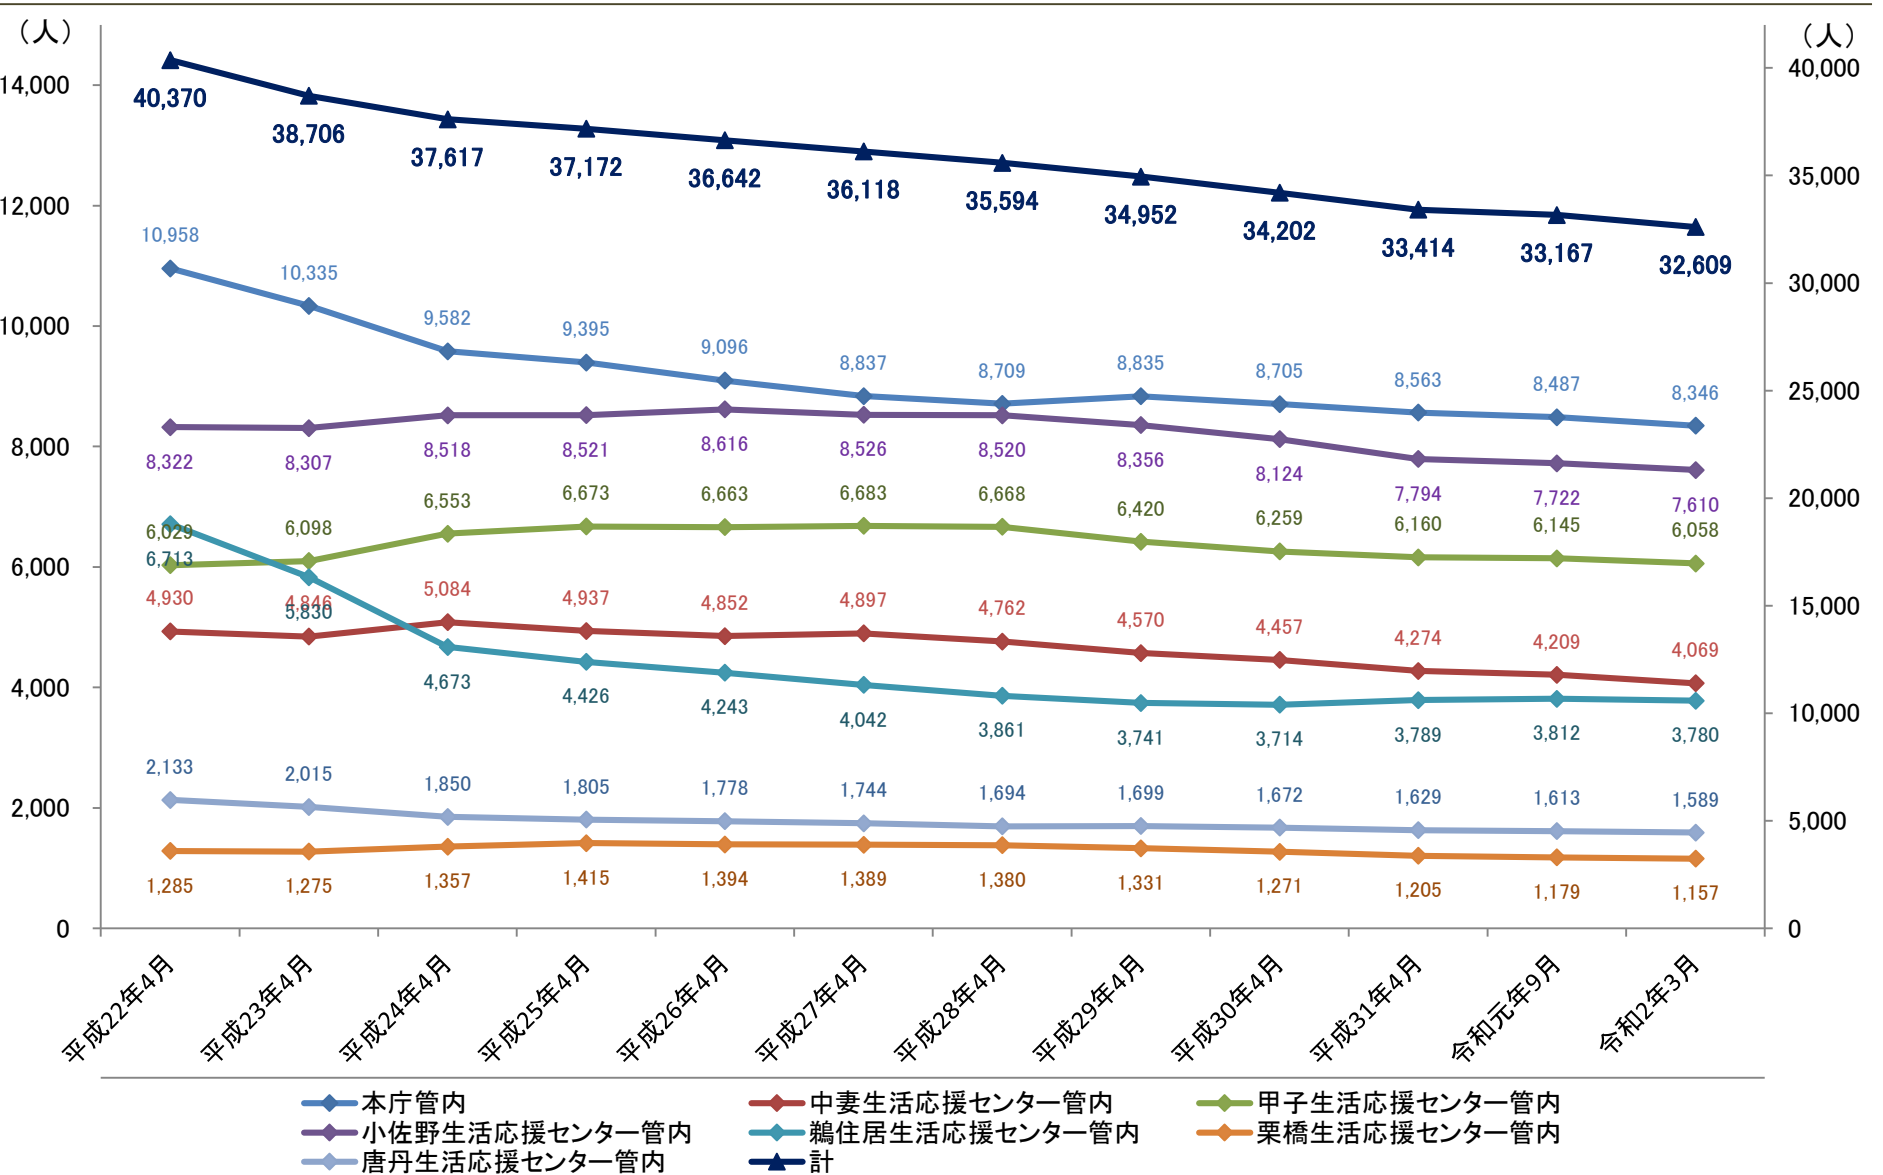


人口(社会動態)



|        | 転入    | 転出     | 増減   |
|--------|-------|--------|------|
| 平成24年度 | 1,292 | -1,347 | -55  |
| 平成25年度 | 1,252 | -1,443 | -191 |
| 平成26年度 | 1,270 | -1,344 | -74  |
| 平成27年度 | 1,205 | -1,311 | -106 |
| 平成28年度 | 1,155 | -1,274 | -119 |
| 平成29年度 | 1,031 | -1,414 | -383 |
| 平成30年度 | 1,088 | -1,444 | -356 |
| 令和元年度  | 974   | -1,304 | -330 |

他市町村から釜石市への派遣職員等の人数

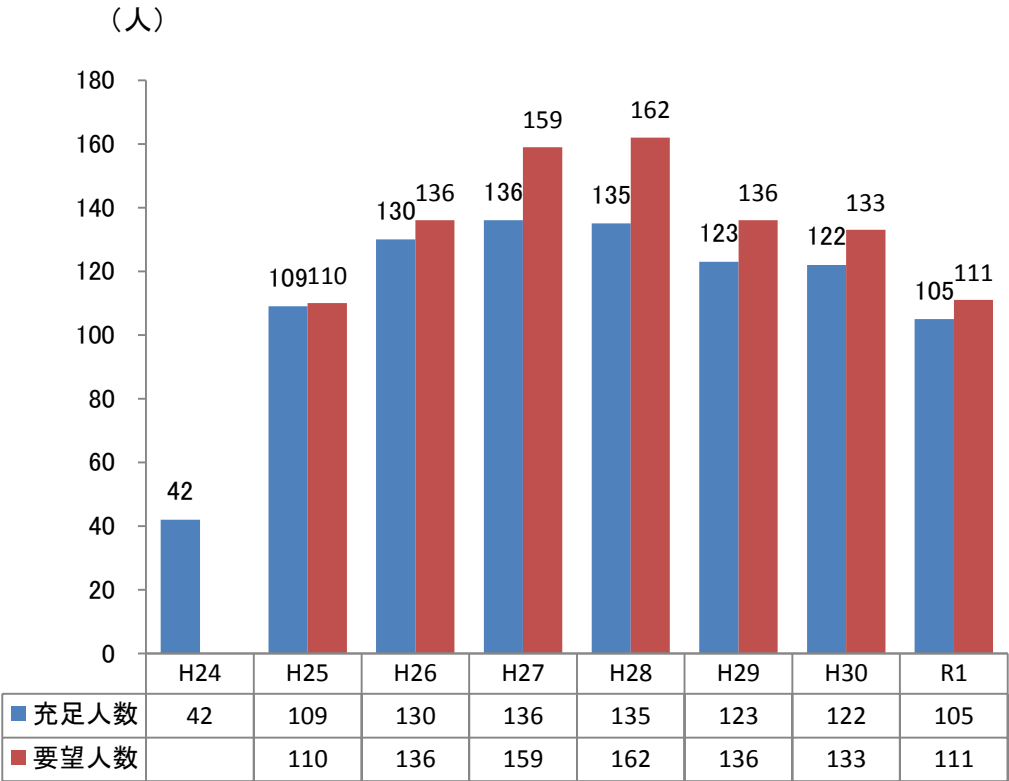

| 充足率(対要望人数比) |     |
|-------------|-----|
| 平成24年度      | —   |
| 平成25年度      | 99% |
| 平成26年度      | 96% |
| 平成27年度      | 86% |
| 平成28年度      | 83% |
| 平成29年度      | 90% |
| 平成30年度      | 92% |
| 令和元年度       | 95% |



| 項目             | 指標                  | 数値  | 単位 |
|----------------|---------------------|-----|----|
| 土地利用           |                     |     |    |
| 災害廃棄物処理の完了数    | 完了総量                | 946 | 千t |
| インフラ           |                     |     |    |
| 道路災害復旧事業の進捗    | 工事が完了した市道の箇所数       | 65  | 箇所 |
| 橋りょう復旧事業の進捗    | 工事が完了した橋りょうの箇所数     | 9   | 箇所 |
| 河川改修事業の進捗      | 工事が完了した箇所数          | 15  | 箇所 |
| 下水道施設災害復旧事業の進捗 | 復旧工事が完了した施設箇所(管路施設) | 8   | 箇所 |

| 分類        | 項目                   | 問い合わせ先                |                              |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2-1 土地利用  | 全体                   | 復興推進本部事務局             | 0193-27-8437                 |
|           | 土地区画整理事業             | 復興推進本部都市整備推進室         | 0193-27-8437                 |
|           | 防災集団移転促進事業           |                       |                              |
|           | 漁業集落防災機能強化事業<br>用地買収 |                       |                              |
| 2-2 住まい   | 復興公営住宅整備事業           | 建設部都市計画課復興住宅整備室       | 0193-27-8435                 |
|           | 住宅の自力再建(生活再建支援金)     | 保健福祉部地域福祉課            | 0193-22-0177                 |
|           | 応急仮設住宅入居戸数           | 復興推進本部生活支援室           | 0193-22-8253                 |
| 2-3 インフラ  | 漁港災害復旧事業(市漁港)        | 産業振興部水産課              | 0193-27-8427                 |
|           | 海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)     |                       |                              |
| 2-4 産業・雇用 | 水揚げ高(魚市場)            | 産業振興部水産課              |                              |
|           | 水産加工業企業数             |                       |                              |
|           | 農地農業用施設災害復旧事業        | 産業振興部農林課              | 0193-27-8426                 |
|           | 観光客数                 | 産業振興部商工観光課            | 0193-27-8421                 |
|           | 釜石港港湾取扱貨物量           | 産業振興部国際港湾産業課          | 0193-27-8425                 |
|           | 製造品出荷額等              | 総務企画部総合政策課            | 0193-27-8413                 |
|           | 月別有効求人倍率             | 産業振興部商工観光課            | 0193-27-8421                 |
|           | 幼稚園・保育園復旧工事          | 教育委員会総務課<br>保健福祉部子ども課 | 0193-22-8832<br>0193-22-5121 |
|           | 小学校復旧工事              |                       |                              |
|           | 児童館・学童育成クラブ復旧事業      |                       |                              |
| 2-5 教育    | 中学校復旧工事              | 社会福祉協議会               | 0193-24-2511                 |
|           | ボランティア受入数            |                       |                              |
|           | 人口(月別・社会動態)          |                       |                              |
|           | 被災地派遣職員の数            |                       |                              |
| 2-6 その他   | 道路災害復旧事業             | 総務企画部総務課              | 0193-27-8411                 |
|           | 橋りょう復旧事業             |                       |                              |
|           | 河川改修事業               |                       |                              |
|           | 下水道施設災害復旧事業          |                       |                              |
| 2-7 完了項目  | 道路災害復旧事業             | 建設部建設課                | 0193-27-8430                 |
|           | 橋りょう復旧事業             |                       |                              |
|           | 河川改修事業               |                       |                              |
|           | 下水道施設災害復旧事業          |                       |                              |
|           | 下水道施設災害復旧事業          | 建設部下水道課               | 0193-22-1061                 |
