かまいし復興レポートVol.34

釜石市

平成28年８月１日

目次

1 「かまいし復興レポート」について
2 復旧・復興の進捗状況
2-1 事業費
2-2 土地利用
2-3 インフラ整備
2-4 住まい
2-5 産業・雇用
2-6 教育
2-7 その他
3 問い合わせ先

1 「かまいし復興レポート」について

❑目的

- 「市の復旧・復興がどこまで進んでいるか」という情報を提供し、共通認識を有することで、復旧・復興事業に関する円滑なコミュニケーションを推進する

❑公開方法

- 定期的に市ホームページ上に公開
- 今回（Vol.34）の数値は平成28年７月31日時点
- 括弧内は前回数値（平成28年５月31日時点）からの進捗を示す
- 事業進捗に合わせて指標項目の追加・変更を適宜行うものとする

2-1 事業費

主な復興事業費の配分済額（単位：億円）

主な復旧事業費（単位：億円）

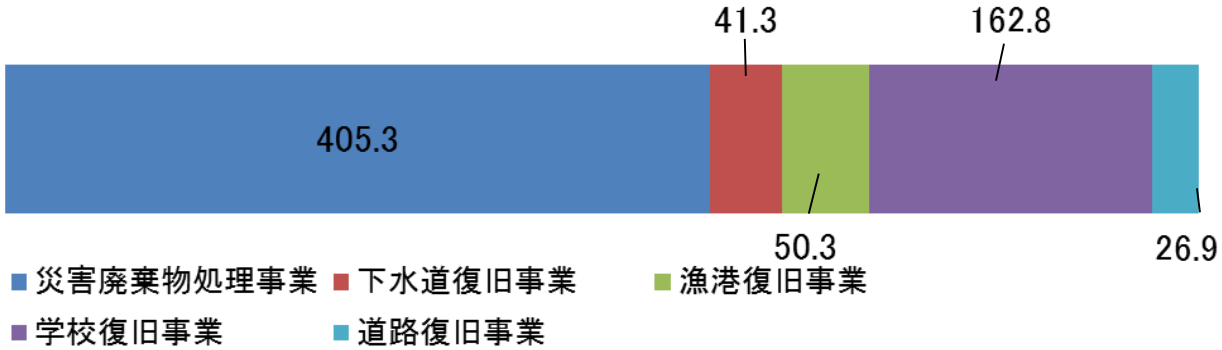

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-2　土地利用(1)

各地区の主な事業種別

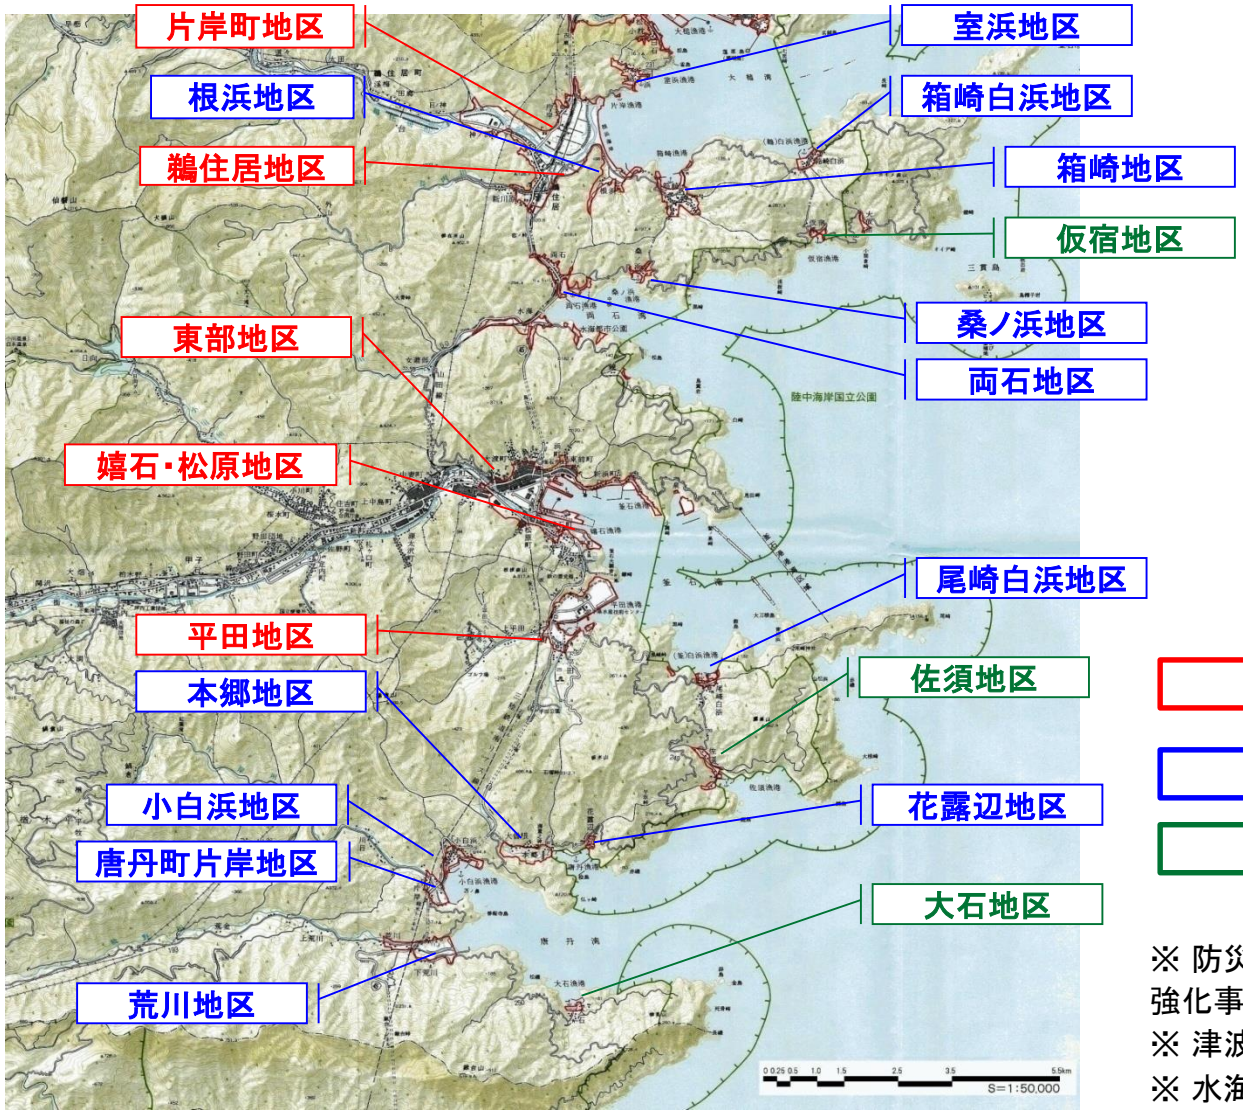

土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業

防災集団移転促進事業

漁業集落防災機能強化事業

※ 防災集団移転促進事業には漁業集落防災機能強化事業を合わせて実施する地区を含む
※ 津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居地区のみ
※ 水海地区は都市公園事業のみ

2-2　土地利用(2)

土地区画整理事業の進捗

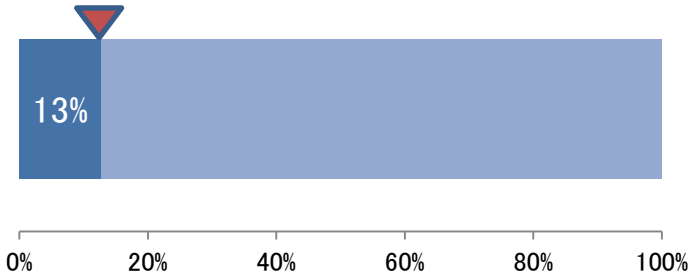

分子	整備完了区画数	139
分母	全体整備予定区画数	1,097

「土地区画整理事業」とは？

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするために、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集約化を行う

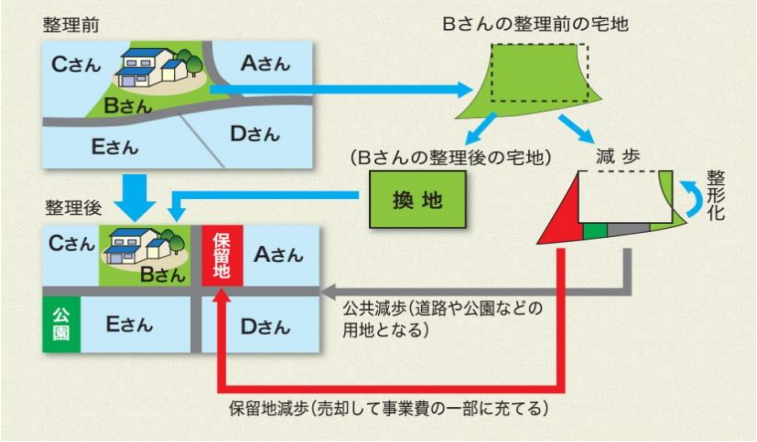

なお、釜石市の区画整理事業においては、保留地減歩は行いません。

スケジュール(予定)

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年5月～ 平成25年3月
都市計画決定	平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
事業計画認可	平成25年3月
換地設計	平成25年3月～
審議会選挙等	平成25年4月～
仮換地指定	平成26年度下期
建物等の移転・工事	平成26年度下期～ 平成30年3月
換地処分	平成29年度下期～ 平成30年3月

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-2　土地利用（3）

防災集団移転促進事業の進捗



分子	整備完了区画数	95
分母	全体整備予定区画数	135

「防災集団移転促進事業」とは？

・災害の危険の恐れがある地域から住宅を移転するために、高台や造成地などの住宅団地を整備
・移転元の土地は住宅地としては利用不可

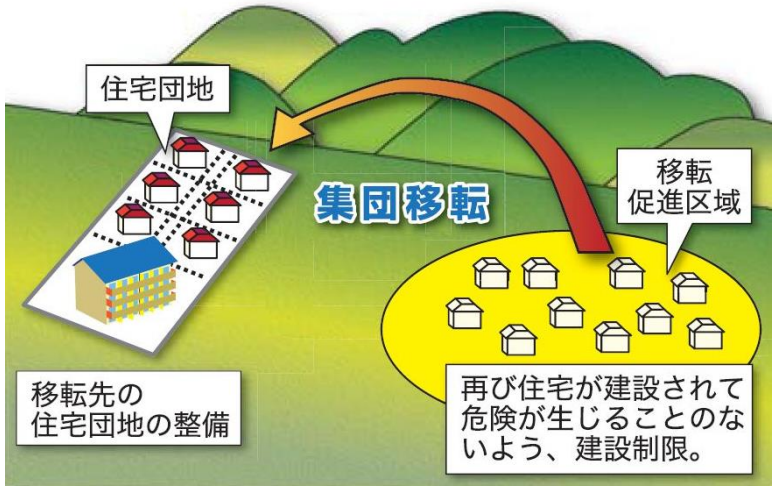

スケジュール（予定）

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
防災集団移転促進事業大臣同意	平成24年6月　1地区 平成24年9月　7地区 平成24年10月　3地区
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年5月～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-2　土地利用（4）

漁業集落防災機能強化事業の進捗



分子	整備完了区画数	47
分母	全体整備予定区画数	87

「漁業集落防災機能強化事業」とは？

・漁業集落において、安全安心な居住環境を確保するための地盤かさ上げ、生活基盤や防災安全施設の整備等を実施

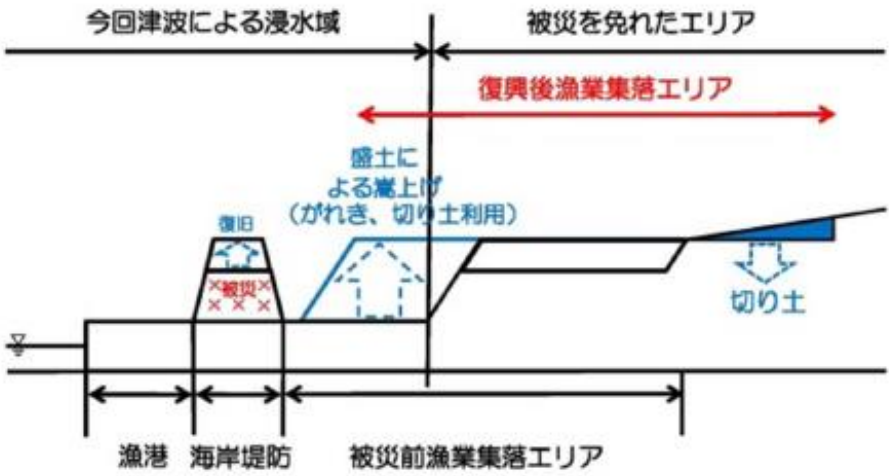

スケジュール（予定）

計画策定・合意形成	平成23年10月～
調査・測量・設計	平成24年4月～ 平成25年3月
用地境界確認	平成24年10月～ 平成24年11月
地権者連絡会	平成24年11月～
不動産鑑定・用地買収	平成24年11月～
造成工事・道路工事等	平成25年度～

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-2 土地利用(5)

用地買収の進捗



分子	買収面積	918,878 (+12,183)
分母	買収予定面積	1,032,480 (+7,475)

※ 買収予定面積は計画の進展により変更あり

単位：㎡

災害廃棄物処理の完了数

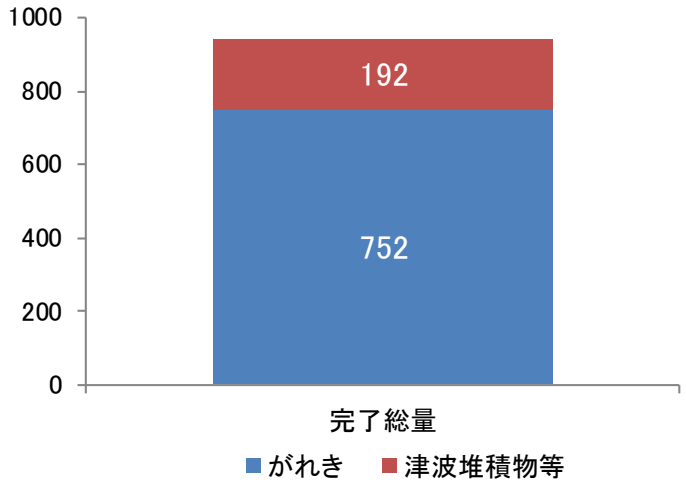

完了総量	944
仮置場への搬入(がれき)	752
仮置場への搬入(津波堆積物)	192
処理済み(がれき)	752
処理済み(津波堆積物)	192

単位：千t

※ 建物・基礎撤去の総数
建物撤去　1,407件
基礎撤去　4,581件

2-3 インフラ(1)

道路災害復旧事業の進捗



分子	工事が完了した市道の箇所数	65
分母	被災した市道の箇所数	77

橋りょう復旧事業の進捗

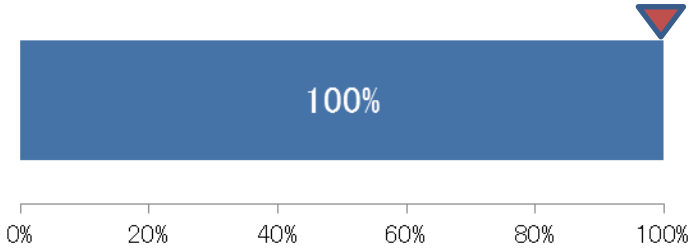

分子	工事が完了した橋りょうの箇所数	9
分母	被災した橋りょうの箇所数	9

河川改修事業の進捗

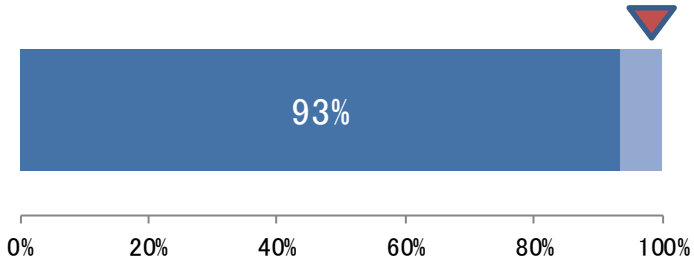

分子	工事が完了した箇所数	15
分母	整備予定の箇所数	15

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-3 インフラ(2)

下水道施設災害復旧事業の進捗

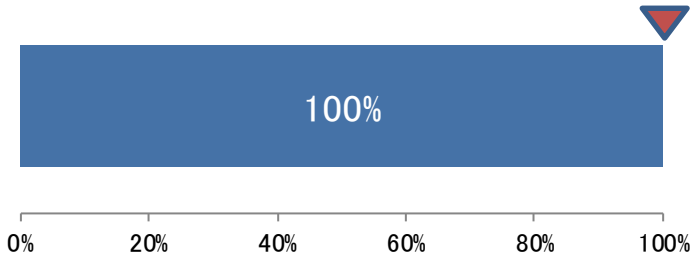

分子	復旧工事が完了した施設箇所 (管路施設)	8
分母	被災した下水道の施設箇所 (処理場・ポンプ施設、管路施設)	8

漁港災害復旧事業(市漁港)の進捗

単位:千円

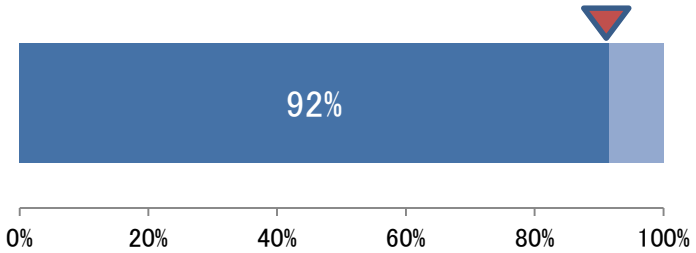

分子	工事発注済額	4,966,336
分母	工事予定総額	5,424,450

海岸施設災害復旧事業(市防潮堤)の進捗

単位:千円

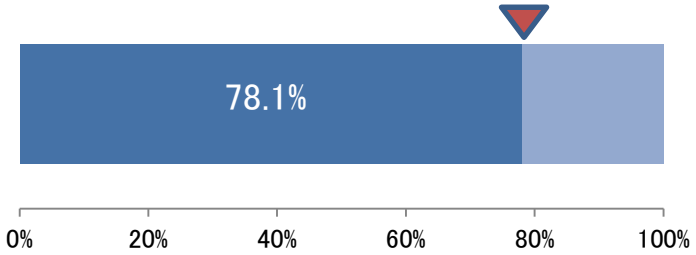

分子	工事発注済額	3,939,743
分母	工事予定総額	5,043,856

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-4　住まい（1）

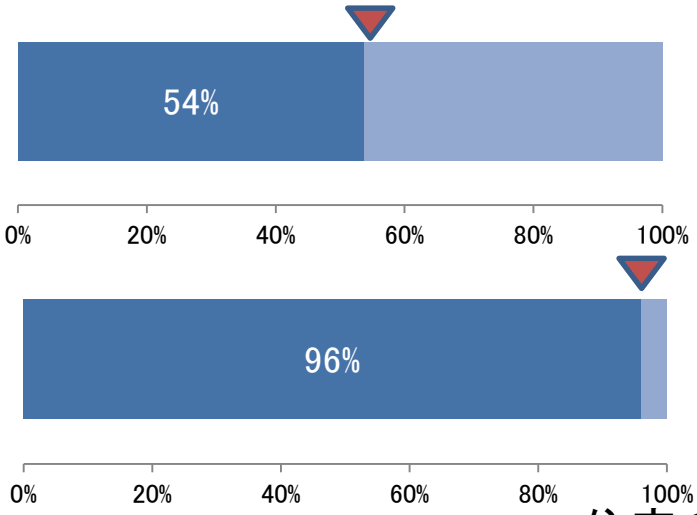

分子	建設済みの戸数	705 （+108）
分母	計画戸数（予定）	1,314
分子	工事発注済みの戸数	1,261 （±0）
分母	計画戸数（予定）	1,314

住宅の自力再建の状況（全体）

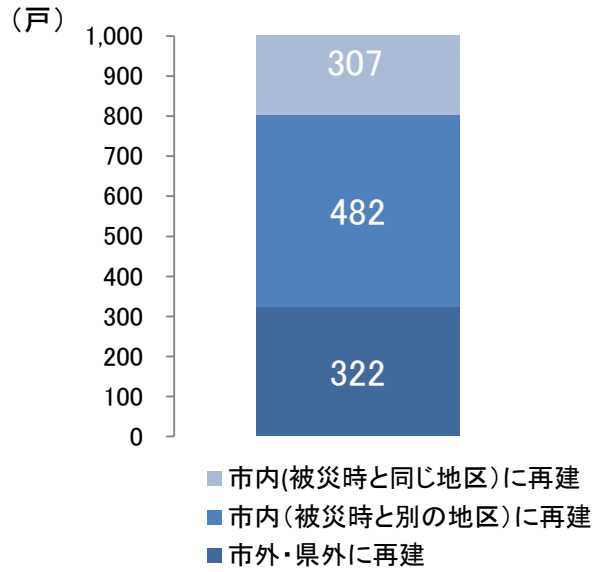

被災世帯数	4,059 （+34）
再建済み世帯数	1,111 （+35）
市内（被災時と同じ地区）に再建	322 （+17）
市内（被災時と別の地区）に再建	482 （+12）
市外・県外に再建	307 （+6）

※生活再建支援金の「加算支援金（建設・購入）」を申請した世帯数

2-4　住まい（2）

住宅の自力再建の状況（地区別）

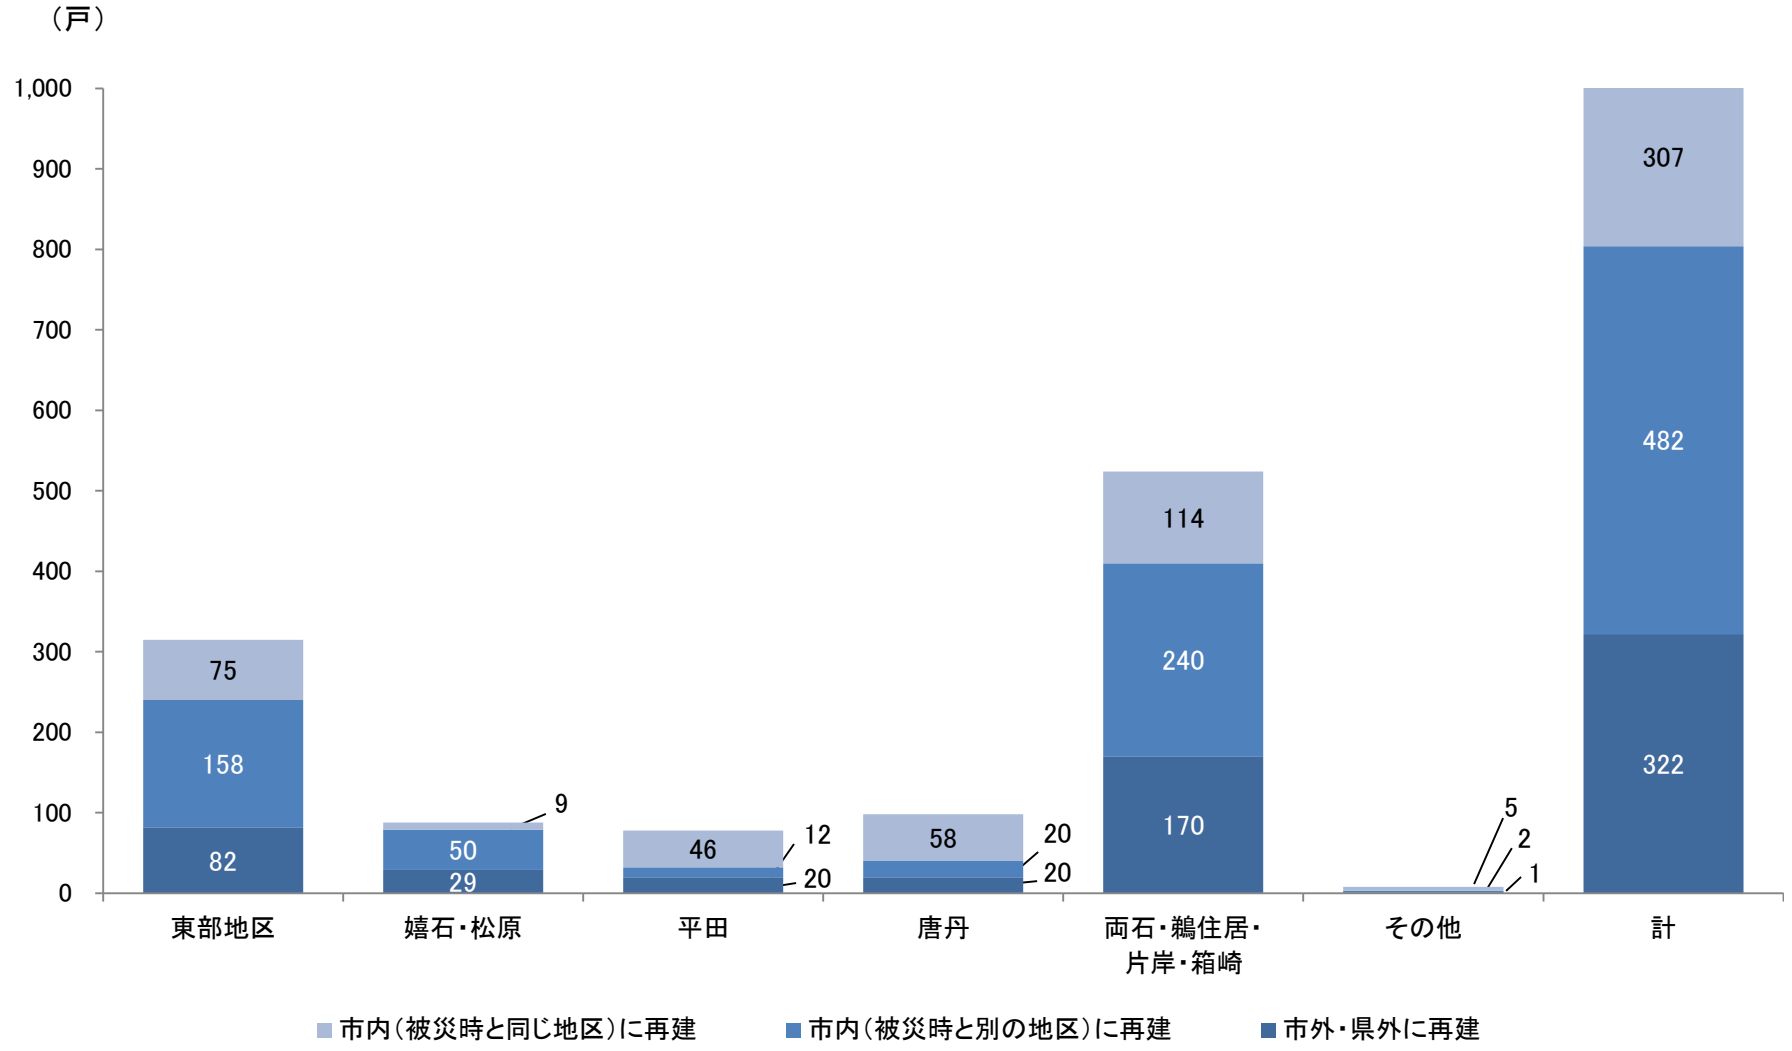

※生活再建支援金の「加算支援金（建設・購入）」を申請した世帯数

2-4 住まい(3)

応急仮設住宅入居戸数の推移

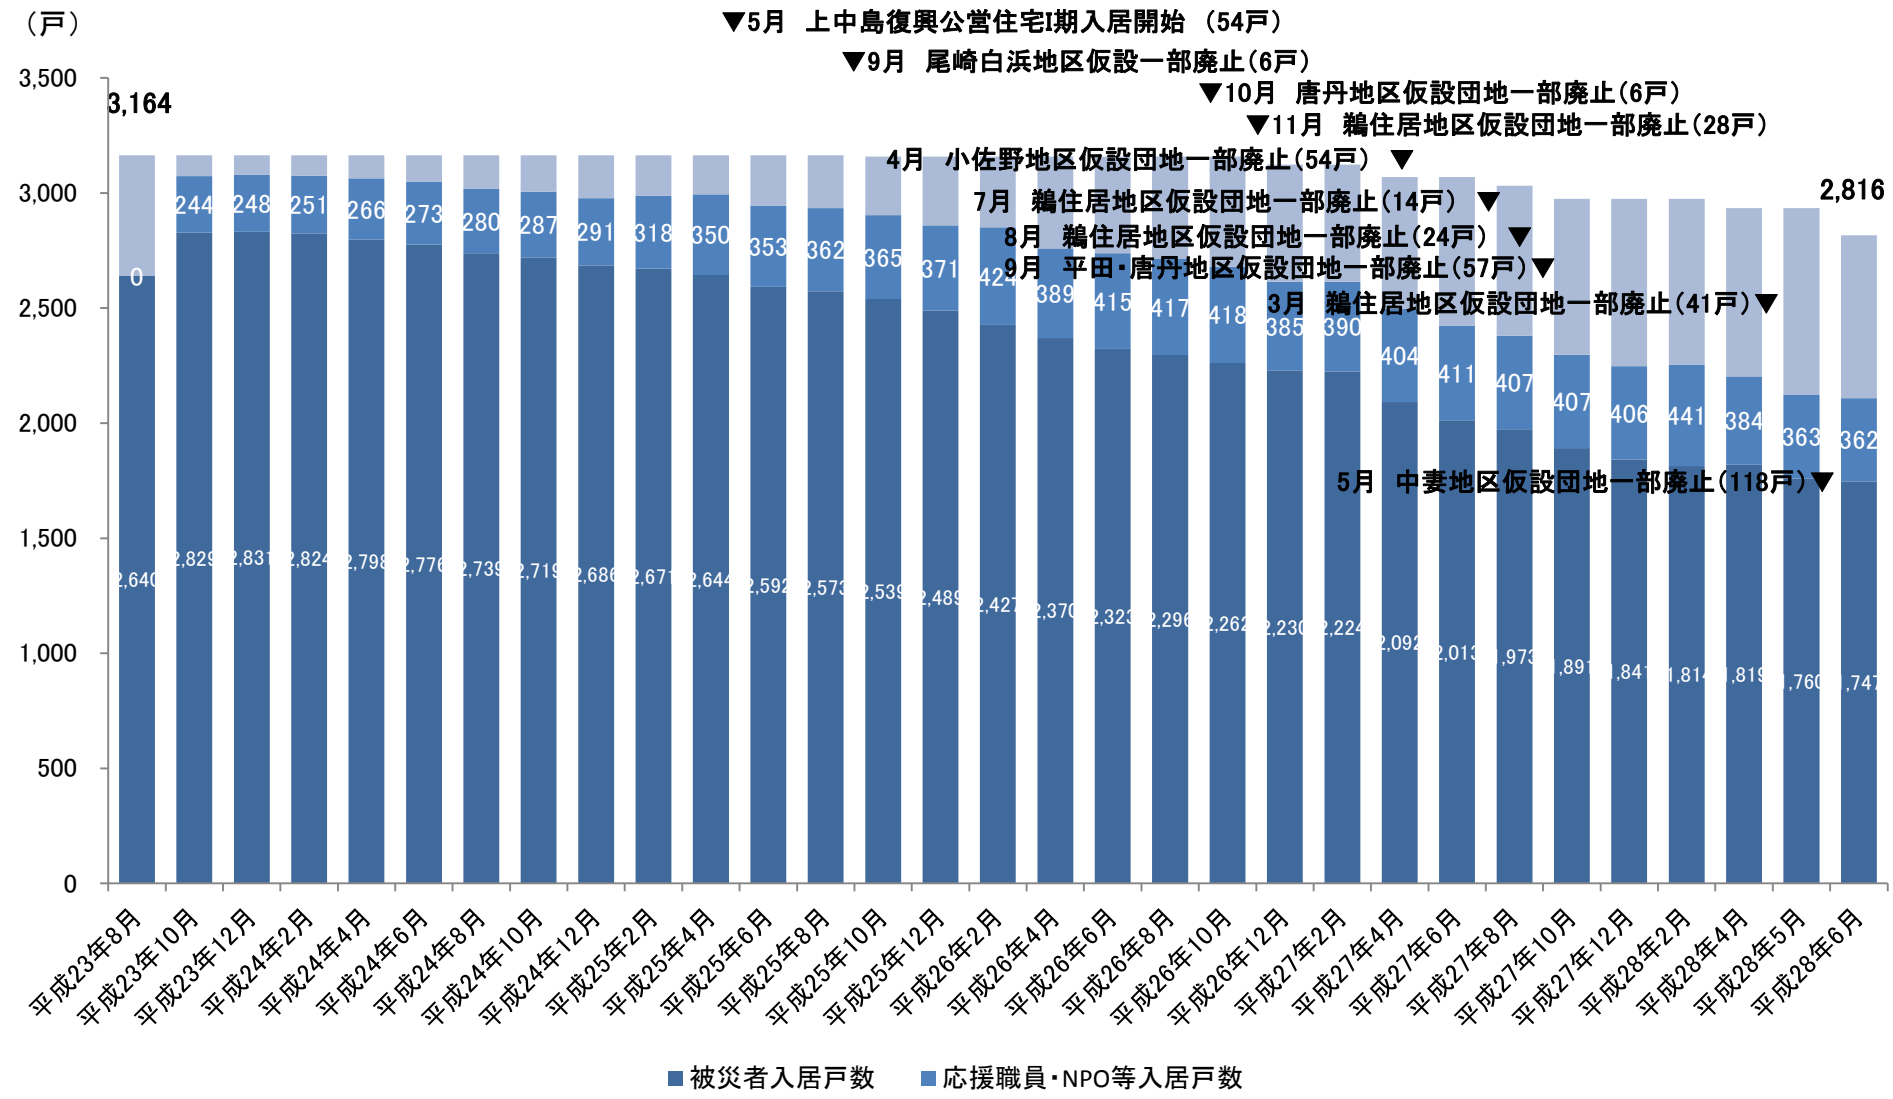

2-5　産業・雇用(1)

水揚げ高(魚市場)

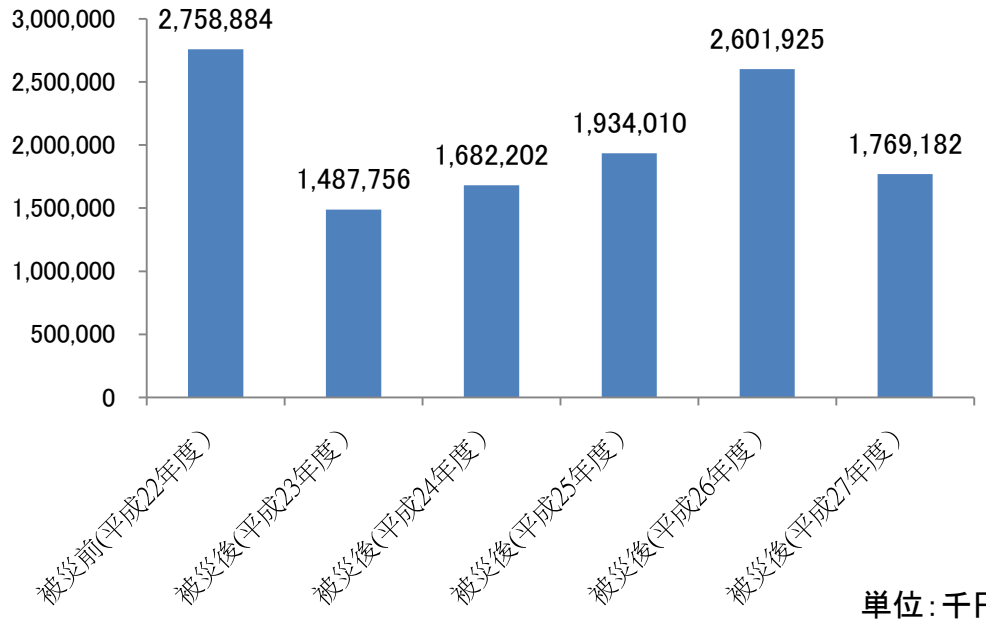

単位:千円

被災前(平成22年度)水揚げ高	2,758,884
被災後(平成23年度)水揚げ高	1,487,756
被災後(平成24年度)水揚げ高	1,682,202
被災後(平成25年度)水揚げ高	1,934,010
被災後(平成26年度)水揚げ高	2,601,925
被災後(平成27年度)水揚げ高	1,769,182

水産加工業企業数

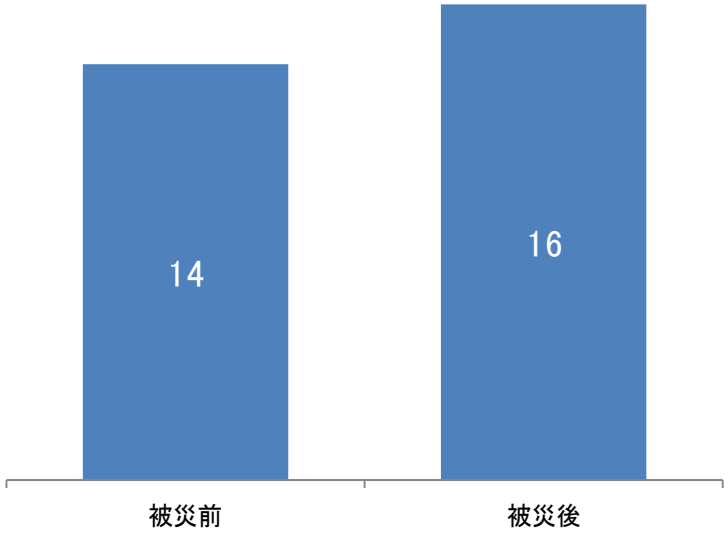

震災前の企業数	14
再開した企業数(新規4を含む)	16

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-5 産業・雇用(2)

農地農業用施設災害復旧事業の進捗



分子	復旧農地面積	17
分母	津波冠水農地面積	51.0

単位：ha

釜石市への観光客数

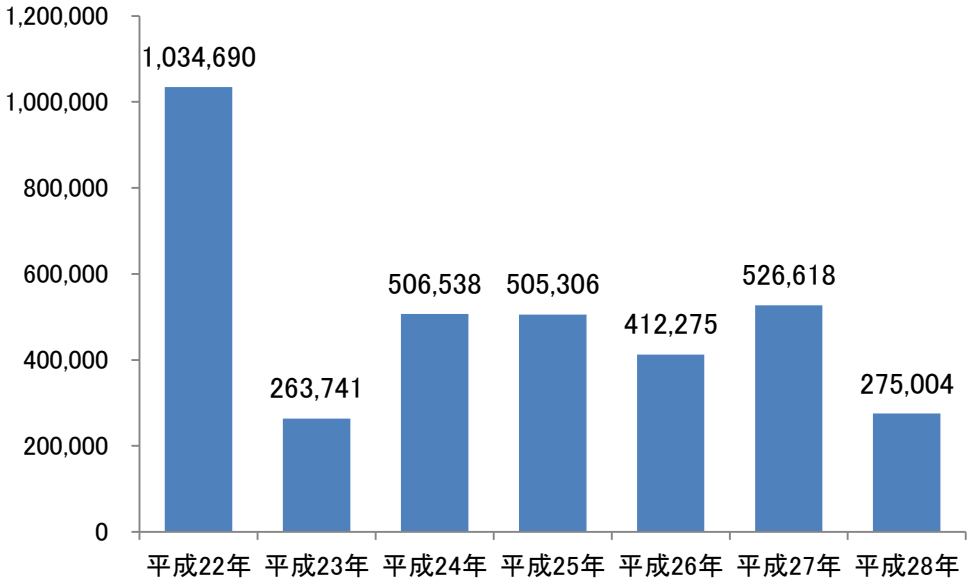

平成22年	1,034,690
平成23年	263,741
平成24年	506,538
平成25年	505,306
平成26年	412,275
平成27年	526,618
平成28年(7月末時点)	275,004

※1月～12月で集計　　(単位：人)

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-5 産業・雇用(3)

釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の月別求職・求人状況

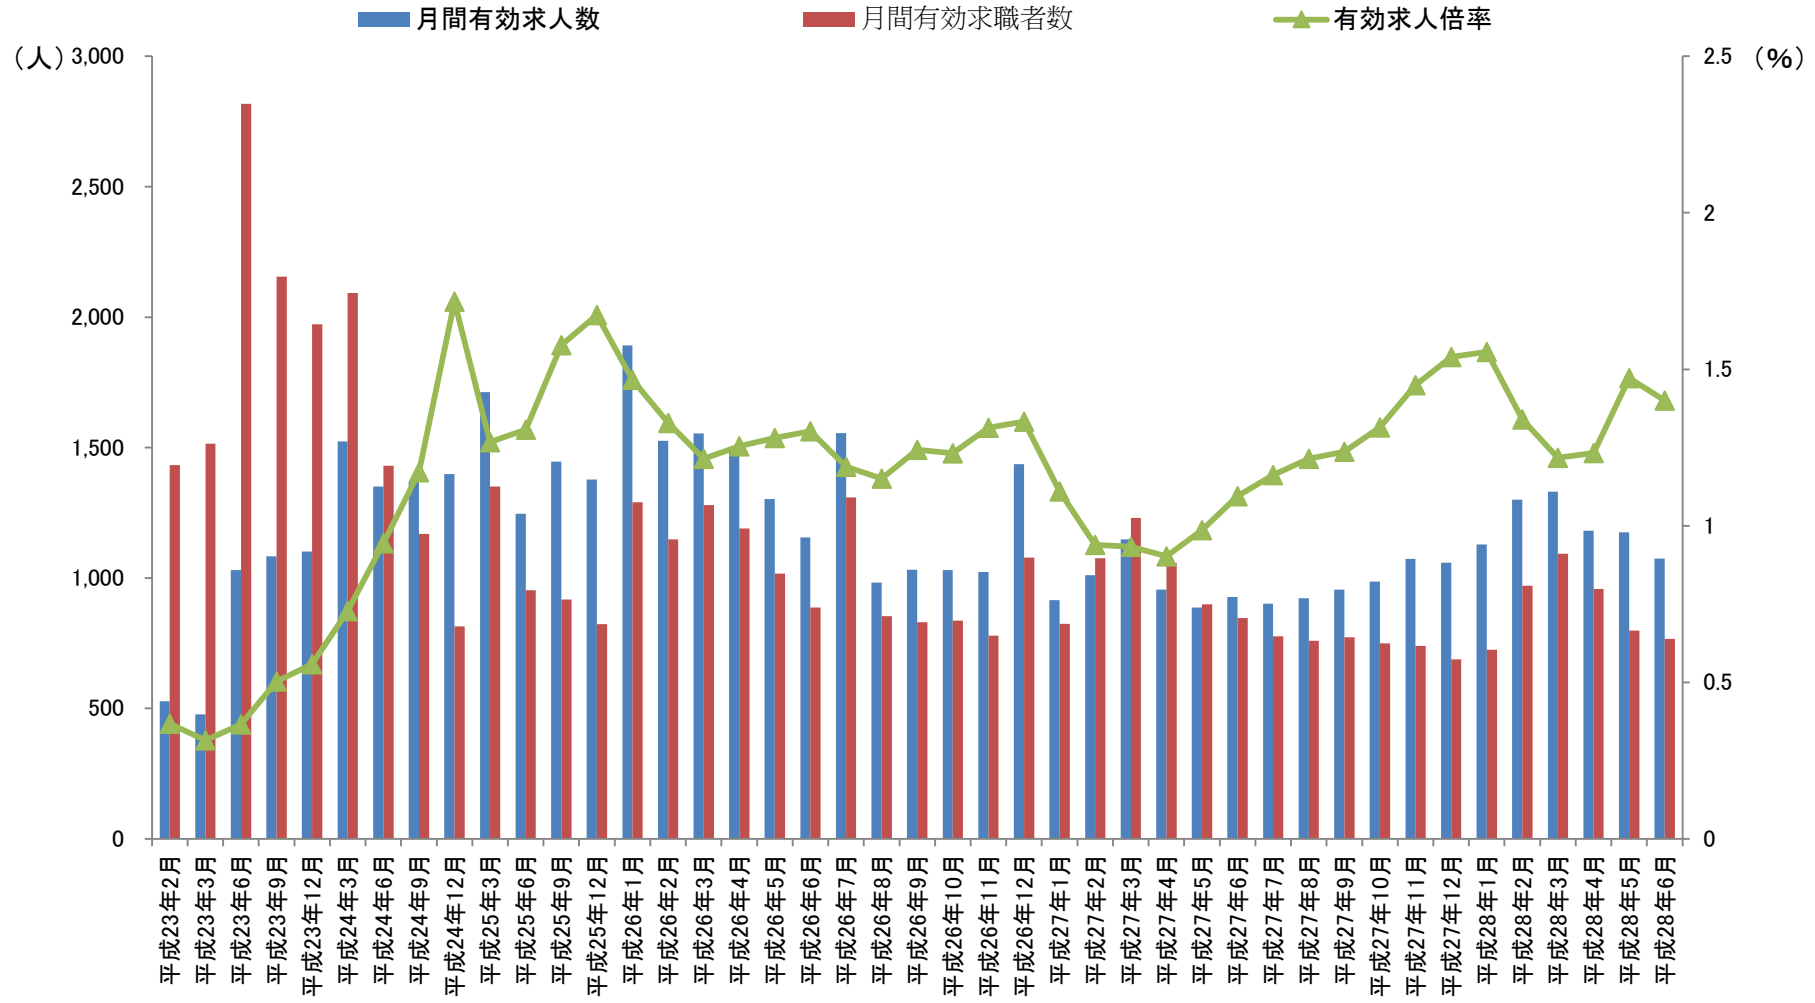

出典:釜石公共職業安定所

※有効求人数　:前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
有効求職者数:前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
有効求人倍率:求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

2-5 産業・雇用(4)

釜石公共職業安定所釜石本所(釜石市・大槌町)の新規求人・求職状況

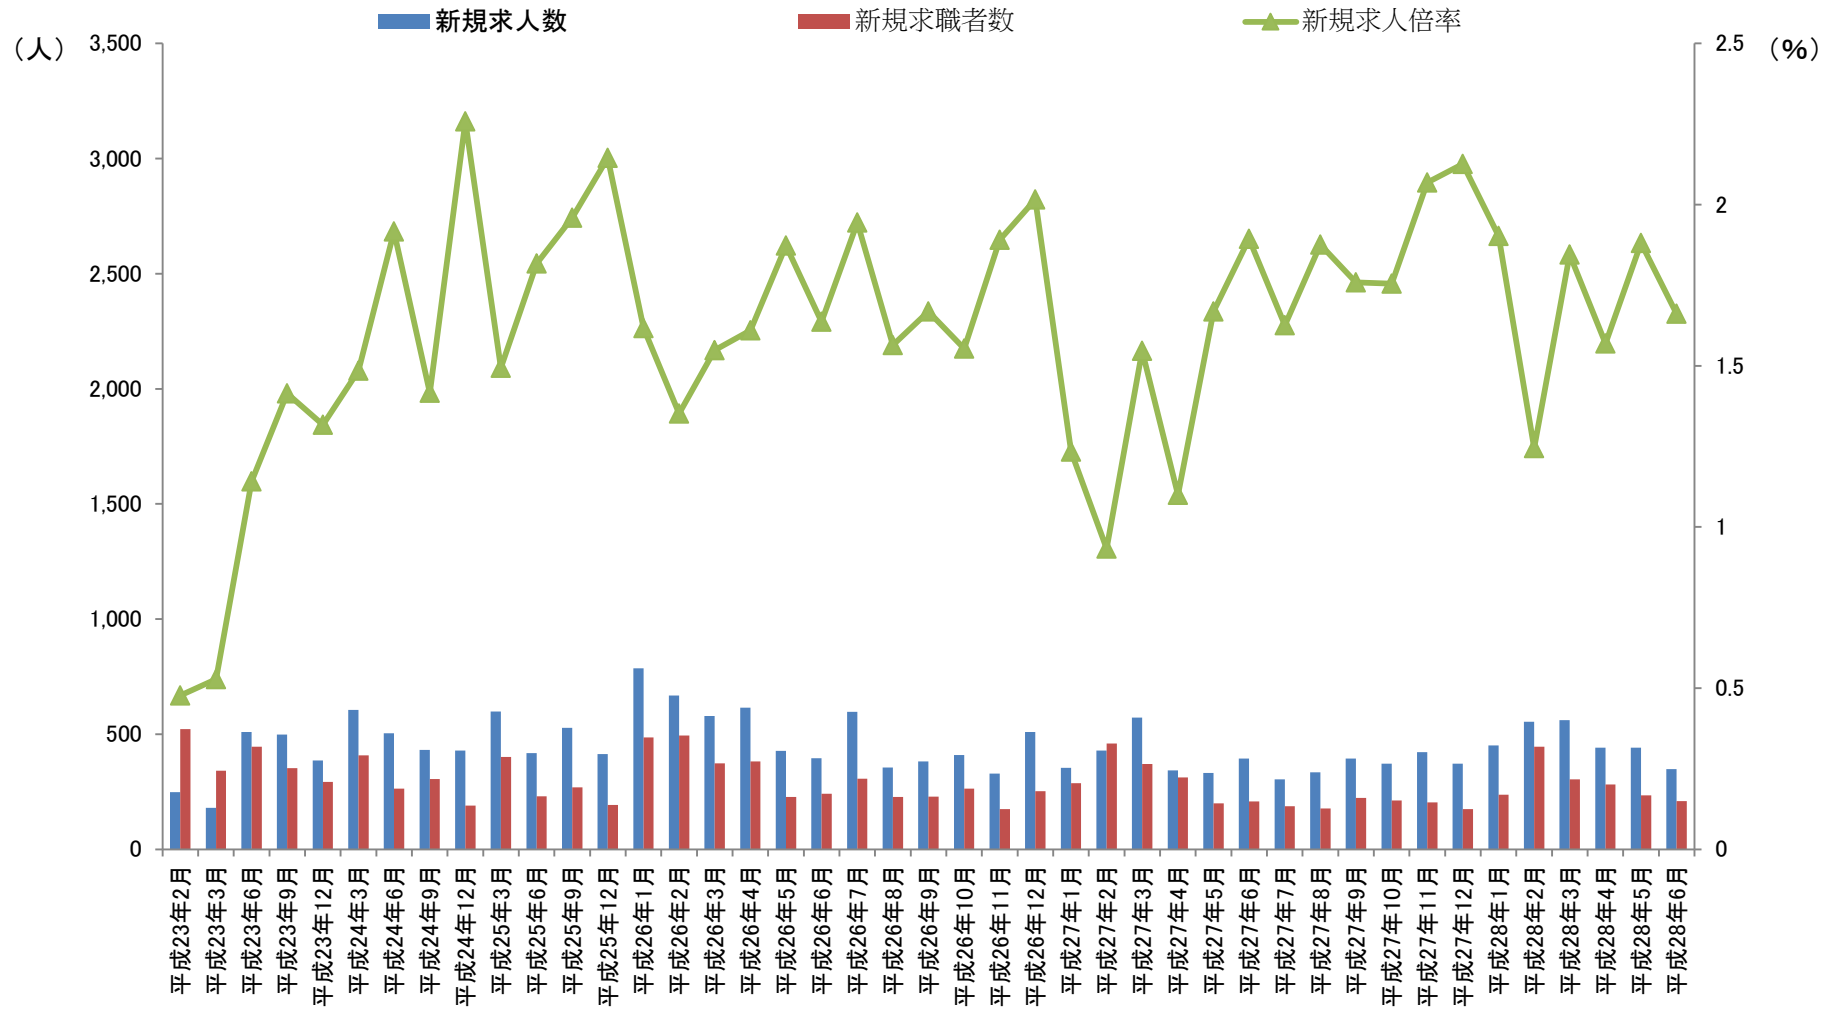

出典:釜石公共職業安定所

※有効求人数　:前月から繰り越された求人数と当月の新規求人数の合計数
有効求職者数:前月から繰り越された求職者数と当月の新規求職申し込み件数の合計数
有効求人倍率:求職者1人に対して何人分の求人があったかを示す指標

2-6 教育（1）

幼稚園・保育園復旧工事の進捗

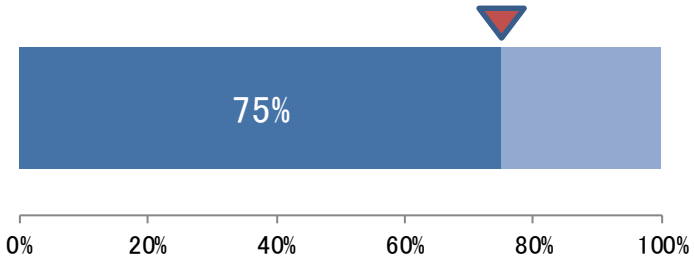

分子	復旧工事が完了した幼稚園・保育園の数 （幼稚園：平田）（保育園：鵜住居）（こども園：かまいし）	3
分母	被災した幼稚園・保育園の数 （幼稚園：平田、鵜住居）（保育園：釜石、鵜住居）	4

※ 鵜住居幼稚園は、学校施設災害復旧事業として施工中（現在仮設園舎で運営中）

小学校復旧工事の進捗

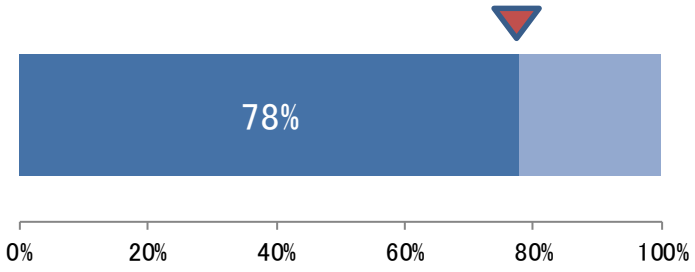

分子	復旧工事が完了した小学校の数 （釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林）	7
分母	被災した小学校の数 （釜石、双葉、甲子、白山、小佐野、平田、栗林、鵜住居、唐丹）	9

※ 鵜住居小学校は、釜石東中学校と併設による学校施設災害復旧事業として施工中（現在仮設校舎で運営中）

※ 唐丹小学校は、唐丹中学校と併設による学校施設災害復旧事業として施工中（現在仮設校舎で運営中）

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-6 教育（2）

児童館・学童育成クラブ復旧工事の進捗

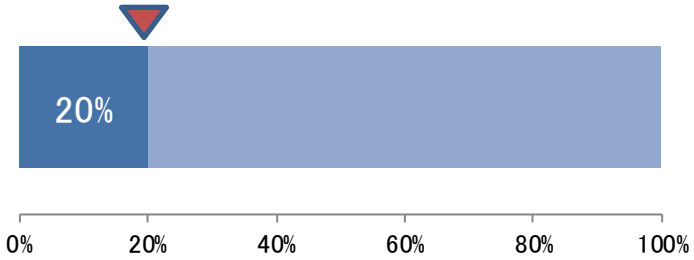

分子	復旧工事が完了した児童館・学童育成クラブの数 （釜石）	1
分母	被災した児童館・学童育成クラブの数 （釜石、小佐野、鵜住居、唐丹、箱崎）	5

※小佐野、鵜住居、唐丹児童館・学童育成クラブは仮設施設で運営中

中学校復旧工事の進捗

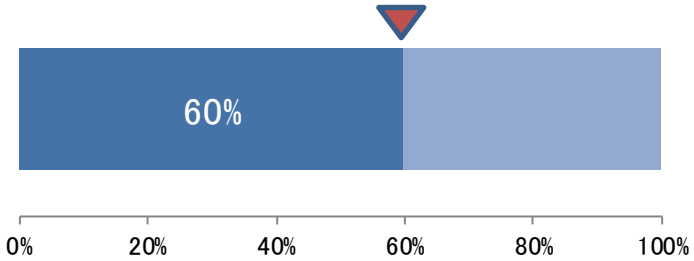

分子	復旧工事が完了した中学校の数 （釜石、大平、甲子）	3
分母	被災した中学校の数 （釜石、大平、甲子、釜石東、唐丹）	5

※ 釜石東中学校は、鵜住居小学校と併設による学校施設災害復旧事業として施工中（現在仮設校舎で運営中）

※ 唐丹中学校は、唐丹小学校と併設による学校施設災害復旧事業として施工中（現在仮設校舎で運営中）

※分子・分母は事業進捗に合わせて適宜変更を行う

2-7 その他(1)

ボランティア受け入れの人数(累計)

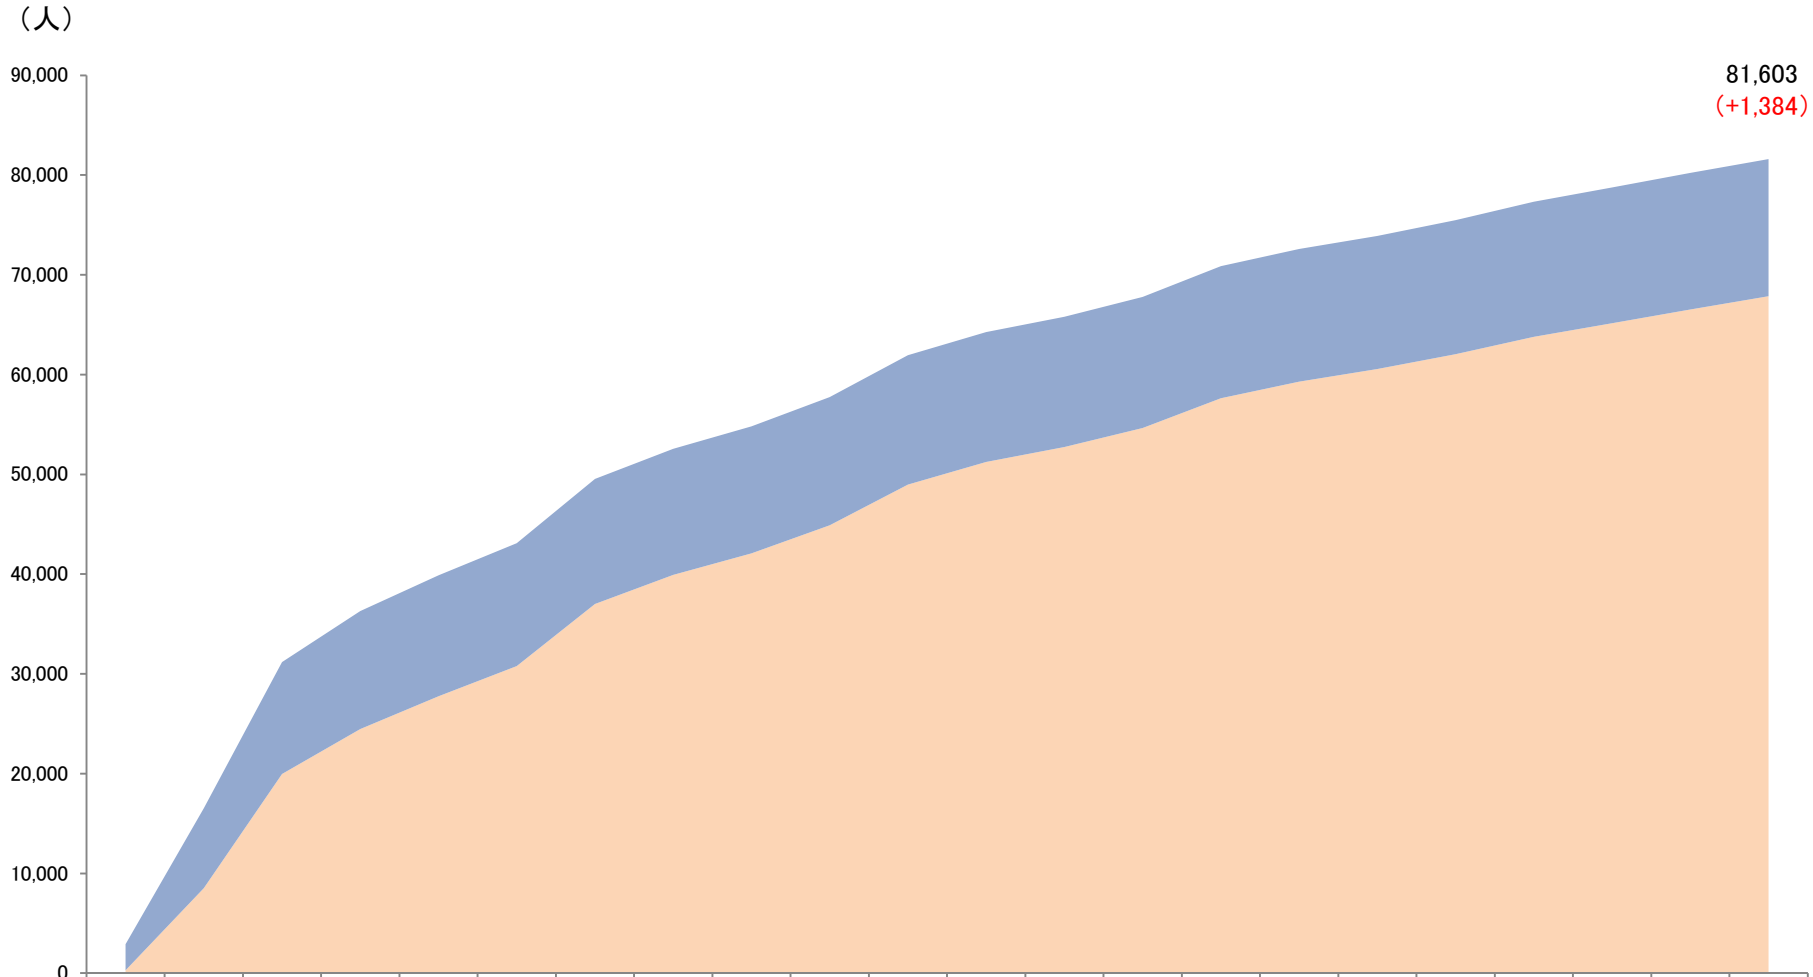

	平成23年3月	6月	9月	12月	平成24年3月	6月	9月	12月	平成25年3月	6月	9月	12月	平成26年3月	6月	9月	12月	平成27年3月	6月	9月	12月	平成28年3月	6月
個人	2,616	8,011	11,218	11,826	12,124	12,319	12,532	12,635	12,730	12,850	12,971	13,020	13,058	13,140	13,242	13,298	13,340	13,434	13,541	13,608	13,691	13,746
団体	284	8,515	19,964	24,470	27,755	30,781	37,008	39,924	42,080	44,896	48,975	51,243	52,740	54,646	57,630	59,293	60,559	62,047	63,787	65,151	66,528	67,857

※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

2-7 その他(2)

ボランティア受け入れの人数(月別)

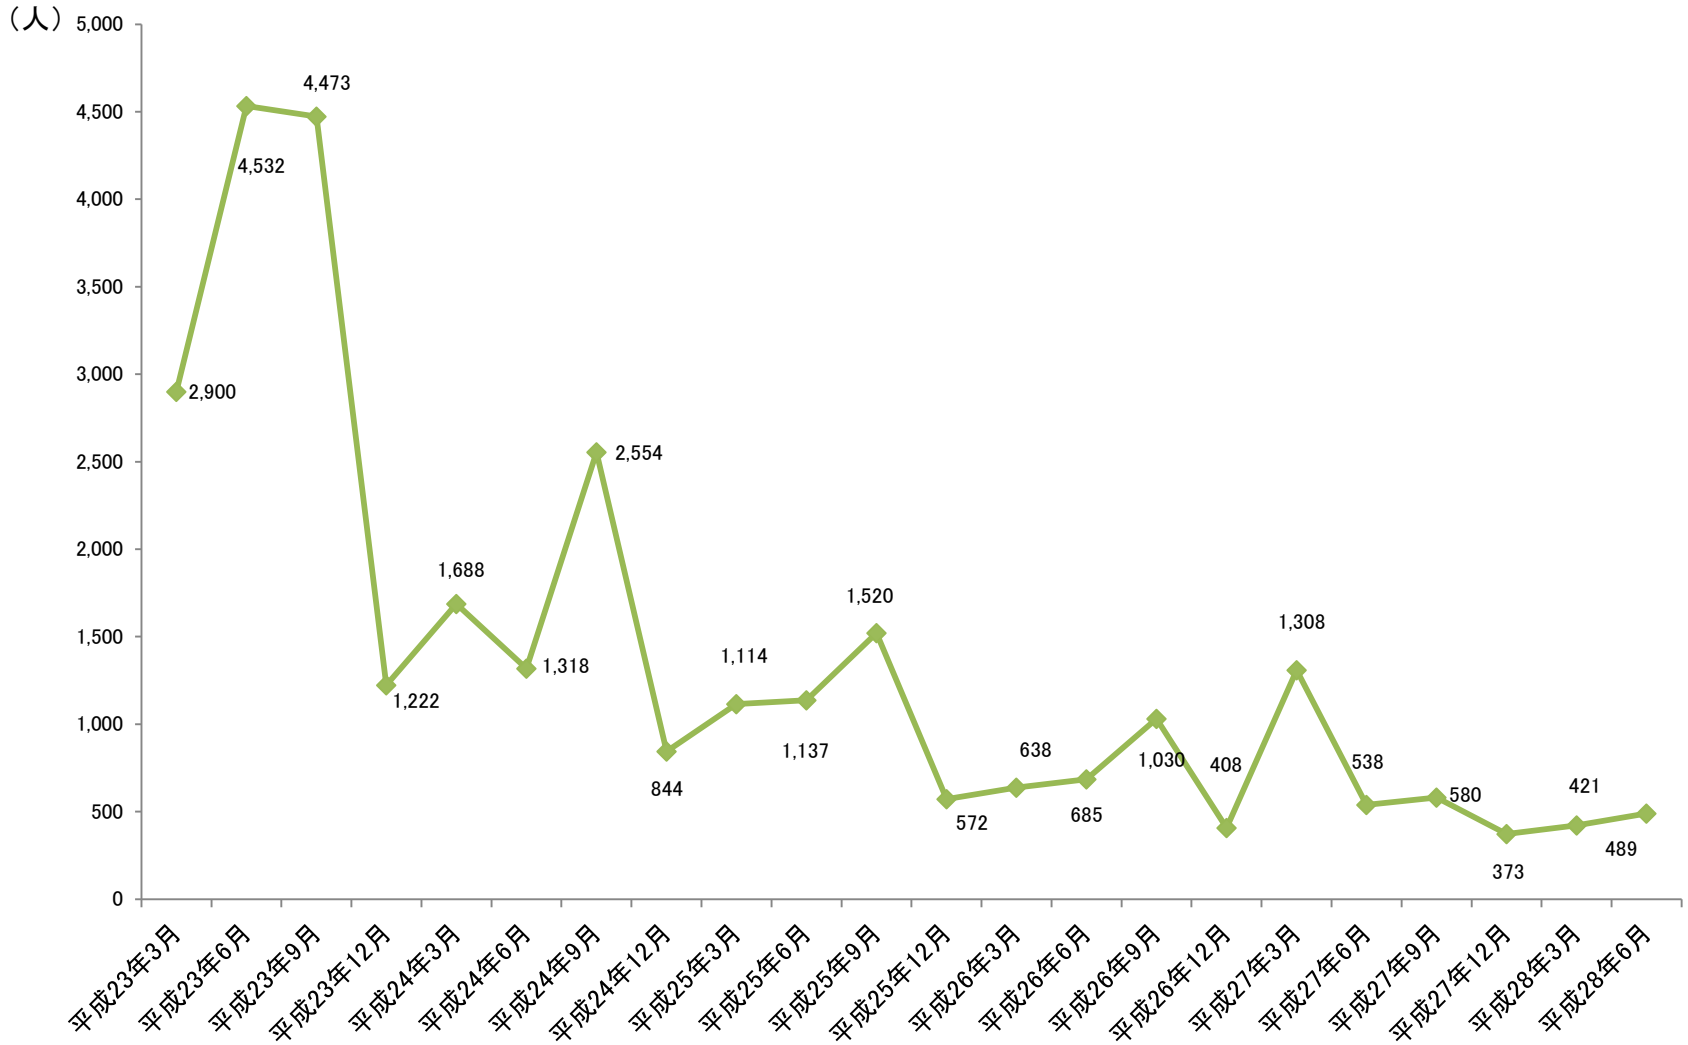

※釜石市社会福祉協議会で把握している人数

2-7 その他(3)

人口(月別)

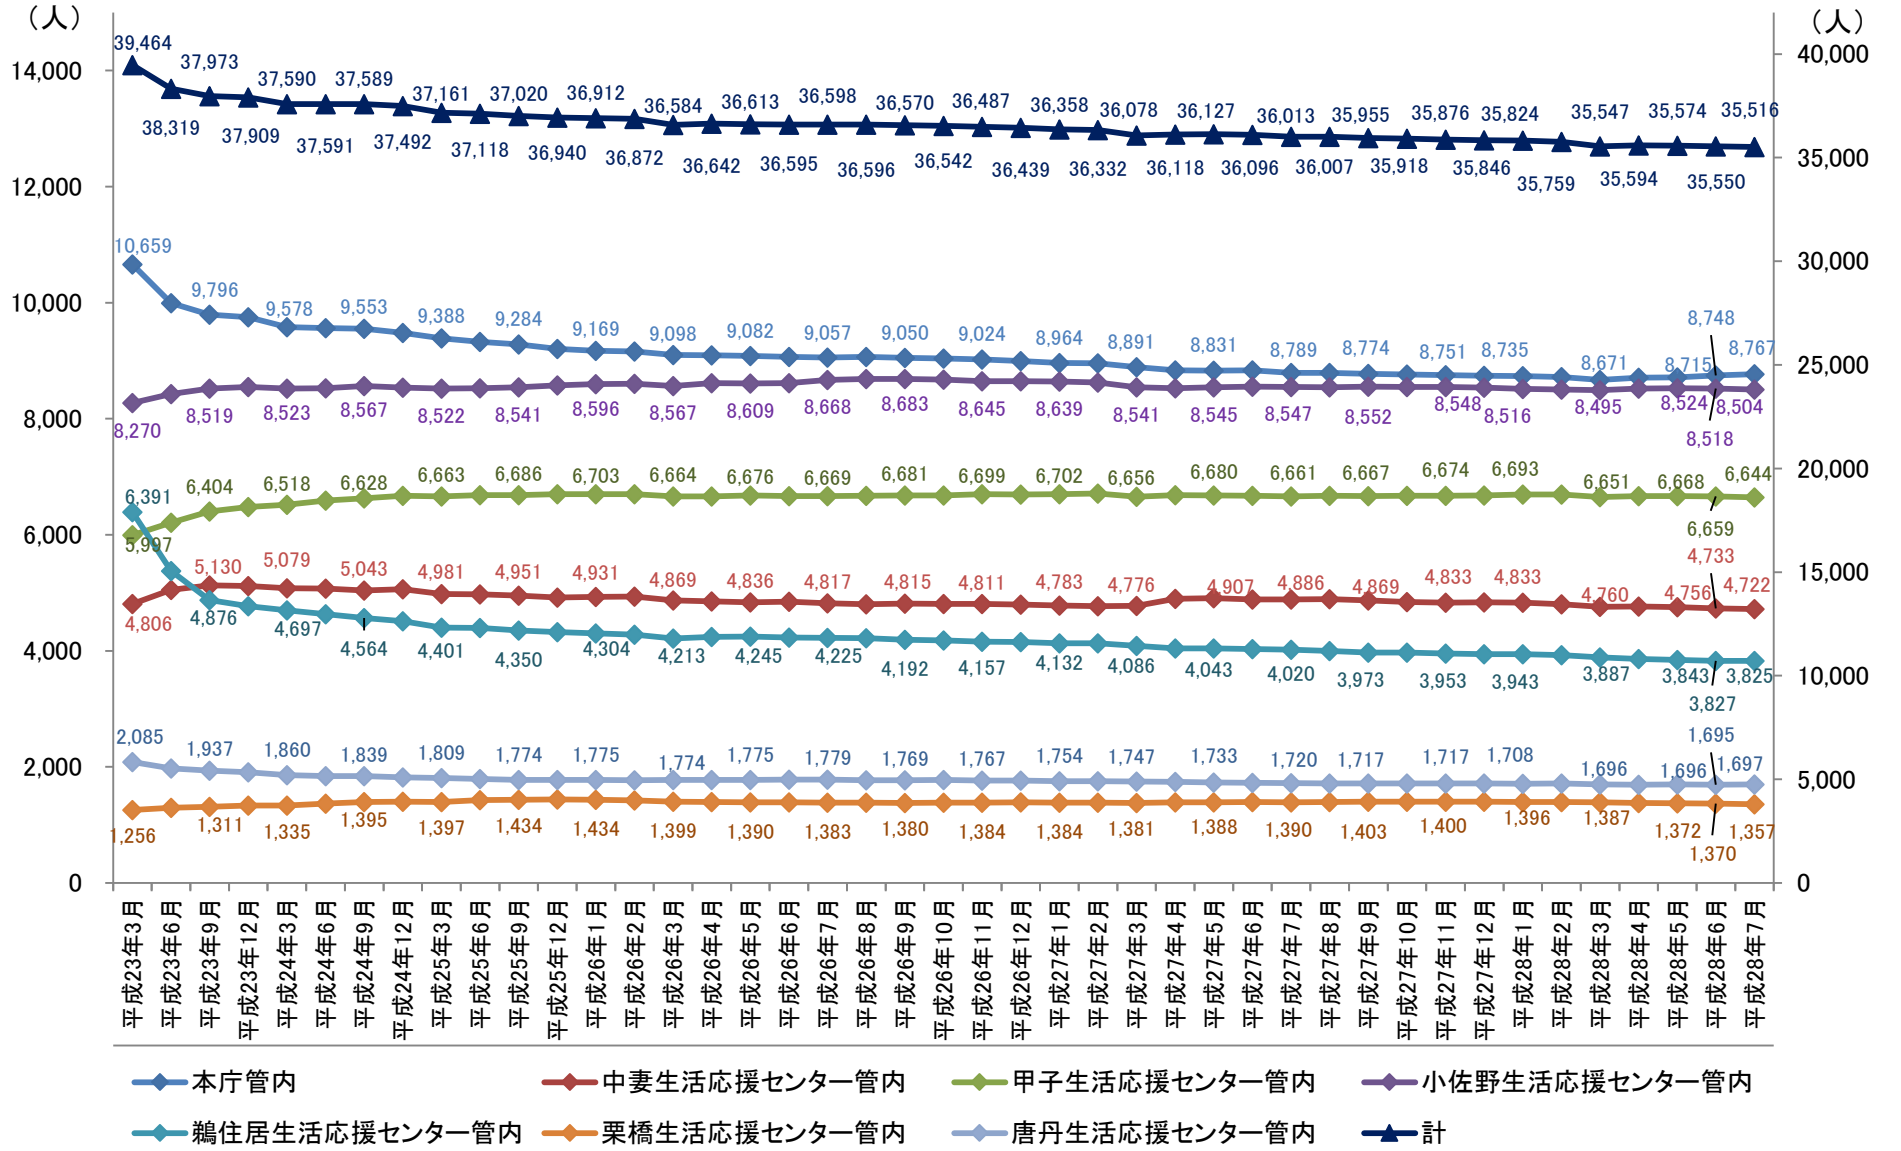
(人)
(人)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
39,464 37,973 37,590 37,589 37,161 37,020 36,912 36,584 36,613 36,598 36,570 36,487 36,358 36,078 36,127 36,013 35,955 35,876 35,824 35,547 35,574 35,516
38,319 37,909 37,591 37,492 37,118 36,940 36,872 36,642 36,595 36,596 36,542 36,439 36,332 36,118 36,096 36,007 35,918 35,846 35,759 35,594 35,550
10,659 9,796 9,578 9,553 9,388 9,284 9,169 9,098 9,082 9,057 9,050 9,024 8,964 8,891 8,831 8,789 8,774 8,751 8,735 8,671 8,715 8,748 8,767
8,270 8,519 8,523 8,567 8,522 8,541 8,596 8,567 8,609 8,668 8,683 8,645 8,639 8,541 8,545 8,547 8,552 8,548 8,516 8,495 8,524 8,518 8,504
6,391 6,404 6,518 6,628 6,663 6,686 6,703 6,664 6,676 6,669 6,681 6,699 6,702 6,656 6,680 6,661 6,667 6,674 6,693 6,651 6,668 6,659 6,644
5,997
4,806 5,130 5,079 5,043 4,981 4,951 4,931 4,869 4,836 4,817 4,815 4,811 4,783 4,776 4,907 4,886 4,869 4,833 4,833 4,760 4,756 4,733 4,722
4,876 4,697 4,564 4,401 4,350 4,304 4,213 4,245 4,225 4,192 4,157 4,132 4,086 4,043 4,020 3,973 3,953 3,943 3,887 3,843 3,827 3,825
2,085 1,937 1,860 1,839 1,809 1,774 1,775 1,774 1,775 1,779 1,769 1,767 1,754 1,747 1,733 1,720 1,717 1,717 1,708 1,696 1,696 1,695 1,697
1,256 1,311 1,335 1,395 1,397 1,434 1,434 1,399 1,390 1,383 1,380 1,384 1,384 1,381 1,388 1,390 1,403 1,400 1,396 1,387 1,372 1,370 1,357
平成23年3月 平成23年6月 平成23年9月 平成23年12月 平成24年3月 平成24年6月 平成24年9月 平成24年12月 平成25年3月 平成25年6月 平成25年9月 平成25年12月 平成26年1月 平成26年2月 平成26年3月 平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月 平成27年4月 平成27年5月 平成27年6月 平成27年7月 平成27年8月 平成27年9月 平成27年10月 平成27年11月 平成27年12月 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月 平成28年4月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年7月
本庁管内
中妻生活応援センター管内
甲子生活応援センター管内
小佐野生活応援センター管内
鵜住居生活応援センター管内
栗橋生活応援センター管内
唐丹生活応援センター管内
計

2-7 その他(4)

人口(社会動態)

（人）

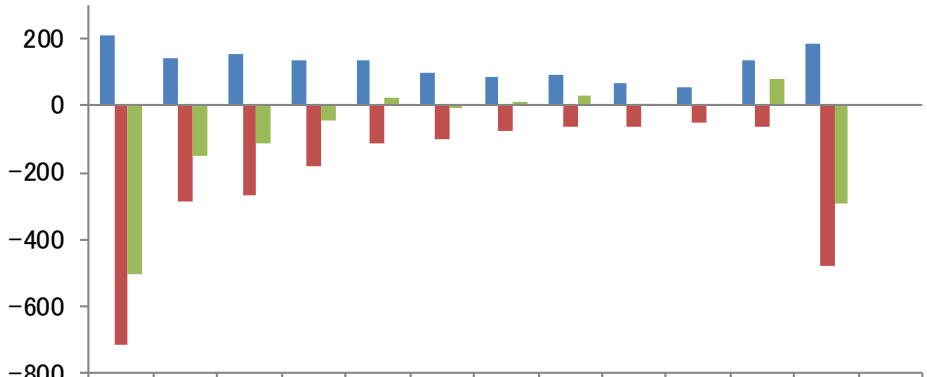

	23年4月	23年5月	23年6月	23年7月	23年8月	23年9月	23年10月	23年11月	23年12月	24年1月	24年2月	24年3月	累計
転入	211	140	155	137	138	97	87	92	67	55	139	187	1,505
転出	−715	−287	−265	−182	−112	−102	−75	−60	−63	−48	−61	−481	−2,451
増減	−504	−147	−110	−45	26	−5	12	32	4	7	78	−294	−946

（人）



	24年4月	24年5月	24年6月	24年7月	24年8月	24年9月	24年10月	24年11月	24年12月	25年1月	25年2月	25年3月	累計
転入	262	73	92	156	91	57	105	68	66	69	48	205	1,292
転出	−202	−60	−74	−88	−66	−74	−85	−79	−61	−68	−61	−429	−1,347
増減	60	13	18	68	25	−17	20	−11	5	1	−13	−224	−55

平成23年度	転入	1,505
	転出	2,451
	増減	−946

平成24年度	転入	1,292
	転出	1,347
	増減	−55

2-7 その他(4)

人口(社会動態)

(人)

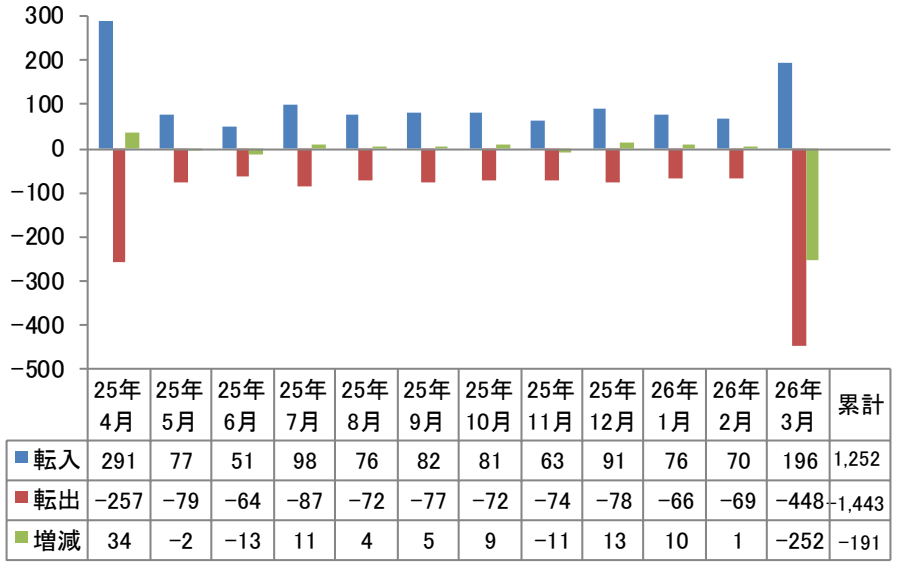

	25年4月	25年5月	25年6月	25年7月	25年8月	25年9月	25年10月	25年11月	25年12月	26年1月	26年2月	26年3月	累計
転入	291	77	51	98	76	82	81	63	91	76	70	196	1,252
転出	−257	−79	−64	−87	−72	−77	−72	−74	−78	−66	−69	−448	−1,443
増減	34	−2	−13	11	4	5	9	−11	13	10	1	−252	−191

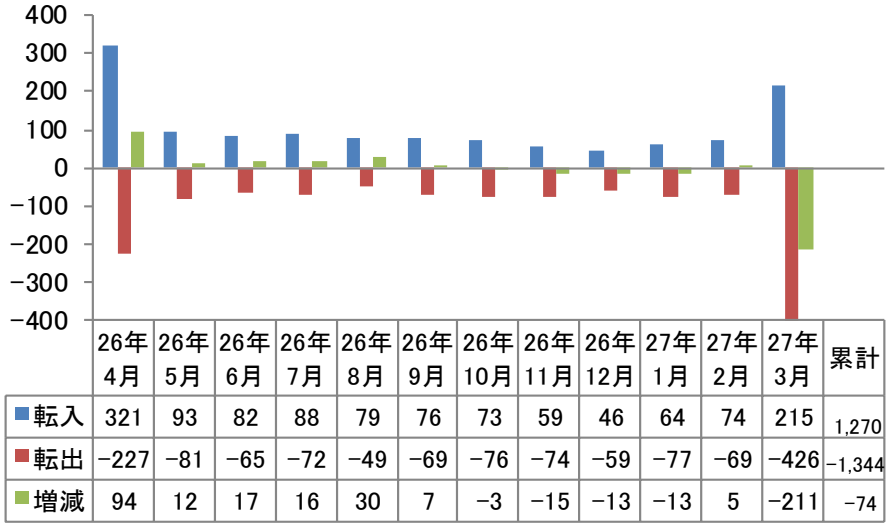

	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月	26年9月	26年10月	26年11月	26年12月	27年1月	27年2月	27年3月	累計
転入	321	93	82	88	79	76	73	59	46	64	74	215	1,270
転出	−227	−81	−65	−72	−49	−69	−76	−74	−59	−77	−69	−426	−1,344
増減	94	12	17	16	30	7	−3	−15	−13	−13	5	−211	−74

平成25年度	転入	1,252
	転出	1,443
	増減	−191

平成26年度	転入	1,270
	転出	1,344
	増減	−74

2-7 その他(4)

人口(社会動態)

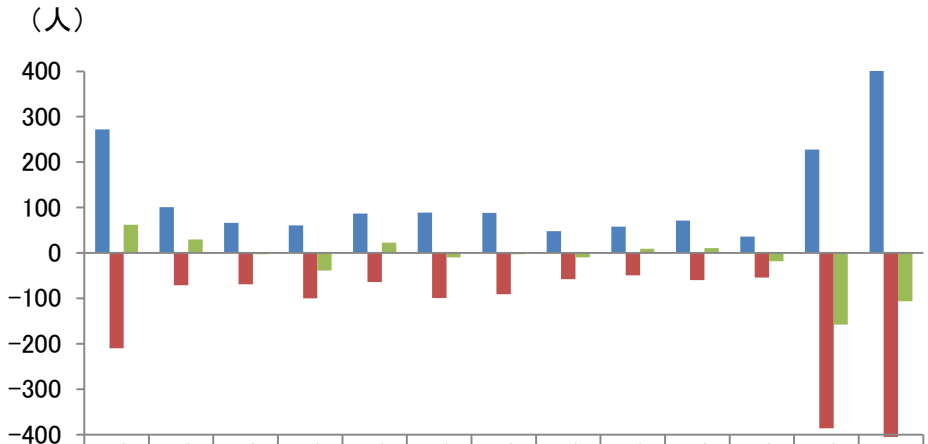

	27年4月	27年5月	27年6月	27年7月	27年8月	27年9月	27年10月	27年11月	27年12月	28年1月	28年2月	28年3月	累計
転入	272	101	66	61	87	89	88	48	58	71	36	228	1,205
転出	−210	−71	−69	−100	−64	−99	−91	−58	−49	−60	−54	−386	−1,31
増減	62	30	−3	−39	23	−10	−3	−10	9	11	−18	−158	−106

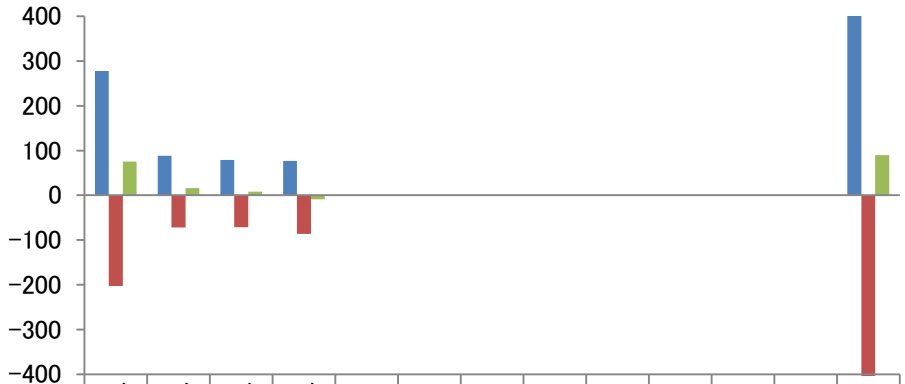

	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月									累計
転入	278	88	79	77									522
転出	−203	−72	−71	−86									−432
増減	75	16	8	−9									90

平成27年度	転入	1,205
	転出	−1,311
	増減	−106

平成28年度	転入	522
	転出	−432
	増減	90

3 問い合わせ先

分類	項目	問い合わせ先	
全体		復興推進本部事務局	0193-22-2111（内線119）
事業費	復旧事業費	総務企画部財政課	0193-22-2111（内線125）
	復興事業費	復興推進本部事務局	0193-22-2111（内線119）
土地利用	土地区画整理事業	復興推進本部都市整備推進室	0193-22-2111（内線209）
	防災集団移転促進事業		0193-22-2111（内線210）
	漁業集落防災機能強化事業		
	用地買収		
	災害廃棄物の処理状況	市民生活部環境課	0193-22-2111（内線221）
インフラ	道路災害復旧事業	建設部建設課	0193-22-2111（内線404）
	橋りょう復旧事業		
	河川改修事業		
	下水道施設災害復旧事業	建設部下水道課	0193-22-1061
	漁港災害復旧事業（市漁港）	産業振興部水産課	0193-22-2111（内線306）
	海岸施設災害復旧事業（市防潮堤）		0193-22-2111（内線306）
住まい	災害公営住宅整備事業	復興推進本部復興住宅整備室	0193-22-2111（内線433）
	住宅の自力再建（生活再建支援金）	保健福祉部地域福祉課	0193-22-0177
	応急仮設住宅入居戸数の推移	復興推進本部生活支援室	0193-22-8253/8254
産業・雇用	水揚げ高（魚市場）	産業振興部水産課	0193-22-2111（内線306）
	水産加工業企業数		
	農地農業用施設災害復旧事業	産業振興部農林課	0193-22-2111（内線304）
	観光客数	産業振興部観光交流課	0193-22-2111（内線333）
	釜石公共職業安定所釜石本所（釜石市・大槌町）の求人・求職状況	産業振興部商工労政課	0193-22-2111（内線321）
教育	幼稚園・保育園復旧工事	教育委員会総務課 保健福祉部子ども課	0193-22-8832 0193-22-5121
	小学校復旧工事		
	児童館・学童育成クラブ復旧事業		
	中学校復旧工事		
その他	ボランティア受入数	社会福祉協議会	0193-24-2511
	人口（月別・社会動態）	市民生活部市民課	0193-22-2111（内線204）
